

Área de Concesión

**1. Antecedentes Generales de la Concesión**

Proyecto:	Hospital Félix Bulnes
Presupuesto Estimativo Neto:	UF 5.300.000
Organismo Administrador:	Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP
Mandantes:	Ministerio de Salud Subsecretaría Redes Asistenciales Servicio Salud Metropolitana Occidente
Nombre del Concesionario:	Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A.
Decreto de Adjudicación:	Decreto Supremo N° 153 de 27.02.2014
Fecha de Inicio Concesión:	6 de junio de 2014
Plazo de Concesión:	30 semestres corridos desde la autorización de pagos de subsidios
Entrega Proyecto Definitivo Total:	500 días desde el inicio de la concesión <sup>1</sup>
Inicio de Obras	1 <sup>er</sup> semestre de 2015
Puesta en Servicio Provisoria de la Obra (PSP):	2 <sup>do</sup> semestre de 2018
Puesta en Servicio Definitiva (PSD):	2 <sup>do</sup> semestre de 2019
Inspector Fiscal:	Miguel Ara Santana
Asesoría a la Inspección Fiscal:	Zañartu Ingenieros Consultores SpA.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

El contrato de concesión “Hospital Félix Bulnes” comprende la construcción de un establecimiento de alta complejidad en el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 523 camas, y se ubicará en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana de Santiago.

<sup>1</sup> Plazo modificado por Resolución DGOP (Exenta) N° 2109 de fecha 05.05.15.

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios Complementarios que se indican a continuación:

**Servicios Básicos:**

- Aseo y Limpieza General
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
- Control Sanitario de Vectores
- Gestión de Ropería
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico

**Servicios Especiales Obligatorios:**

- Cafetería
- Seguridad y Vigilancia
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica

**Servicios Complementarios**

- Alimentación a Público en General
- Estacionamiento para Público en General
- Instalación y Explotación de Máquinas Dispensadoras
- Área Multiservicio.

Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone

del modelo BIM (Building Information Model) que permite la integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades.

Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, reduciendo así los riesgos de daños.

### BENEFICIOS DEL PROYECTO

El Hospital Félix Bulnes está orientado, principalmente a la población infantil y adulta del área poniente de Santiago, con una población beneficiaria aproximada de 700 mil habitantes provenientes de las comunas de Pudahuel, Cerro Navia, Renca y Lo Prado.

Este hospital tendrá una dotación de 523 camas, repartidas de la siguiente manera:

- ✓ 339 Camas Básicas y Medias
- ✓ 22 Camas Pensionado
- ✓ 112 Camas U.P.C.
- ✓ 50 Camas Salud Mental


Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes:

- ✓ 13 Pabellones
- ✓ 44 Box de consulta de Especialidades

### LOCALIZACION DEL NUEVO HOSPITAL

El terreno donde se construirá este proyecto corresponde al polígono delimitado por:

- Calle Galvarino y distintos propietarios por el poniente,
- Terreno vecino y calle Mapocho por el norte,
- Terreno vecino por el oriente, y
- Diversos propietarios de Población Dalmacia por el sur.

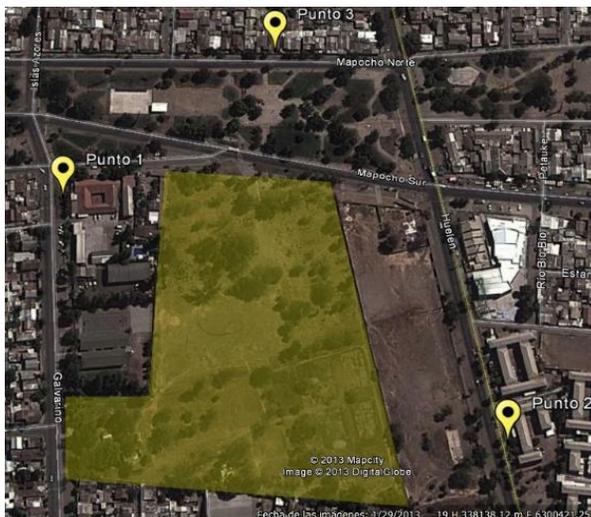

### Principales Actividades, o hitos, abril de 2016

- La Sociedad Concesionaria realiza la entrega de la Memoria de Integración del Proyecto Definitivo.
- La Sociedad Concesionaria realiza la entrega de la versión final del Proyecto Definitivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4.3 de las Bases de Licitación. Esta entrega es observada por la Inspección Fiscal en atención a elementos faltantes en dicha entrega.
- La Inspección Fiscal certifica el cumplimiento de los hitos contractuales establecidos en los artículos 1.6.3 y 1.6.4 de las Bases de Licitación del Contrato de Concesión.
- La Sociedad Concesionaria hace entrega de la maqueta física, de la maqueta electrónica 3D y del video del Proyecto Hospital Félix Bulnes.
- Con fecha 29 de abril de 2016, se aprueba la solicitud de inicio de construcción de las obras presentada por la Sociedad Concesionaria.
- Se informa a la Sociedad Concesionaria respecto del calendario y metodología para el desarrollo de los programas anuales de operación de servicios.
- La Inspección Fiscal aprueba la póliza del Seguro de Catástrofe contratado por la Sociedad Concesionaria para dar cobertura a los riesgos catastróficos definidos en las Bases de Licitación.
- La Sociedad Concesionaria informa los accionistas vigentes de la sociedad.
- La Sociedad Concesionaria informa el cierre del proceso de financiamiento del proyecto realizado con los bancos Santander, Itaú-Corpbanca y BBVA.
- Se realizó el llamado a concurso y apertura de ofertas para la adquisición de equipamiento médico y mobiliario clínico del grupo 3.
- La Sociedad Concesionaria solicita relicitar la totalidad del grupo 4 de adquisición y equipamiento médico y mobiliario clínico por los motivos expuestos en su solicitud.
- A petición de la Inspección Fiscal, la Sociedad Concesionaria remite el programa de obras actualizado.

Respecto al avance constructivo de la obra, las imágenes muestran faenas representativas del desarrollo del mes.



Vista avance obra fachada poniente.



Túnel acceso estacionamiento subterráneo



Vista aislador sísmico.



Rellenos perimetrales compactados.



Muro perimetral patio de maniobras.



Vista parcial obra gruesa losa piso 3.
