



1. Antecedentes Generales de la Concesión

| | |
|--------------------------------------|---|
| Proyecto: | Concesión Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores |
| Región de Emplazamiento: | Región de Valparaíso, Comuna de Los Andes |
| Presupuesto Oficial: | UF 1.924.500 |
| Inversión Oferta Técnica: | UF 2.244.816 |
| Mandante: | Ministerio del Interior y Seguridad Pública |
| Mandatario: | Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP |
| Nombre del Concesionario: | Sociedad Concesionaria Nuevo Complejo Los Libertadores S.A. |
| Decreto de Adjudicación: | DS MOP N° 108 del 19.03.2015 |
| Fecha de Inicio Concesión: | 18 de mayo de 2015 |
| Fin de la Concesión: | 18 de noviembre 2030 |
| Inicio de las Obras | 4° trimestre de 2016 |
| Plazo Etapa de Construcción: | 36 meses |
| Puesta en Servicio Provisoria (PSP): | noviembre de 2020 |
| Inspector Fiscal: | Ricardo Vergara Aguirre |
| Asesoría a la Inspección Fiscal: | Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda. |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de concesión “Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores” consiste en la construcción de un nuevo

Complejo Fronterizo, en reemplazo de las actuales instalaciones existentes en el Paso Los Libertadores. con todas las obras civiles e instalaciones necesarias para realizar las labores de control y fiscalización de las personas, vehículos y carga que salen e ingresan al país y dar las adecuadas condiciones de servicio, confort y seguridad a los funcionarios de los servicios públicos, transportistas, pasajeros, turistas y demás usuarios del Complejo Fronterizo. Estas nuevas instalaciones se ubican a 300 mts del actual Complejo Fronterizo, a una altura de aproximadamente a 2.900 metros sobre el nivel del mar, en el sector denominado Llano de la Calavera, aproximadamente a 68. Km. De la ciudad de Los Andes a través de la Ruta 60-CH, comuna de Los Andes, Región de Valparaíso

PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Dentro de las principales obras que desarrolla el proyecto, son las que se indican a continuación:

- Edificio de Control de Vehículos, para el control de automóviles, camiones y buses. Con una superficie de 24.895 m² aproximadamente.
- Edificio de Alojamiento para Funcionarios chilenos y argentinos, edificio de 4 pisos, 141 habitaciones, en una superficie de 5.094 m² aproximadamente.
- Edificio de Subcomisaría de Carabineros de Chile, edificio de 3 pisos, en una superficie de 670 m² aproximadamente.

INSTALACIONES DE APOYO

- Instalaciones sanitarias de agua potable.
- Instalaciones sanitarias de alcantarillado, tratamiento de aguas servidas.
- Instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado.
- Instalaciones de combustibles de gas y petróleo.
- Vialidad interior, exterior y empalmes con la Ruta 60-CH.

SERVICIOS BÁSICOS NO COMERCIALES

- Servicio de Conservación de las Obras
- Servicio de Aseo y Control de Plagas
- Servicio de Gestión de Basuras y Residuos
- Servicio de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Servidas
- Servicio de Alimentación a Funcionarios
- Transporte de Equipaje Dentro de la Zona de Control de Buses
- Cintas Transportadoras de Equipaje
- Despeje de Nieve y Hielo
- Servicio de Información al Usuario
- Servicio de Comunicaciones
- Servicio de Lavandería

SERVICIOS BÁSICOS COMERCIALES


- Servicio Alternativo de Alimentación y Bebida para Funcionarios: Considera como mínimo, la provisión de máquinas dispensadoras automáticas de alimentos en el comedor de funcionarios.
- Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero: Proveer áreas para bancos, casas de cambio y otros servicios financieros en las áreas públicas del Edificio de Control. Además, disponer en forma permanente, al menos un (1) cajero automático y una (1) casa de cambio en la zona de control de buses y en la zona de control de vehículos particulares.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

- Áreas para Locales Comerciales: La SC podrá habilitar y explotar áreas para locales comerciales. Estas áreas deberán considerar estacionamientos.
- Áreas para Publicidad y Propaganda: La SC podrá explotar áreas para publicidad (interiores y exteriores), en las áreas definidas. Deberán ser compatibles con la señalética del Complejo Fronterizo.
- Otros: La SC podrá habilitar y/o explotar otros servicios, siempre que no interfieran con los procesos de control del Complejo Fronterizo. Requieren la aprobación por escrito del DGOP.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

- Mejorar condiciones de trabajo y habitabilidad para funcionarios.
- Aumento de la capacidad de infraestructura.
- Mayor eficacia en los controles migratorios de personas, vehículos, mercancías y control fitosanitario.
- Disminución de tiempos de espera en cola de usuarios.
- Mejorar imagen país frente a turistas que ingresan al Chile.
- Contar con nuevos y mejores servicios para los usuarios al complejo.

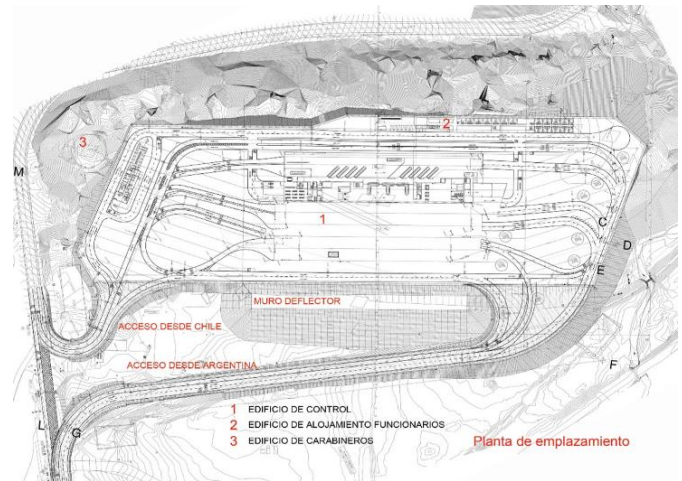

Planta de Emplazamiento

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES, O HITOS, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Entrega de Nuevo PID Revisión A

Se entrega nuevo Proyecto de Ingeniería Definitivo (PID) Rev. A, por parcialidades:

- Con fecha 03.10.2016 mediante carta MOP/IF-0222, la Sociedad Concesionaria hace entrega de la tercera de las once parcialidades correspondiente a: Cimentaciones de Edificio de Alojamiento de Funcionario.
- Con fecha 04.10.2016 mediante carta MOP/IF-0227, la Sociedad Concesionaria hace entrega de la cuarta de once parcialidades correspondiente a: Cimentaciones de Edificio de Control y Servicios.
- Con fecha 26.10.2016 mediante carta MOP/IF-0235, la Sociedad Concesionaria hace entrega de la quinta de once parcialidades correspondiente a: Estructura Prefabricada del Edificio Alojamiento de Funcionarios. Anteriormente, en el mes de septiembre, la Sociedad concesionaria ya había hecho entrega de dos parcialidades correspondiente a: Edificio de Carabineros, Estructuras, Arquitectura y Especialidades, y Vialidad y Obras Exteriores, respectivamente. A estas parcialidades la Inspección Fiscal entregó sus observaciones.

3. DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO.

Avance Desarrollo de la Ingeniería Definitiva (Según plazos Art. 1.9.2 párrafo 5° de las Bases de Licitación).

| Mes | Avance (%) | | |
|----------|------------|-------|-----------|
| | Anterior | mes | Acumulado |
| Sep-2016 | 0,00 | 2,40% | 2,40 |
| Oct-2016 | 2,40 | 8,61% | 11,01 (*) |

(*) a la fecha de 28.10.2016 la Sociedad Concesionaria ha hecho entrega de cinco de un total de once parcialidades, del Nuevo Proyecto de Ingeniería Definitiva Revisión A.

Avance Físico de la Obra.

A la fecha la Sociedad Concesionaria no ha presentado avance físico de la obra, porque no se ha dado inicio a la construcción de la obra. Para lo anterior se debe contar con la aprobación del Proyecto de Ingeniería Definitiva.
