

INFORME WEB

CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS – ACCESO NORTE A CORONEL

MES DE JUNIO 2016


ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	: Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel.
Concesionaria	: Soc. Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.
Decreto de Adjudicación	: D.S. M.O.P. N° 411 del 27.06.2008.
Publicación Diario Oficial	: 13.09.2008.
Región de Emplazamiento	: VIII Región del Biobío.
Inicio de la Concesión	: 13.09.2008.
Inicio Etapa Construcción	: 13.09.2008.
Plazo Etapa Construcción	: 47 Meses
Plazo de la Concesión	: 480 Meses.
Inspector Fiscal	: Lester Poblete Godoy.
Puesta en Servicio Provisoria:	
Tramo A	: En construcción
Tramo B	: 13.08.13 (Res. DGOP N°3267 del 12.08.2013)
Convenios Complementarios	: D.S. MOP N°274 del 17.09.2013
Presupuesto Oficial	: UF 7.700.000
Inversión Oferta Técnica (ITC):	UF 7.950.000
Asesoría IF	: Zañartu Ingenieros Consultores SPA. (Resolución DGOP N° 406 10.11.2008)

- La Concesión, está comprendida entre el Acceso Norte a Coronel y la localidad de Cerro Alto, con una extensión aproximada de 89 km.
- El trazado de la Ruta Concesionada, se desarrolla a través de las comunas de Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, y Los Álamos.
- El proyecto regulariza el perfil existente, a una doble calzada de dos pistas por sentido, de 3,5 metros de ancho cada una, en toda su extensión.
- Además incluye obras como: Mejoramiento de Estructuras Existentes, Construcción de Puentes, Pasarelas, Pasos Desnivelados, Nuevos Enlaces, Obras de Saneamiento, Señalización y Seguridad Vial, Iluminación, Paraderos Peatonales, Áreas de Servicios y aproximadamente 13 km de Calles de Servicio. Igualmente incorpora los baipás de Lota, Laraquete y Villa Los Ríos.



Cepillado de superficie de carpeta de rodadura, km 25,35 – 25,40.

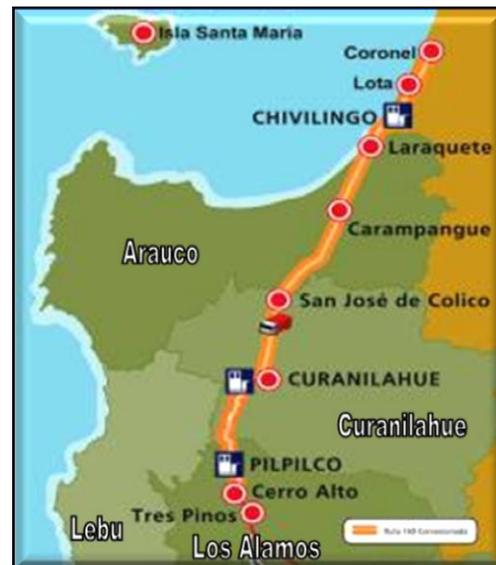


AVANCE DEL CONTRATO: En base a programa de avances presentado por la Sociedad Concesionaria, comparándolo con los avances reales y los hitos del contrato (al día 30 de cada mes):

Tramo A (Dm 14.300 – 61.835) : Avance de 99,94%
Tramo B (Dm 101.390 – 102.054) : Avance del 99,88%



AVANCE GENERAL
 (al 30 de Junio de 2016):
99,91 %

PLANO DE UBICACIÓN

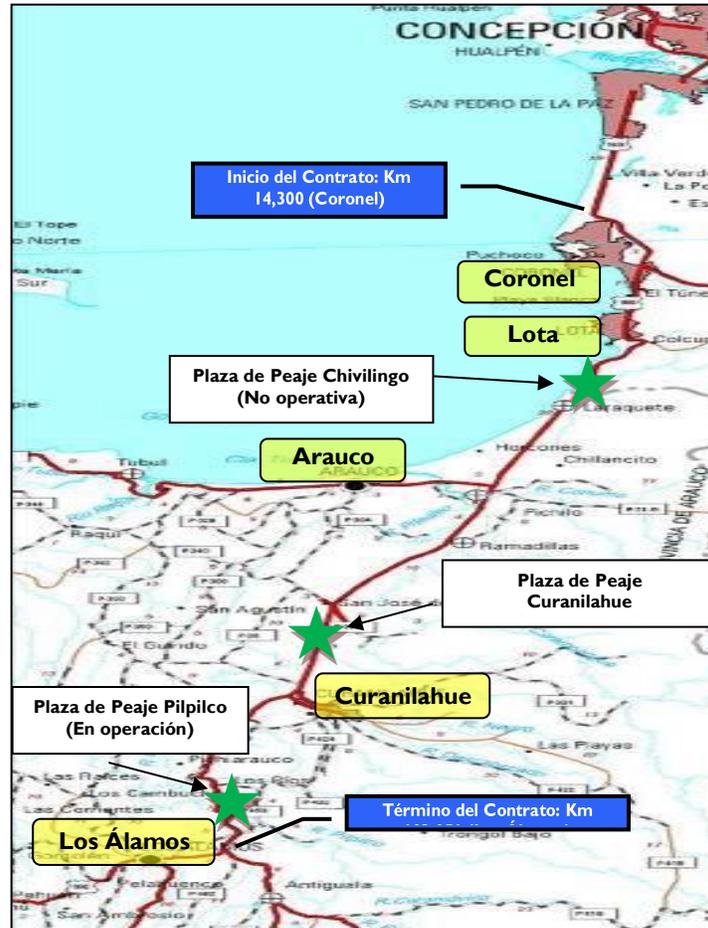


OBRAS EN EJECUCIÓN (Avance al 31.05.16)

Los trabajos realizados en el contrato durante del mes de Junio son los siguientes:

- Reparación de talud de corte en sector Chivilingo.
- Reparación de baches en pavimentos
- Reposición de cercos

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Preparación de la Base Granular Sobre Inyección Losa de Acceso Estribo de Salida Paso Inferior Ramadillas, Tramo A Sector II calzada en km: 61,910.

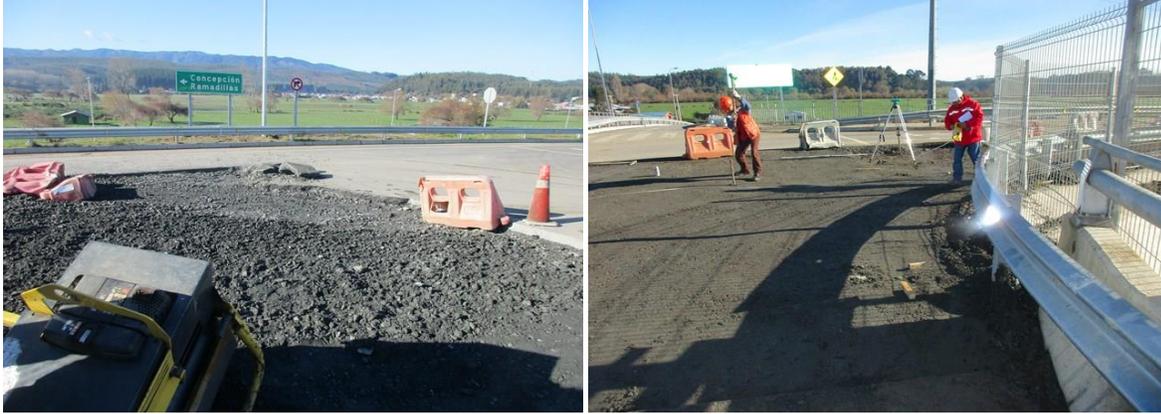

Instalaciones de Cúpulas de Policarbonato, sobre Mallas Anti Vandalismo Galvanizadas en Pasarela Ramadillas; Calzada Izquierda y Derecha Tramo A Sector II km: 62,220.



Colocación de Moldajes Laterales y Hormigonado de Muros en Foso Revestido, Tramo A Sector II Calzada Izquierda km: 53,600 – 53,935




Cepillado de Carpeta de Rodadura Asfáltica; Tramo A Sector I Calzada Derecha Pista N° 3 km: 22,200 – 22,940.



Colocación de Hormigonado de Muros en Foso Revestido, Tramo A Sector II Calzada Izquierda km: 53,600 – 53,953.



Colocación de Drenes Californianos en Corte Sector Chivilingo Tramo A Sector II Calzada Izquierda en km: 40,000 – 40,400.

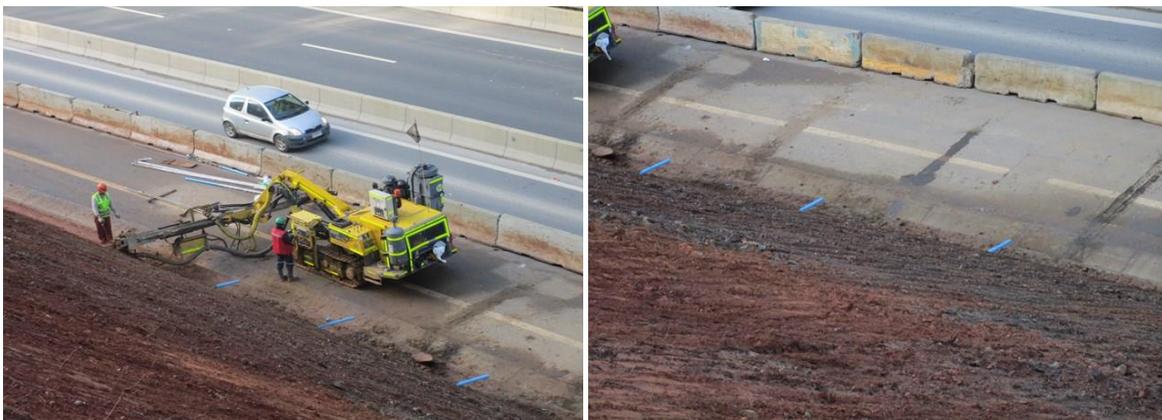

TEMA RELEVANTE DEL MES

Con fecha 06 de junio, en el sector de Villa Bicentenario, en terreno se realiza reunión para hacer entrega de la pasarela provisoria.

REGISTRO FOTOGRAFICO

