

INFORME WEB

CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS – ACCESO NORTE A CORONEL

MES DE OCTUBRE 2016

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	: Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel.
Concesionaria	: Soc. Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.
Decreto de Adjudicación	: D.S. M.O.P. N° 411 del 27.06.2008.
Publicación Diario Oficial	: 13.09.2008.
Región de Emplazamiento	: VIII Región del Biobío.
Inicio de la Concesión	: 13.09.2008.
Inicio Etapa Construcción	: 13.09.2008.
Plazo Etapa Construcción	: 47 Meses
Plazo de la Concesión	: 480 Meses.
Inspector Fiscal	: Lester Poblete Godoy.
Puesta en Servicio Provisoria:	
Tramo A	: 30.09.16 (Res. DGOP N°3497 del 29.09.2016)
Tramo B	: 13.08.13 (Res. DGOP N°3267 del 12.08.2013)
Convenios Complementarios	: D.S. MOP N°274 del 17.09.2013
Presupuesto Oficial	: UF 7.700.000
Inversión Oferta Técnica (ITC):	UF 7.950.000
Asesoría IF	: Zañartu Ingenieros Consultores SPa. (Resolución DGOP N° 406 10.11.2008)

- La Concesión, está comprendida entre el Acceso Norte a Coronel y la localidad de Cerro Alto, con una extensión aproximada de 89 km.
- El trazado de la Ruta Concesionada, se desarrolla a través de las comunas de Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, y Los Álamos.
- El proyecto regulariza el perfil existente, a una doble calzada de dos pistas por sentido, de 3,5 metros de ancho cada una, en toda su extensión.
- Además incluye obras como: Mejoramiento de Estructuras Existentes, Construcción de Puentes, Pasarelas, Pasos Desnivelados, Nuevos Enlaces, Obras de Saneamiento, Señalización y Seguridad Vial, Iluminación, Paraderos Peatonales, Áreas de Servicios y aproximadamente 13 km de Calles de Servicio. Igualmente incorpora los baipás de Lota, Laraquete y Villa Los Ríos.




AVANCE DEL CONTRATO: En base a programa de avances presentado por la Sociedad Concesionaria, comparándolo con los avances reales y los hitos del contrato (al día 30 de cada mes):

Tramo A (Dm 14.300 – 61.835) : Avance de 100%
Tramo B (Dm 101.390 – 102.054) : Avance del 99,98%



AVANCE GENERAL
 (al 31 de Octubre de 2016):
99,99 %

PLANO DE UBICACIÓN

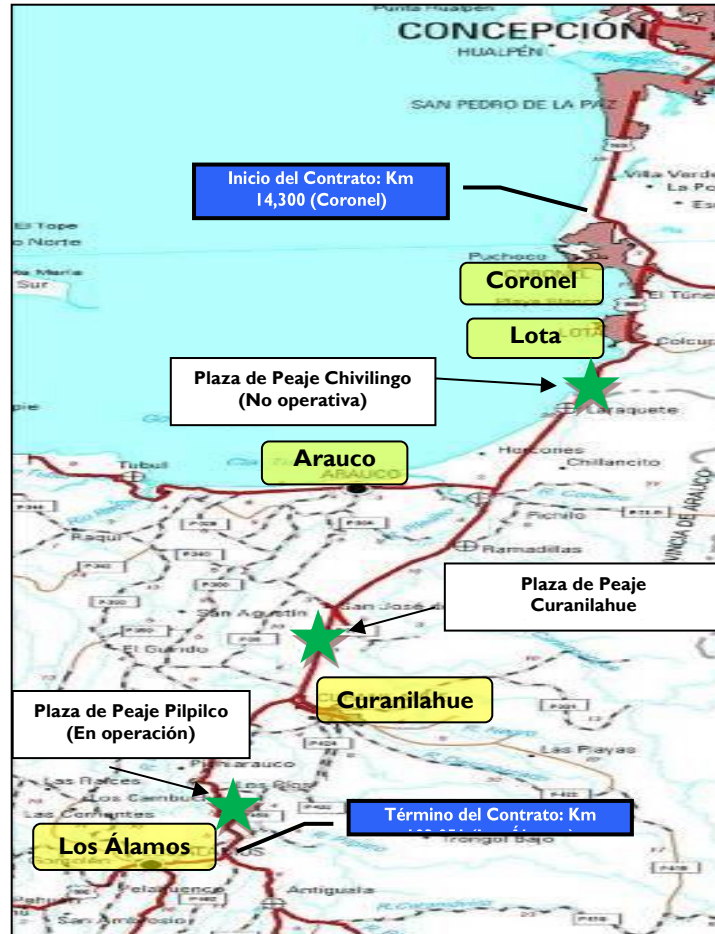

OBRAS EN EJECUCIÓN (Avance al 30.10.16)

No se registran trabajos en el contrato durante del mes de Octubre

TEMA RELEVANTE DEL MES

Con fecha 26 de octubre 2016 se realiza reunión en Sede de Taxis sector Erratchou, en donde participaron:

- Sr. Lester Poblete, Inspector Fiscal R-160
- Sra. Milly Sepúlveda, Presidenta JJVV Erratchou
- Vecinos del sector Erratchou
- Sr. Arturo Parada Asesoría a la Inspección Fiscal
- Ángel Benítez de la Asesoría a la Inspección Fiscal
- Roxana Paredes de Asesoría a la Inspección Fiscal

El tema a tratar fue dar a conocer respecto de las expropiaciones que se realizaran en el sector de Erratchou producto de la construcción de la calle de servicio y la pasarela tsunami.

REGISTRO FOTOGRAFICO

