

INFORME WEB

CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS – ACCESO NORTE A CORONEL

MES DE SEPTIEMBRE 2016

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	: Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel.
Concesionaria	: Soc. Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.
Decreto de Adjudicación	: D.S. M.O.P. N° 411 del 27.06.2008.
Publicación Diario Oficial	: 13.09.2008.
Región de Emplazamiento	: VIII Región del Biobío.
Inicio de la Concesión	: 13.09.2008.
Inicio Etapa Construcción	: 13.09.2008.
Plazo Etapa Construcción	: 47 Meses
Plazo de la Concesión	: 480 Meses.
Inspector Fiscal	: Lester Poblete Godoy.
Puesta en Servicio Provisoria:	
Tramo A	: 30.09.16 (Res. DGOP N°3497 del 29.09.2016)
Tramo B	: 13.08.13 (Res. DGOP N°3267 del 12.08.2013)
Convenios Complementarios	: D.S. MOP N°274 del 17.09.2013
Presupuesto Oficial	: UF 7.700.000
Inversión Oferta Técnica (ITC):	UF 7.950.000
Asesoría IF	: Zañartu Ingenieros Consultores SPa. (Resolución DGOP N° 406 10.11.2008)

- La Concesión, está comprendida entre el Acceso Norte a Coronel y la localidad de Cerro Alto, con una extensión aproximada de 89 km.
- El trazado de la Ruta Concesionada, se desarrolla a través de las comunas de Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, y Los Álamos.
- El proyecto regulariza el perfil existente, a una doble calzada de dos pistas por sentido, de 3,5 metros de ancho cada una, en toda su extensión.
- Además incluye obras como: Mejoramiento de Estructuras Existentes, Construcción de Puentes, Pasarelas, Pasos Desnivelados, Nuevos Enlaces, Obras de Saneamiento, Señalización y Seguridad Vial, Iluminación, Paraderos Peatonales, Áreas de Servicios y aproximadamente 13 km de Calles de Servicio. Igualmente incorpora los baipás de Lota, Laraquete y Villa Los Ríos.



Sello de juntas en reparaciones de baches, Eje 5 y Eje 8, sector Cerro Alto.




AVANCE DEL CONTRATO: En base a programa de avances presentado por la Sociedad Concesionaria, comparándolo con los avances reales y los hitos del contrato (al día 30 de cada mes):

Tramo A (Dm 14.300 – 61.835) : Avance de 100%
Tramo B (Dm 101.390 – 102.054) : Avance del 99,88%

AVANCE GENERAL
 (al 30 de Septiembre de 2016):
99,95 %

PLANO DE UBICACIÓN

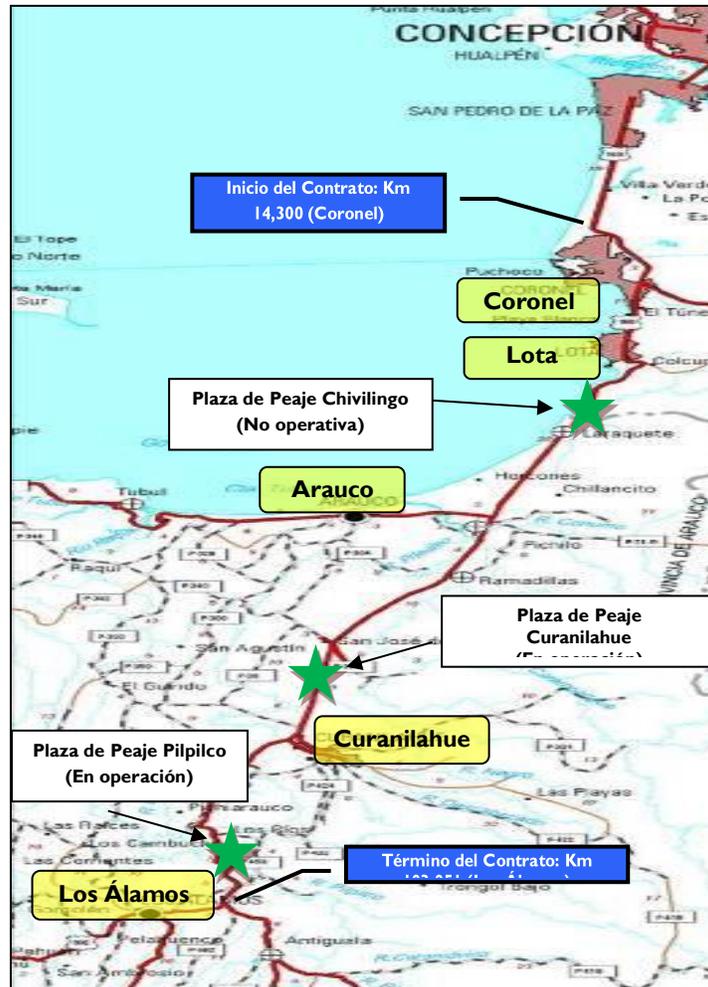

OBRAS EN EJECUCIÓN (Avance al 30.09.16)

Los trabajos realizados en el contrato durante del mes de Septiembre son los siguientes:

- Reparación de baches en pavimentos
- Cepillado de superficie en pavimentos
- Reposición de demarcación de pavimentos

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Colocación de Geogrilla, Riego de Liga y Mezcla Asfáltica en Bache Calzada Derecha Tramo A Sector II, By Pass de Laraquete del km: 45,220 – 45,271.



Fresado Bache; Calzada Izquierda Pista 4 Tramo A Sector II del km: 55,000 – 55,024.



Demarcación Horizontal, Eje N° 10 – Eje N° 8 – Eje N° 9 – Eje N° 11, Tramo B Sector Rotonda Cerro Alto km: 102,380.



TEMA RELEVANTE DEL MES

Con fecha 09 de septiembre 2016 se realiza reunión en la Alcaldía de Arauco, en donde participaron:

- Rodrigo Díaz W, Intendente Región del Biobío
- Humberto Toro, Gobernador Provincia de Arauco
- Mauricio Alarcón, Alcalde comuna de Arauco
- Lester Poblete Godoy, Inspector Fiscal R-160
- Tito Alfonso Fernández, Coordinador regional
- Omar Molina, Asesor Jurídico Municipalidad de Arauco
- Dirigentes vecinales sector Horcones
- Ivan Norambuena, Diputado
- Flor Weisse, Consejera Regional
- Pedro Cruz, Concejal
- Arturo Parada, Asesoría a la Inspección Fiscal R-160
- Roxana Paredes, Asesoría a la Inspección Fiscal

El motivo de la reunión fue la firma del Protocolo de Acuerdo, relativo al cierre de la mediana en el sector Horcones, el cual fue firmado por las autoridades y representantes de las comunidades presentes.

REGISTRO FOTOGRAFICO

