

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Relicitación Concesión Túnel El Melón
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del Proyecto	Región de Valparaíso, Provincias de Petorca y Quillota
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 3.026.000 + IVA
Longitud Aproximada Proyecto	5,2 km
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.
Accionistas del Concesionario	Compax Energía y Concesiones SpA. (25%) Constructora BELFI S.A. (50%) AURA INGENIERÍA S.A. (25%)
Decreto de Adjudicación	DS MOP N° 162 del 04-abr-2016
Plazo de la Concesión	180 meses (15 años) ó VPI ≥ ITC
Inicio de Ejecución de las Obras	12 de octubre de 2018
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	Res. N° 2315 de 30.06.2016
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	07 de septiembre de 2022
Término de la Concesión	Julio de 2031
Inspector Fiscal Titular	Víctor Raymondi Eldan
Inspector Fiscal Suplente	Lester Poblete Godoy
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Zañartu Ingenieros Consultores SpA.
Modificaciones al Contrato	Resolución DGC (Exenta) N° 278 de 04.02.2020
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	El proyecto no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
Subsidios	No tiene
Página Web de la Concesión	www.tunelelmelon.cl

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La Concesión Túnel El Melón, se emplaza aproximadamente entre los Dm 127.540 y 132.740 de la Ruta 5 Norte. Es de una longitud total aproximada de 5,2 km, y se ubica en las provincias de Petorca y Quillota, V Región de Valparaíso.



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de Concesión, denominado “Relicitación Concesión Túnel El Melón” consiste en la construcción, reparación, mantenimiento y explotación de las obras, con el objeto de mejorar el estándar técnico y los niveles de servicio de la actual vía concesionada.

INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE	INICIO Dm	Término Dm	Total m
Contrato Concesión	127.540	132.740	5.200
Túnel existente	129.385	131.920	2.535
Acceso Sur	127.540	129.385	1.845
Acceso Norte	131.920	132.740	820

PROYECTO CONSTRUCCIÓN	INICIO Dm	Término Dm	Total m
Longitud proyecto	127.445,00	132.861,14	5.416,14
Túnel Nuevo (*)	129.456,70	132.255,24	2.798,54
Acceso Sur	127.445,00	129.456,70	2.011,70
Acceso Norte	132.255,24	132.861,14	605,90

(*) No considera Túnel falso

Relicitación Concesión Túnel El Melón

JUNIO 2020

Al considerar los documentos aprobados, el avance del PID, corresponde a 82,30%

4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

- Obras de Mejoramiento de la Infraestructura Preexistente.
- Construcción de nuevo túnel aledaño al actual, diseñado para una velocidad de proyecto de 120 km/h.
- Mejoramiento de los accesos Norte y Sur, considerando rectificación de curvas, mejoramiento de los pavimentos existentes, modernización de la señalización y elementos de seguridad vial, entre otros.

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto denominado “Relicitación Concesión Túnel El Melón” mejorará el estándar, tanto técnico como de sus niveles de servicio para la actual vía concesionada; considerando para ello, tanto el aumento de los niveles de seguridad, así como el aumento de su capacidad vial, respecto de la anterior Concesión Túnel El Melón, respondiendo a mejorar las condiciones de seguridad y confort de los usuarios y las mayores solicitudes de tránsito previstas para la ruta para los siguientes años.

6. SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesión, son:

- Servicio de Conservación y reparación de las Obras
- Servicio de Gestión de Tráfico
- Servicio de Asistencia en Ruta
- Servicio de Atención de Usuarios
- Servicio de Gestión de Cobro y Facturación
- Servicio de Información al Usuario
- Implementa teléfonos de emergencia
- Cobro electrónico en la plaza de peaje

7. HECHOS RELEVANTES

- Con fecha 12 de octubre de 2018, se da inicio al proyecto de construcción Túnel El Melón II.
- Con fecha 23 de febrero de 2019, se da inicio a la construcción del Túnel Nuevo por el sector Norte.
- Con fecha 03 de abril de 2019, se da inicio a la construcción del Túnel Nuevo por el sector Sur.
- Cumplimiento del Hito de 7%: 07 de mayo de 2019
- Cumplimiento del Hito de 30%: 07 de diciembre de 2019

8. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

Al 31 de mayo de 2020, el avance en la revisión del Proyecto de Ingeniería de Detalle, es de un 100%

9. AVANCE DE LA OBRA

El 12 de octubre de 2018, mediante anotación en el Libro de Obra N° 3, Folio 34, el Inspector Fiscal autorizó el inicio de la construcción de las obras.

Las principales actividades en terreno ejecutadas al 31 de mayo, fueron las siguientes:

TÚNEL NORTE: El Avance en la excavación del Túnel, fue de 1.615,86 m, lográndose la unión con el túnel del frente Sur el día 12 de mayo de 2020.

CONEXIÓN PEATONAL N° 4: El avance en la excavación es de 165,43 m, alcanzado el 18 de diciembre 2019, el resto de la excavación (21,85 m), se ejecutará desde el Túnel existente.

CONEXIÓN PEATONAL N° 3: El avance en la excavación de esta conexión es de 141,28 m, alcanzado el 11 de marzo. El resto de la excavación (8,75 m) se realizará desde el T1.

CONEXIÓN VEHICULAR: Esta conexión se inició el 16.04.20 y su avance en la excavación es de 129,26 m, en roca CS3, a partir del día 29 de mayo.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN N° 2: La excavación del Centro de Transformación N° 2 se inició el 19.05.20, en roca CS3 y su avance es de 9,39 m.

TÚNEL SUR: El avance final del túnel, fue de 1.182,68 m al 12 de mayo, fecha de rotura.

CONEXIÓN PEATONAL N° 1: El avance es de 104,38 m, logrado el 5 de enero, los metros restantes (7,6 m) se abordarán desde el Túnel 1 (existente).

CONEXIÓN PEATONAL N°2: Esta conexión se inició el 11.02.20 y su avance en la excavación es de 139,75 m, logrado el 28.04.20. Los metros restantes (7,6 m), se ejecutarán desde el túnel existente.

Eje 1 y eje 4 Norte: Continuaron los trabajos en banquetas de los taludes.

Eje 2 zona Sur: Continúan los trabajos de excavación del talud Poniente, del banco 2, Dm 128.720 al 128.820, y del banco 4, Dm 128840 al 128.970 y además los trabajos de fortificación del talud (shotcrete, malla y pernos).

Eje 5 Sur: Excavada subrasante entre los Dm 250 y 190, se trabaja en la Obra de arte 2B ubicada en Dm 188,385.

Obra de Arte N° 9 (Doble tubo PAD D=1,5 m bajo eje 1 Norte): Continuaron los trabajos de excavación en TCN y roca en la mitad Oriente.

Obra de Arte N° 2B (Cajón Var. 2,5 m bajo eje 5 Sur): Se colocó moldaje y se hormigonó losa inferior el 01.06.20.

Atravesio Oriente (Cajón H.A. 4x4 bajo eje 1 Norte): Se colocó moldaje a las zapatas de muros ala de ambos lados oriente y poniente y se hormigonaron dichas zapatas el 28.05.20.

Túnel Falso Sur: Se coloca la enfierradura de la zapata fundación del muro oriente.


CT1: Se hormigón viga de losa superior el 26.05.20.

CT2: Se continúa con la excavación en roca de caverna para el centro de transformación en el interior de conexión vehicular.

CT3: Preparativos para colocación malla a tierra.

Al mes de mayo de 2020, se lleva un Avance Financiero de ejecución de obra, de 49,35%

Mes- Año	Avance Físico de la Obra (%)		
	Anterior	Actual	Acumulado
Octubre-2018	0,00	0,63	0,63
Noviembre-2019	0,63	0,87	1,50
Diciembre-2018	1,50	0,65	2,15
Enero-2019	2,15	0,35	2,50
Febrero-2019	2,50	0,88	3,38
Marzo-2019	3,38	1,87	5,25
Abril-2019	5,25	3,94	9,19
Mayo-2019	9,19	2,23	11,42
Junio-2019	11,42	2,08	13,50
Julio-2019	13,50	2,18	15,68
Agosto-2019	15,68	2,35	18,03
Septiembre-2019	18,03	2,36	20,39
Octubre-2019	20,39	4,05	24,44
Noviembre-2019	24,44	4,42	28,86
Diciembre-2019	28,86	3,62	32,48
Enero-2020	32,48	2,91	35,39
Febrero-2020	35,39	2,99	38,38
Marzo-2020	38,38	3,18	41,56
Abril-2020	41,56	4,54	46,10
Mayo-2020	46,10	3,25	49,35

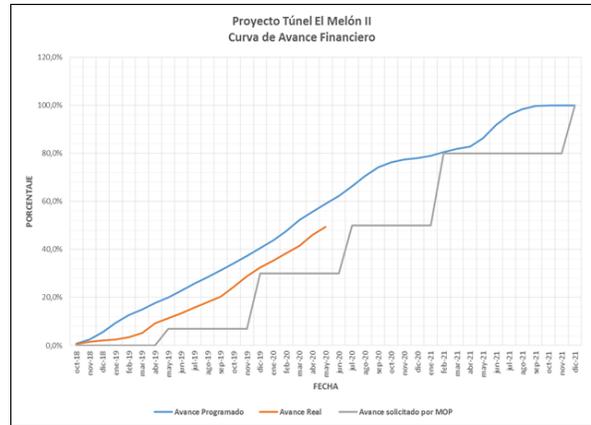

10. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



Vista panorámica Portal Norte



Túnel Norte, pavimento pista derecha




Vista panorámica Portal Sur




11. ETAPA DE OPERACIÓN DE LA CONCESIÓN

11.1 INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)

El flujo vehicular durante el mes de mayo fue de 120.659 distribuidos en las 7 categorías existentes. De este flujo, el 59,20% corresponde a vehículos livianos y el 40,80%, restante a vehículos pesados.

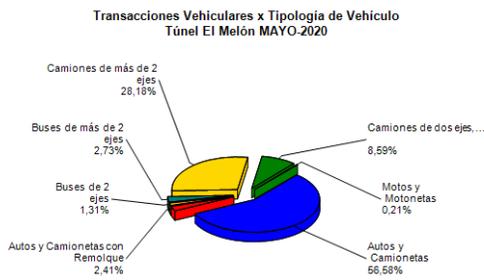


El flujo aumentó en un 0,18% respecto al mes anterior, y se redujo en un 53,64% respecto al mismo mes del año anterior.

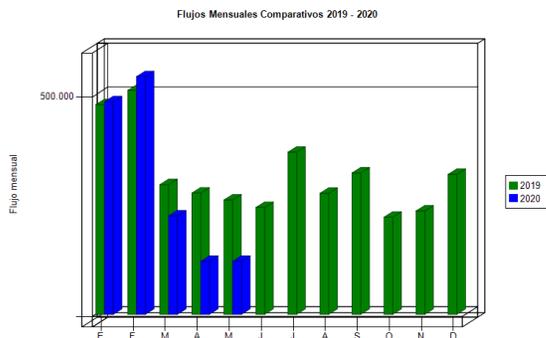

11.2 INFORMACIÓN DE INGRESOS


Comparativo años 2019 – 2020

El ingreso mensual del mes de mayo, corresponde a \$ 507.466.750

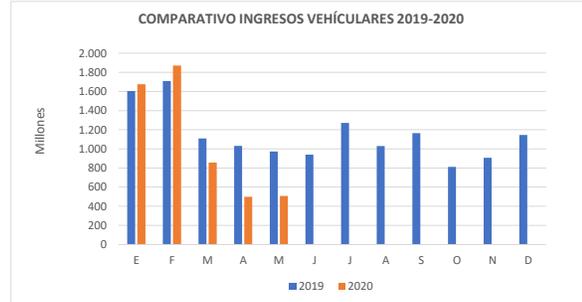


11.3 ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2019 - 2020

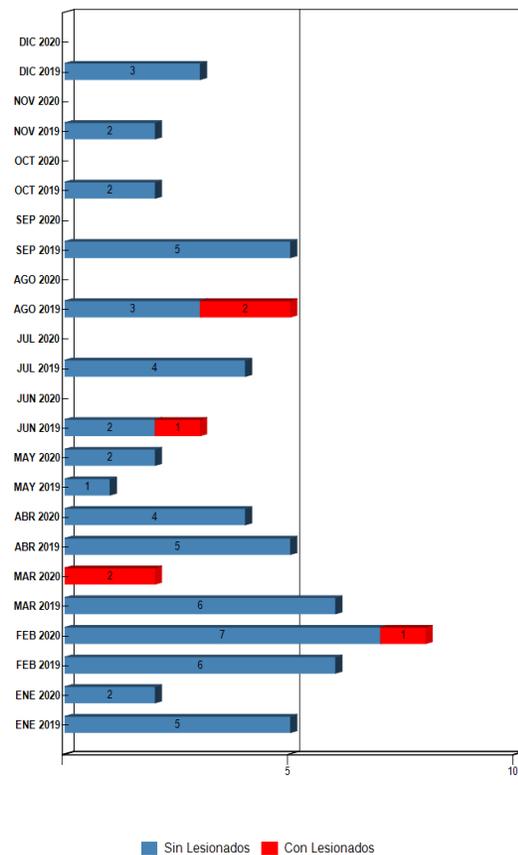


11.5 ASISTENCIA AL USUARIO

Distribución de Lesionados Túnel El Melón MAYO-2020



Año	Mes	N° de Atenciones									Total asistencia
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2018	Enero	67	29		21				211	7	265
	Febrero	71	35		19				133	8	266
	Marzo	37	29		23				98	13	200
	Abril	31	16		14				54	3	118
	Mayo	47	17		11				71	5	151
	Junio	25	17		12				50	3	107
	Julio	47	31		29				89	4	200
	Agosto	38	14		7				64	4	127
	Septiembre	66	27		23				95	7	218
	Octubre	49	32		21				65	10	177
	Noviembre	54	21		15				69	7	166
	Diciembre	53	25		26				79	23	206
2019	Enero	77	33		46				121	23	300
	Febrero	57	24		34				92	19	226
	Marzo	46	14		14				61	16	151
	Abril	41	23		19				62	15	160
	Mayo	41	27		22				63	13	166
	Junio	52	15	1	5		1	1	56	14	145
	Julio	60	16	1	23				71	27	198
	Agosto	53	21		7				57	18	156
	Septiembre	70	29		17				71	35	222
	Octubre	61	23	1	5				62	33	185
	Noviembre	64	25		4				65	25	183
	Diciembre	61	18	1	6				61	13	160
2020	Enero	95	46		17				94	29	281
	Febrero	112	44		19				112	24	311
	Marzo	49	18		22				51	24	164
	Abril	16	4		8				16	22	66
	Mayo	25	4		7				25	14	66
TOTALES año 2020	272	112	0	66	0	0	0	273	95	822	

Distribución Tipos de Accidentes Túnel El Melón MAYO-2020



Tipos de atenciones de los servicios	
1: Reparación del vehículo in situ	
2: Remolque del vehículo en panne	
3: Panne por falta combustible del vehículo	
4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio	
5: Primeros auxilios	
6: Auxilio en accidentes	
7: Traslado de usuario a centro asistencial	
8: Instalación de señalización preventiva	
9: Otros	

11.4 CONSULTAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS DE USUARIOS

CASUÍSTICAS	marzo	abril	mayo
CALIDAD DE SERVICIO	48	35	38
COMERCIALES	12	10	13
ESTADO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA	0	0	0
FACTORES DE ACCIDENTABILIDAD	3	6	3
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	0	0	0
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	28	1	0
TOTALES	91	52	54
