

## 1. ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto:	Hospital de Antofagasta
Presupuesto Estimativo Neto:	UF 5.300.000
Organismo Administrador:	Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP
Mandantes:	Ministerio de Salud Subsecretaría Redes Asistenciales Servicio Salud Antofagasta
Nombre del Concesionario:	Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.
Decreto de Adjudicación:	Decreto Supremo N° 141 de 26.02.2013
Fecha de Inicio Concesión:	21 de junio de 2013
Plazo de Concesión:	30 semestres corridos desde la autorización de pagos de subsidios
Desarrollo Proyecto Definitivo:	300 días desde el inicio de la concesión
Inicio de Obras	2 <sup>er</sup> trimestre de 2014
Plazo de la Puesta en servicio provisoria de la obra (PSP):	2° trimestre de 2017
Puesta en Servicio Definitiva (PSD):	2° semestre año 2018
Inspector Fiscal:	Hernán Marambio Monteverde
Asesoría a la Inspección Fiscal:	Zañartu Ingenieros Consultores SpA

## 1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO



Emplazamiento Área de Concesión



(Foto de ubicación)

## 1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de concesión “Hospital de Antofagasta” comprende la construcción de un establecimiento de alta complejidad en el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II Región, en la ciudad de Antofagasta.

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios Complementarios.

## 1.3 NUEVAS INVERSIONES.

Al mes de octubre de 2017 no existen nuevas inversiones

## 2. PRINCIPALES OBRAS

Considera la construcción de tres edificios principales, Torre de Hospitalización (TH) de 9 pisos, Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) de 4 pisos y Unidad de Pacientes Críticos (UPC) de 4 pisos, además considera la construcción de una Cafetería, un Auditorio, un Jardín Infantil, un Helipuerto, Estacionamientos subterráneo y exterior y una Multicancha entre otros. También se incluye en el proyecto la Adquisición y Reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico (EM y MC) y Mobiliario No Clínico (MNC).

### 2.1. AVANCES

- **Avance General de las Obras:** al 30 de octubre de 2017 es de 100%.
- **Avance General del Contrato:**
  - ✓ Edificios Principales (TH, CDT y UPC): 100%
  - ✓ Cafetería: 100%
  - ✓ Auditorio: 100%
  - ✓ Jardín Infantil: 100%
  - ✓ Marquesina: 100%
  - ✓ Estacionamiento subterráneo: 100%
  - ✓ Estanques agua subterráneo: 100%
  - ✓ Estacionamiento Exterior y Multicancha: 100%
  - ✓ Helipuerto: 100%
  - ✓ Instalación del EM y MC: 100%
  - ✓ Instalación del MNC: 100%

### 2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES

Las siguientes partidas fueron las que tuvieron los principales avances respecto del mes anterior:

- I. Obras Exteriores: 1.22%; llegando a un 100% acumulado.

Las principales obras obedecen a Estructura Estacionamiento Exterior, Cierre del área de concesión, Pavimentos de Hormigón, Jardinería y Mobiliario.

**2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS**

**VISTAS EXTERIORES**



Auditorio



Acceso principal



Cafetería



Edificio Torre de Hospitalización – TH – esquina calles Azapa/Víctor Jara



Jardín Infantil (izquierda), edificio UPC (derecha)


**INTERIORES HALL ACCESO PRINCIPAL**



Puerta acceso y senderos de colores indicativos hacia Consultas Externas



Hall de acceso, Entrada a Cafetería (izquierda), Salida Exterior del Auditorio (derecha)

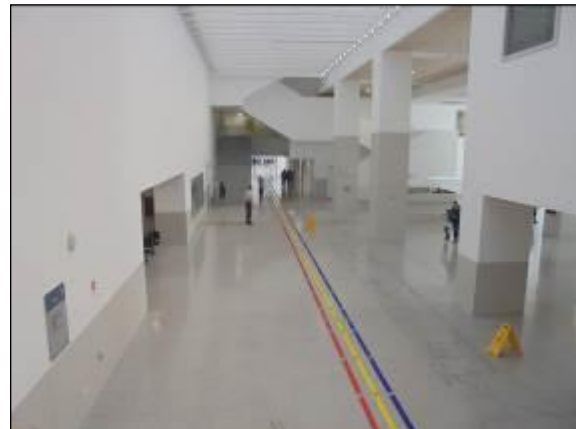

Senderos señalizados con colores según recinto o especialidad

## ZONAS DE SERVICIOS ABIERTOS A PÚBLICO



Toma de Muestras



UNACCESS



Consultas Adultos, Medicina Física



Consultas Externas

### 3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS OCTUBRE 2017

#### I. Solicitud de Puesta en Servicio Provisoria

La Sociedad Concesionaria mediante carta GG-IF N° 3108, de 13 de octubre de 2017, informa a la Inspección Fiscal que con carta SC-GG N° 185, de 13 de octubre de 2017, dirigida al Director General de Obras Públicas, solicita la Autorización de Puesta en Servicio Provisoria del Hospital de Antofagasta.

El Director General de Obras Públicas, mediante resolución DGOP N° 4006, de 16 de octubre de 2017, autoriza la Puesta en Servicio Provisoria, a partir de las 00:00 horas del día 17 de octubre de 2017.

#### II. Funcionamiento Piloto

Con fecha 13 de octubre de 2017, se comienza con el funcionamiento piloto del Hospital de Antofagasta.
