

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví Tipología del Contrato Infraestructura Vial Interurbana Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas Región de Valparaíso. Provincias de Quillota y Valparaíso, Comunas de Nogales y Puchuncaví. Presupuesto Oficial del Proyecto UF 5.250.000 + IVA Longitud del Proyecto Ruta F-20, 27 km, S1 By Pass Puchuncaví, 7 km, S2 Variante Ventanas, 9 km, S3 Nombre del Concesionario Accionistas del Concesionario Accionistas del Concesionario Ocamino Nogales-Puchuncaví S.A. Aleatica S.A. (ex − OHL Concesiones) (0.4%). Aleatica S.A. (ex − OHL Concesiones) (0.4%). Aleatica S.A. J. (ex − OHL Concesiones) (0.4%). Aleatica S.		
Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas Región de Valparaíso. Provincias de Quillota y Valparaíso, Comunas de Nogales y Puchuncaví. Presupuesto Oficial del Proyecto Proyecto Ruta F-20, 27 km, S1 By Pass Puchuncaví, 7 km, S2 Variante Ventanas, 9 km, S3 Nombre del Concesionario Accionistas del Concesionario Decreto de Adjudicación Decreto de Adjudicación Plazo de la Concesión Plazo máximo de 38 años o cuando se cumpla que VPI m >= ITC, lo primero que ocurra. Inicio de Ejecución de las Obras Paso máximo de 38 años o cuando se cumpla que VPI m >= ITC, lo primero que ocurra. Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Plazo máximo de la concesión Plazo máximo de la concesión Plazo máximo de 38 años o cuando se cumpla que VPI m >= ITC, lo primero que ocurra. Se da autorización al Inicio de obras el 24.06.2020 PSPP S1 y S2 20.04.2023 y 20.01.2024 Según numeral 1.10.2 de las BALI, la SC deberá solicitar la PSD de las obras dentro del plazo de 6 meses desde la PSP parciales de las obras. Plazo máximo de la concesión Claudio Asenjo Schultz Inspector Fiscal Titular Claudio Asenjo Schultz Notor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. DS MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 11 del 07.03.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (EX) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (EX) DGC 1204 de 18.04.2023 Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Subsidios No tiene.	Nombre del Contrato	
Emplazamiento del Proyecto Región de Valparaíso. Provincias de Quillota y Valparaíso, Comunas de Nogales y Puchuncaví. Presupuesto Oficial del Proyecto Ruta F-20, 27 km, S1 By Pass Puchuncaví, 7 km, S2 Variante Ventanas, 9 km, S3 Nombre del Concesionario Accionistas del Concesionario Accionistas del Concesionario Decreto de Adjudicación Decreto de Adjudicación Plazo de la Concesión Plazo máximo de 38 años o cuando se cumpla que VPI m >= ITC, lo primero que ocurra. Inicio de Ejecución de las Obras PSPP S1 y S2 20.04.2023 y 20.01.2024 Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Plazo máximo de la concesión Plazo máximo de la concesión 23 de agosto del 2054 Inspector Fiscal Titular Claudio Asenjo Schultz Victor Raymondi Eldan Victor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. DS MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 16 del 17.03.2023 Res. (EX) DGC 1204 de 18.04.2023 Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Ruta F-20, 27 km, S1 By Pac Puchuncaví, 7 km, S2 Variante Ventanas, 9 km, S3 Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales-Puchuncaví 7 km, S2 Variante Ventanas, 9 km, S3 Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales-Puchuncaví 7 km, S2 Variante Ventanas, 9 km, S3 Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales-Puchuncaví, 7 km, S2 Variante Ventanas, 9 km, S3 Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales-Puchuncaví, 7 km, S2 Variante Ventanas, 9 km, S3 Pago Decreto Supremo MOP Nº 199 de OP JL Open OP 199 de OP 1	Tipología del Contrato	Infraestructura Vial Interurbana
Emplazamiento del Proyecto Provincias de Quillota y Valparaíso, Comunas de Nogales y Puchuncaví. Presupuesto Oficial del Proyecto Ruta F-20, 27 km, S1 By Pass Puchuncaví, 7 km, S2 Variante Ventanas, 9 km, S3 Nombre del Concesionario Accionistas del Concesionario Accionistas del Concesionario Decreto de Adjudicación Decreto Supremo MOP Nº 199 de 07 junio de 2016, publicado en el Diario Oficial el 23 de agosto de 2016 Plazo máximo de 38 años o cuando se cumpla que VPI m >= ITC, lo primero que ocurra. Inicio de Ejecución de las Obras Plazo máximo de 38 años o cuando se cumpla que VPI m >= ITC, lo primero que ocurra. Inicio de Ejecución de las Obras el 24.06.2020 PSPP S1 y S2 20.04.2023 y 20.01.2024 Según numeral 1.10.2 de las BALI, la SC deberá solicitar la PSD de las obras dentro del plazo de 6 meses desde la PSP parciales de las obras. Plazo máximo de la concesión Inspector Fiscal Titular Claudio Asenjo Schultz Victor Raymondi Eldan Victor Raymondi Eldan Modificaciones al Contrato Modificaciones al Contrato Estado de Calificación Ambiental del Proyecto No tiene.	Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Proyecto Longitud del Proyecto Ruta F-20, 27 km, S1 By Pass Puchuncaví, 7 km, S2 Variante Ventanas, 9 km, S3 Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales-Puchuncaví S.A. Aleatica S.A. (ex – OHL Concesiones) (0.4%). Aleatica S.A.U. (ex – OHL Concesiones Chile S.A.) (99.6%) Decreto de Adjudicación Decreto Supremo MOP N° 199 de 07 junio de 2016, publicado en el Diario Oficial el 23 de agosto de 2016 Plazo máximo de 38 años o cuando se cumpla que VPI m >= ITC, lo primero que ocurra. Inicio de Ejecución de las Obras Pspp S1 y S2 20.04.2023 y 20.01.2024 Según numeral 1.10.2 de las BALI, la SC deberá solicitar la PSD de las obras dentro del plazo de 6 meses desde la PSP parciales de las obras. Plazo máximo de la concesión Claudio Asenjo Schultz Inspector Fiscal Titular Claudio Asenjo Schultz Victor Raymondi Eldan Victor Raymondi Eldan Victor Raymondi Eldan Modificaciones al Contrato Modificaciones al Contrato DS MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 211 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 1204 de 18.04.2023 Estado de Calificación Ambiental del Proyecto No tiene.	Emplazamiento del Proyecto	Provincias de Quillota y Valparaíso, Comunas de Nogales
Longitud del Proyecto By Pass Puchuncaví, 7 km, S2 Variante Ventanas, 9 km, S3 Nombre del Concesionario Sociedad Concesionaria Nuevo Camino Nogales-Puchuncaví S.A. Accionistas del Concesionario Aleatica S.A. (ex − OHL Concesiones) (0.4%). Aleatica S.A.U (ex − OHL Concesiones Chile S.A.) (99.6%) Decreto de Adjudicación Decreto Supremo MOP № 199 de 07 junio de 2016, publicado en el Diario Oficial el 23 de agosto de 2016 Plazo de la Concesión Plazo máximo de 38 años o cumpla que VPI m >= ITC, lo primero que ocurra. Inicio de Ejecución de las Obras Se da autorización al Inicio de obras el 24.06.2020 PSPP S1 y S2 20.04.2023 y 20.01.2024 Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Según numeral 1.10.2 de las BALI, la SC deberá solicitar la PSD de las obras dentro del plazo de 6 meses desde la PSP parciales de las obras. Plazo máximo de la concesión 23 de agosto del 2054 Inspector Fiscal Titular Claudio Asenjo Schultz Inspector Fiscal Suplente Víctor Raymondi Eldan Asesoría a la Inspección Fiscal Suplente Víctor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. Modificaciones al Contrato DS MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 216 del 14.03.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.20203 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res		UF 5.250.000 + IVA
Accionistas del Concesionario Aleatica S.A. (ex – OHL Concesiones) (0.4%). Aleatica S.A.U. (ex – OHL Concesiones) (0.4%). Aleatica S.A.U. (ex – OHL Concesiones Chile S.A.) (99.6%) Decreto de Adjudicación Decreto Supremo MOP N° 199 de 07 junio de 2016, publicado en el Diario Oficial el 23 de agosto de 2016 Plazo de la Concesión Plazo máximo de 38 años o cuando se cumpla que VPI m >= ITC, lo primero que ocurra. Inicio de Ejecución de las Obras PSPP S1 y S2 20.04.2023 y 20.01.2024 Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Plazo máximo de la concesión Plazo máximo de la concesión Inspector Fiscal Titular Claudio Asenjo Schultz Victor Raymondi Eldan Victor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. DS MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 11 del 19.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Estado de Calificación Ambiental del Proyecto No tiene.	Longitud del Proyecto	By Pass Puchuncaví, 7 km, S2
Accionistas del Concesionario Concesiones) (0.4%). Aleatica S.A.U. (ex — OHL Concesiones Chile S.A.) (99.6%) Decreto Supremo MOP N° 199 de 07 junio de 2016, publicado en el Diario Oficial el 23 de agosto de 2016 Plazo máximo de 38 años o cuando se cumpla que VPI m >= ITC, lo primero que ocurra. Inicio de Ejecución de las Obras PSPP S1 y S2 20.04.2023 y 20.01.2024 Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Plazo máximo de la concesión Según numeral 1.10.2 de las BALI, la SC deberá solicitar la PSD de las obras dentro del plazo de 6 meses desde la PSP parciales de las obras. Plazo máximo de la concesión Claudio Asenjo Schultz Inspector Fiscal Titular Claudio Asenjo Schultz Victor Raymondi Eldan Víctor Raymondi Eldan Víctor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. DS MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 211 del 19.04.2022 DS MOP 211 del 19.04.2023 DS MOP 211 del 19.04.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 BS MOP 216 del 14.03.2023 Estado de Calificación Ambiental del Proyecto No tiene.	Nombre del Concesionario	
Decreto de Adjudicación O7 junio de 2016, publicado en el Diario Oficial el 23 de agosto de 2016 Plazo de la Concesión Plazo máximo de 38 años o cuando se cumpla que VPI m >= ITC, lo primero que ocurra. Inicio de Ejecución de las Obras Se da autorización al Inicio de obras el 24.06.2020 PSPP S1 y S2 20.04.2023 y 20.01.2024 Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Según numeral 1.10.2 de las BALI, la SC deberá solicitar la PSD de las obras dentro del plazo de 6 meses desde la PSP parciales de las obras. Plazo máximo de la concesión Claudio Asenjo Schultz Inspector Fiscal Suplente Victor Raymondi Eldan Víctor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. Modificaciones al Contrato Modificaciones al Contrato Modificación Según numeral 1.10.2 de las BALI, la SC deberá solicitar la PSD de las obras dentro del plazo de 6 meses desde la PSP parciales de las obras. Víctor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. Modificaciones al Contrato El MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 211 del 07.03.2023 DS MOP 211 del 07.03.2023 DS MOP 211 del 07.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 1204 de 18.04.2023 Estado de Calificación Ambiental del Proyecto No tiene.	Accionistas del Concesionario	Concesiones) (0.4%). Aleatica S.A.U. (ex – OHL
Plazo de la Concesión cuando se cumpla que VPI m >= ITC, lo primero que ocurra. Inicio de Ejecución de las Obras PSPP S1 y S2 20.04.2023 y 20.01.2024 Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Plazo máximo de la concesión Plazo máximo de la concesión Plazo máximo de la concesión Claudio Asenjo Schultz Inspector Fiscal Titular Claudio Asenjo Schultz Victor Raymondi Eldan Victor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. DS MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 211 del 07.03.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Decreto de Adjudicación	07 junio de 2016, publicado en el Diario Oficial el 23 de agosto de
Obras obras el 24.06.2020 PSPP S1 y S2 20.04.2023 y 20.01.2024 Según numeral 1.10.2 de las BALI, la SC deberá solicitar la PSD de las obras dentro del plazo de 6 meses desde la PSP parciales de las obras. Plazo máximo de la concesión Plazo máximo de la concesión Claudio Asenjo Schultz Inspector Fiscal Titular Claudio Asenjo Schultz Victor Raymondi Eldan Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción y Explotación Modificaciones al Contrato Modificaciones al Contrato DS MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 168 del 22.02.2023 DS MOP 211 del 07.03.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 1204 de 18.04.2023 Estado de Calificación Ambiental del Proyecto No tiene.	Plazo de la Concesión	cuando se cumpla que VPI m >=
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Según numeral 1.10.2 de las BALI, la SC deberá solicitar la PSD de las obras dentro del plazo de 6 meses desde la PSP parciales de las obras. Plazo máximo de la concesión Inspector Fiscal Titular Claudio Asenjo Schultz Inspector Fiscal Suplente Victor Raymondi Eldan Víctor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. DS MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 211 del 07.03.2023 DS MOP 211 del 07.03.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27		
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras la SC deberá solicitar la PSD de las obras dentro del plazo de 6 meses desde la PSP parciales de las obras. Plazo máximo de la concesión 23 de agosto del 2054 Inspector Fiscal Titular Claudio Asenjo Schultz Inspector Fiscal Suplente Victor Raymondi Eldan Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción y Explotación SMOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 211 del 07.03.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 1204 de 18.04.2023 Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Subsidios No tiene.	PSPP S1 y S2	20.04.2023 y 20.01.2024
Inspector Fiscal Titular Claudio Asenjo Schultz Victor Raymondi Eldan Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción y Explotación Modificaciones al Contrato Modificaciones al Contrato Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Claudio Asenjo Schultz Víctor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. DS MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 211 del 07.03.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 1204 del 18.04.2023 El proyecto no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Subsidios No tiene.		la SC deberá solicitar la PSD de las obras dentro del plazo de 6 meses desde la PSP parciales de
Inspector Fiscal Suplente Victor Raymondi Eldan Víctor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. DS MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 168 del 22.02.2023 DS MOP 211 del 07.03.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 1204 del 18.04.2023 Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Subsidios Víctor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. Subsidios Víctor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. Silvando P. 204 del 26.02.2022 DS MOP 214 del 19.04.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 1204 del 18.04.2023 Estado de Calificación Ambiental del Proyecto No requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Subsidios	Plazo máximo de la concesión	23 de agosto del 2054
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción y Explotación Modificaciones al Contrato Modificaciones al Contr	Inspector Fiscal Titular	Claudio Asenjo Schultz
Assoria a la inspección Fiscal de Construcción y Explotación Consultora de Ingeniería Civil E.I.R.L. DS MOP 204 del 26.02.2022 DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 168 del 22.02.2023 DS MOP 211 del 07.03.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 1204 de 18.04.2023 Estado de Calificación Ambiental del Proyecto El proyecto no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Subsidios No tiene.	Inspector Fiscal Suplente	Victor Raymondi Eldan
Modificaciones al Contrato DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 168 del 22.02.2023 DS MOP 211 del 07.03.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 1204 de 18.04.2023 Estado de Calificación Ambiental del Proyecto El proyecto no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Subsidios No tiene.		Consultora de Ingeniería Civil
Ambiental del Proyecto Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Subsidios No tiene.	Modificaciones al Contrato	DS MOP 11 del 19.04.2022 DS MOP 168 del 22.02.2023 DS MOP 211 del 07.03.2023 DS MOP 216 del 14.03.2023 Res. (Ex) DGC 005 del 27.02.2023 Res. (Ex) DGC 1204 de
		Sistema de Evaluación de Impacto
Página Web de la Concesión www.canopsa.cl	Subsidios	No tiene.
	Página Web de la Concesión	www.canopsa.cl

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto denominado "Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví" se ubica en la Región de Valparaíso y en las Provincias de Quillota y Valparaíso, el cual tiene como trazado principal la Ruta F-20 que conecta la ruta 5 a la altura de la comuna Nogales con la ruta F-30-E en el sector de Puchuncaví. En esta intersección se genera un By Pass Puchuncaví que se emplaza hasta el acceso sur de Maitencillo y una Variante denominada Ventanas que se orienta hacia al sur hasta la comuna de Quintero.



3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto denominado "Relicitación Concesión Camino Nogales-Puchuncaví" se ubica en la Región de Valparaíso y en las Provincias de Quillota y Valparaíso, tiene por objetivo dotar de mayor capacidad vial a la concesión actual, disminuyendo los actuales niveles de congestión, principalmente en períodos estivales y fines de semana largo, además de proporcionar mejores estándares técnicos, cuyas prestaciones buscan un mejor confort, potenciar el desarrollo económico y social de la Región y mayores niveles de seguridad para los usuarios.

Se presenta a continuación una descripción general de las Principales Obras que conforman este proyecto de concesión.

Sector	Subsector	Dm Inicial	Dm Final	Longitud (km)
1	Ruta 5 Norte – Plaza de Peaje	0	6.500	6.5
1	Plaza de Peaje- Fin de Cuesta	6.500	19.000	12.500
1	Fin de Cuesta- Fin Concesión Actual	19.000	25.840	6.840
2	Variante Puchuncaví	25.840	32.975	7.135
3	Variante Ventanas	52.500	61.000	8.500



4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Obras de mejoramiento de la Infraestructura Preexistente:

- Mejoramiento a lo largo del camino, considerando rectificación de curvas, pendientes, modernización de la señalización, entre otros. En general, una actualización del camino en cuanto a su geometría y elementos de seguridad de acuerdo con las actuales exigencias de la normativa vigente.
- Rediseño de los lazos del enlace actual de Nogales (enlace F-20 con Ruta 5 Norte).
- Aumento de las casetas en plaza de peaje.
- Ampliación de las oficinas del Inspector Fiscal y las asesorías.
- Construcción de veredas en calle las Romazas en la comuna de Nogales, en 1.000 m, a ambos costados de la calle, la que deberá considerar la poda de árboles y arbustos localizados en los cercos existentes y un sistema de reducción de velocidad e instalación de poste con luz y rejas de segregación para el cruce peatonal correspondiente al jardín infantil localizado al término de dicha calle.

Nuevas Obras de la Concesión:

- Construcción de una vía en doble calzada de dos pistas por sentido, en el sector de cuesta, en el tramo de inicio y fin de la Ruta F-20.
- Construcción de enlaces desnivelados: enlace cruce Ferrocarril, enlace cruce calle Huellacanal, enlace cruce Ruta F-220 oriente (cumbre de cuesta), enlace cruce Ruta F-220 poniente (acceso camino en dirección a Chilicauquén), enlace Ruta F-190, reconstrucción del enlace Puchuncaví, todos ellos con sus respectivos elementos de iluminación y paisajismo.
- Nuevos puentes: Segundo puente Nogales, ambos puentes de Pucalán y Puchuncaví.
- Pasos de ganado.
- Construcción de calles locales para acceso a las propiedades y conexiones a enlaces.
- Incorporación de cobro electrónico en las plazas de peajes.
- Implementación de teléfonos de emergencia e incorporación de señalización variable.
- Implementación de elementos de seguridad vial.
- By Pass Puchuncaví; nuevo trazado en doble calzada de 2 pistas por sentido, de 7 km aproximadamente, que se emplazará al poniente de la Ruta F30E que corresponde al borde costero que conecta hacia los balnearios de Maitencillo, Cachagua, Zapallar, entre otros.
- Construcción de la Variante Ventanas en una calzada simple de 9 km aproximadamente, que se emplazará al oriente de la actual Ruta F30E, en el sector comprendido entre el actual acceso a Quintero hasta el enlace Puchuncaví, este último, correspondiente a la Concesión Camino Nogales-Puchuncaví.

Puentes	Dimensiones	Dm. Proyecto
	Luz = 37.3+30.2m,	
Estero Nogales	Gálibo máx. = 5.65m	0.901
	Luz = 11.5m, Gálibo	
Estero Pucalán	máx. = 5.12m	2.400
Estero	Luz = 38m, Gálibo máx.	
Puchuncaví	= 4.39m	25.300
Estero	Luz = 38m, Gálibo máx.	
Puchuncaví II	= 4.30m	1.120
	Luz = 12.2m, Gálibo	
Los Maitenes	máx. = 4.45m	4.240

Paso Superior	Dimensiones	Dm. Proyecto
	Luz = 12m, Gálibo =	
Fresia	6.30m (min).	1.400
	Luz = 12m, Gálibo =	
Las Romazas	6.30m (min).	1.530
	Luz = 12m, Gálibo = 5m	
Huellacanal	(min).	2.815
	Luz = 12m, Gálibo =	
Enlace Cumbre	5m (min).	11.436
Enlace Pucalán	Luz = 12m, Gálibo =	
II	5m (min).	18.115
	Luz = 18,09m, Gálibo =	
Enlace F-190	5m (min).	23.980
Enlace	Luz = 20m, Gálibo =	
Campiche	5.02m (min).	26.760
	Luz = 11m, Gálibo =	
Quirilluca	5.38 – 5.69m (min).	28.730
	Luz = 14m, Gálibo =	
Las Lomas	6.60 – 7.89m.	32.265
	Luz = 12m, Gálibo =	
Enlace Central	6.04 – 8.44m.	5.100
Enlace	Luz = 9m, Gálibo =	
Quintero	6.85m.	8.100



Maqueta Virtual, Ruta F-20 doble calzada, Sector PS Las Romazas.



5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto contribuye a mejorar el estándar técnico y los niveles de servicio de la vía actual; considerando para ello, aumentar tanto la capacidad vial existente como los actuales niveles de seguridad, mejorando las condiciones de confort de los usuarios y respondiendo a las mayores solicitaciones de tránsito previstas para la ruta en los próximos años, incluyendo una mantención de tarifa, y ahorros de tiempo.

- Disminuye los tiempos de viaje
- Aumentan los niveles de seguridad para los usuarios de la vía.
- Mejora el nivel de servicio de la misma, que en la actualidad presenta altos niveles de saturación en ciertos períodos del año.
- Aumento de conectividad con dos By Pass Variante Puchuncaví y Variante Ventanas

6.- SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesión son:

- Doble Calzada Ruta F-20.
- Nuevo By Pass Puchuncaví.
- Nueva Variante Ventanas.
- Servicio de Conservación de las Obras.
- Sistema Informático para la Constatación del nivel de Servicio (SIC-NS).
- Sistema de Información Geográfico (SIG).

7.- HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes en el periodo.

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

Actualmente, el avance de ingeniería definitiva en el Sector 1 es del 100%. En cuanto al Sector 2 es del orden del 78,60%.

9.- AVANCE DE OBRAS


De acuerdo a lo corroborado por la Inspección Fiscal del contrato; el Sector 1 y Sector 2 registran un avance del 89,14% y 65,97% respectivamente.

Nota: Los porcentajes de avance son respecto a la Inversión Total a materializar por cada sector.

12.- DESPCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



Puente Nogales – Vista general.



P.S. Las Romazas - Vista general.



Pasarela N° 3 - Vista General.

11.- OPERACIÓN DE LA RUTA

11.1- INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR TOTAL MENSUAL (Veh)

Camino rogales - i denuncar rico




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2022 - 2023 Fuente: Reporte SICE 28




Gráfico 2: Transacciones vehiculares por tipología de vehículo. Fuente: Reporte SICE 29

Gráfico 3: Distribución de Flujos, por Plaza de Peaje

Fuente: Reporte SICE 29

100,00% | Troncal Nogales... -

Comparativa años 2022 - 2023

El flujo vehicular total durante el mes de noviembre de 2023 fue de 113.253 vehículos, distribuidos en las 7 categorías de vehículos existentes y el 100% de ellos circuló por la plaza de peaje troncal NOGALES, que es la única operable a la fecha. De este flujo, el 87,37%, corresponde a vehículos livianos y el 12,63% restante, a vehículos pesados. Asimismo, el 95% de los flujos vehiculares de noviembre 2023 se concentra en 2 Categorías: Autos y Camionetas con 85% y Camiones de más de 2 ejes con 10%. Sólo el 5% restante se distribuye en las otras 5 categorías de vehículos.

El flujo vehicular de noviembre 2023 disminuyó en 15,63% respecto del mes anterior octubre 2023, y disminuyó en 4,82% respecto del mismo mes del año anterior noviembre 2022. El flujo vehicular acumulado de enero - noviembre 2023 respecto de enero - noviembre 2022 disminuyó en 6,27%.

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
201	9 204.287	207.801	113.866	107.317	92.001	81.696	115.072	99.243	119.216	92.234	110.249	138.306
202	213.796	218.692	94.103	42.890	43.261	40.907	56.625	64.658	78.035	121.841	163.456	135.284
202	177.940	222.351	132.725	71.706	102.943	92.529	170.598	148.054	155.856	165.380	149.309	173.243
202	246.121	207.732	141.590	135.085	118.060	116.772	136.168	123.798	132.048	145.124	119.092	150.296
202	209.244	212.086	131.093	129.476	106.553	106.614	130.595	112.884	131.262	130.544	113.253	

Fuente: Reporte SICE 30.

Ingresos por Plaza de Peaje Camino Nogales - Puchuncavi NOVIEMBRE-2023

11.2 INFORMACION DE INGRESOS




Gráfico 4: Ingresos acumulados al mes informado, año 2023 Fuente: Reporte SICE 31 $\,$

100,00% | Troncal Nogales-...

Gráfico 5: Ingresos por plaza de peaje. Fuente: Reporte SICE 32

Comparativa años 2022 - 2023


El ingreso mensual de noviembre 2023 disminuyó en 24,44% respecto del mes anterior octubre 2023, y disminuyó en 6,27% respecto del mismo mes del año anterior noviembre 2022. El ingreso acumulado de enero - noviembre 2023 respecto de enero - noviembre 2022 aumento en 0,05%.

El ingreso total mensual de noviembre 2023 alcanzó un monto de \$ 324.478.550.-, equivalentes a UF 8.892,45 al 30.11.2023. El 100% de estos ingresos se produjo en la Plaza de peaje Troncal NOGALES, que es la única operable a la fecha.

.1.3 ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2023 - 2022

Distribución de Lesionados Camino Nogales - Puchuncaví NOVIEMBRE-2023

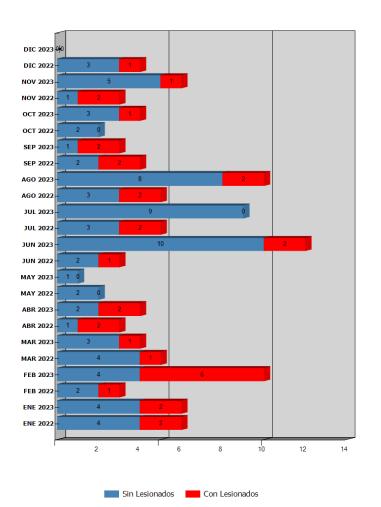




Gráfico 7: Distribución por Tipos de Lesionados Fuente: Reporte SICE 34

Distribución Tipos de Accidentes Camino Nogales - Puchuncaví NOVIEMBRE-2023




Gráfico 8: Distribución por Tipos de Accidentes Fuente: Reporte SICE 34

Gráfico 6: Comparativo Total Accidentes 2022 - 2023, con lesionados.

Fuente: Reporte SICE 33

Durante el mes de noviembre 2023 se informaron 6 accidentes. En estos, se vieron involucrados 10 usuarios, resultando 9 de ellos ilesos y 1 con lesiones leves. La distribución, según tipos de accidentes, es de un 50,00% clasificados como "Choque", un 33,33% clasificados como "Volcadura" y un 16,67% clasificados como "Otros".

Cantidad de accidentes con lesionados y sin lesionados, comparativos por mes de años 2022 y 2023:

	ENE	ENE	FEB	FEB	MAR	MAR	ABR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUN	JUL	JUL	AGO	AGO	SEP	SEP	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Con Lesionados	2	. 2	1	6	1	. 1	. 2	2	0	C) 1	. 2	. 2) 2	. 2	2	2	! C	1	2		1 1	ι 0
Sin Lesionados	4	4	2	4	4	3	1	2	2	1	. 2	10	3	9	3	8	2	1	. 2	3	1		5 3	3 0
Total Acc.	6	6	3	10	5	4	3	4	2	1	1 3	12	. 5	9	5	10	4	3	3 2	4	3		5 4	1

Fuente: Reporte SICE 33.

Accidentes Acumulados Anuales (últimos 6 años)




	Accidentes Victimas					Total	Total Tipos de Accidentes con lesionados								
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros	
2019	34	16	2	1	1	19	23		2	4	4	4		2	
2020	44	12	3	8	4	22	37		2	1	6	1		2	
2021	58	18	0	8	3	12	23		1	2	12	1		2	
2022	45	16	4	3	3	12	22	1			12			3	
2023	69	19	1	4	8	20	33		1	5	11	1		1	

Fuente: Reporte SICE 35.

11.4 RECLAMOS DE USUARIOS

Durante el mes de NOVIEMBRE 2023 se recibieron 27 consultas, 4 sugerencias y 27 requerimientos comerciales por parte de los usuarios.





- 1 Comportamiento incorrecto de empleados: trato recibido por personal de la concessionaria, incluido los cobradores 2 Tanfas o grupos tarifarios: valor de tarifa, clasificación de vehículos y tarifa cobrada, reajuste, hora de cambio de tarifa, etc. 3 Señalización: falta de señales, señales que llevan a confusión 4 Conservación y mantenimiento: hoyos, baches, fisuras, cercos, defensas deterioradas, etc., limpieza de señales, deterioro de señalización horizontal (demarcaciónes) y otros.
 5 Obstáculos en la calzada: elementos en el camino (piedras, materiales, animales, u otros) 6 Asistencias: calidad de la atención, retrasos en la atención, no llegada del servicio solicitado, etc.
 7 Congestión: atochamientos en la ruta o plazas de peaje
 8 Iluminación: falta de iluminación

- Bluminación: falta de iluminación
 Baños por terceros: sucesos que pasan en la vía y que no son de responsabilidad de la concesionaria, por ejemplo: apedreamiento de vehículos, mala conducción de otros choferes, etc.
 Otros: no clasificables dentro de los anteriores.
- 11 Agradecimientos / Consultas
- 12 Sugerencias 13 Requerimiento Comercial


Tabla con reclamos, sugerencias y agradecimientos del año 2023. Fuente: Sociedad Concesionaria Relicitación Camino Nogales – Puchuncaví.



Gráfico 9: Distribución de Reclamos de Usuarios Fuente: Sociedad Concesionaria Relicitación Camino Nogales – Puchuncaví.

11.5 ASISTENCIA A USUARIOS

Mes		Tipo y № de atenciones										
ivies	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias		
Enero	6	28	0	0	0	0	0	13	4	51		
Febrero	15	34	0	0	0	0	0	18	4	71		
Marzo	7	27	0	0	0	0	0	14	0	48		
Abril	4	14	0	0	0	0	0	11	6	35		
Mayo	5	12	0	0	0	0	0	8	4	29		
Junio	10	16	0	0	0	0	0	9	3	38		
Julio	19	20	0	0	0	0	0	5	2	46		
Agosto	8	17	0	0	0	0	0	4	0	29		
Septiembre	7	15	0	0	0	0	0	7	4	33		
Octubre	17	21	0	0	0	0	0	14	1	53		
Noviembre	12	15	0	0	0	0	0	14	3	44		
Diciembre												
Total	110	219	0	0	0	0	0	117	31	477		



1: Reparación del vehículo in situ

2. Remolque del vehículo en panne

3: Panne por falta combustible del vehículo

4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio

5: Primeros auxilios

6: Auxilio en accidentes

7: Traslado de usuario a centro asistencial

8: Instalación de señalización preventiva

9: Otros

Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas 2023 y tipos de atención. Fuente: Sociedad Concesionaria Relicitación Camino Nogales - Puchuncaví S.A.




Gráfico 10: Distribución de Asistencias a Usuarios, Fuente: Sociedad Concesionaria Relicitación Camino Nogales – Puchuncaví.



Durante el mes de noviembre 2023 se prestaron 44 asistencias a los usuarios. La Sociedad Concesionaria prestó la asistencia correspondiente, ya sea ayudándolos en el lugar o trasladándolos a lugar seguro para no entorpecer la circulación ni provocar otra emergencia.
