

INFORME WEB

CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS – ACCESO NORTE A CORONEL

MES DE FEBRERO 2016

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	: Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel.
Concesionaria	: Soc. Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.
Decreto de Adjudicación	: D.S. M.O.P. N° 411 del 27.06.2008.
Publicación Diario Oficial	: 13.09.2008.
Región de Emplazamiento	: VIII Región del Biobío.
Inicio de la Concesión	: 13.09.2008.
Inicio Etapa Construcción	: 13.09.2008.
Plazo Etapa Construcción	: 47 Meses
Plazo de la Concesión	: 480 Meses.
Inspector Fiscal	: Lester Poblete Godoy.
Puesta en Servicio Provisoria:	
Tramo A	: En construcción
Tramo B	: 13.08.13 (Res. DGOP N°3267 del 12.08.2013)
Convenios Complementarios	: D.S. MOP N°274 del 17.09.2013
Presupuesto Oficial	: UF 7.700.000
Inversión Oferta Técnica (ITC):	UF 7.950.000
Asesoría IF	: Zañartu Ingenieros Consultores SPA. (Resolución DGOP N° 406 10.11.2008)

- La Concesión, está comprendida entre el Acceso Norte a Coronel y la localidad de Cerro Alto, con una extensión aproximada de 89 km.
- El trazado de la Ruta Concesionada, se desarrolla a través de las comunas de Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, y Los Álamos.
- El proyecto regulariza el perfil existente, a una doble calzada de dos pistas por sentido, de 3,5 metros de ancho cada una, en toda su extensión.
- Además incluye obras como: Mejoramiento de Estructuras Existentes, Construcción de Puentes, Pasarelas, Pasos Desnivelados, Nuevos Enlaces, Obras de Saneamiento, Señalización y Seguridad Vial, Iluminación, Paraderos Peatonales, Áreas de Servicios y aproximadamente 13 km de Calles de Servicio. Igualmente incorpora los baipás de Lota, Laraquete y Villa Los Ríos.



Enfierradura Losa de Acceso Estribo de Salida Paso Superior Laraquete Sur km: 0,480.




AVANCE DEL CONTRATO: En base a programa de avances presentado por la Sociedad Concesionaria, comparándolo con los avances reales y los hitos del contrato (al día 30 de cada mes):

Tramo A (Dm 14.300 – 61.835) : Avance de 99,23%
Tramo B (Dm 101.390 – 102.054) : Avance del 99,88%

➔

AVANCE GENERAL
(al 29 de Febrero de 2016):
99,50 %

PLANO DE UBICACIÓN

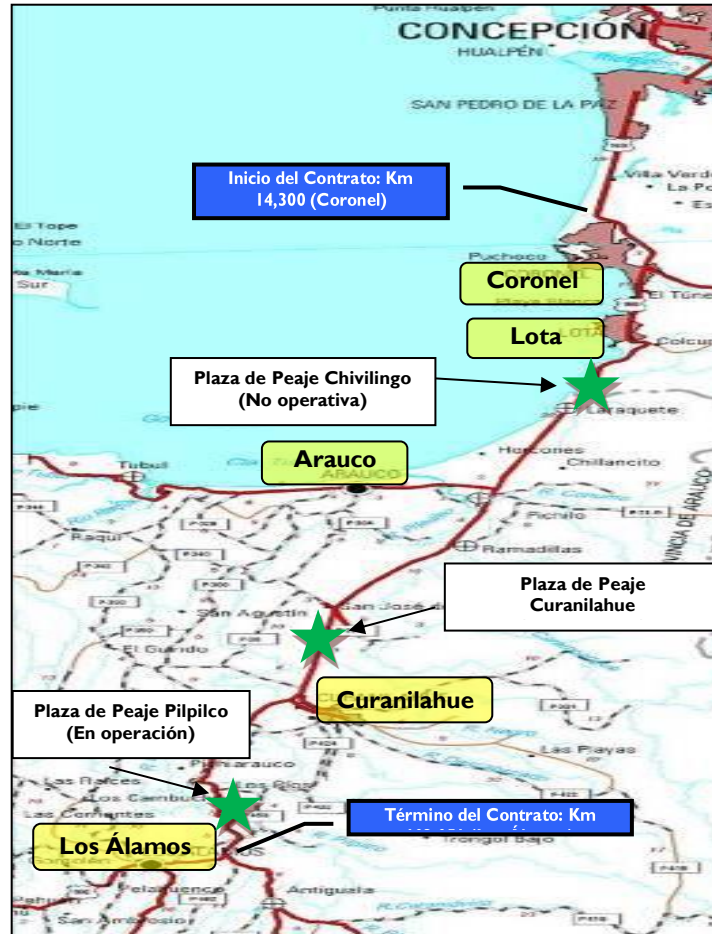

OBRAS EN EJECUCIÓN (Avance al 29.02.16)

Los trabajos realizados en el contrato durante del mes de enero son los siguientes:

- Terminación de terraplén de calzada poniente sector Colcura.
- Terminación de terraplén de acceso poniente a paso superior Laraquete Sur.
- Baño y vestidores en locales de ventas para Palomitas en área de servicio oriente, sector Laraquete sur.
- Acceso a central termoeléctrica Santa María de Colbún en Coronel.
- Reparación de talud de corte en sector Chivilingo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Control de la Base Granular para la Construcción Acceso a Termoeléctrica Santamaría - Colbún Calzada Izquierda Tramo A Sector I en km: 23,640 – 24,060.



Excavación Canalón Calzada Izquierda, Tramo A Sector II km: 52,040 – 53,524.



Escarificado de Terraplén, por Exceso de Humedad Estribo de Salida Paso Superior Colcura, Calzada Derecha Pista N° 1-3 Colcura, Tramo A Sector II en km: 34,860 – 35,000.



**Colocación Concreto Asfaltico Capa Intermedia para la Construcción Acceso a Termoeléctrica Santamaría - Colbún
Calzada Izquierda Tramo A Sector I en km: 23,640 – 24,060.**



**Construcción de Terraplén Estribo de Salida Paso Superior Laraquete Sur, Eje N° 10 Tramo A Sector II Lado Izq/Der
km: 0,510 – 0,560.**



**Limpieza y Lavado de la Capa Intermedia, para Colocación de Concreto Asfaltico de Superficie Construcción Acceso a
Termoeléctrica Santamaría - Colbún Calzada Izquierda Tramo A Sector I en km: 23,640 – 24,060.**



Tala de Árboles para Ejecución de Retaluzado Sector Chivilingo Tramo A Sector II Lado Izquierdo en km: 40,000 – 40,400.



Construcción de Moldajes para Fundación, de Baños en Área de Servicios, Tramo A Sector II Lado Poniente By Pass de Laraquete km: 47,730.



TEMA RELEVANTE DEL MES

Con fecha 23 de febrero del 2016 se hizo entrega de las llaves del baño y vestidores exclusivos para la Agrupación de Manipuladoras de Alimentos Palomitas Blancas, último aspecto comprometido en la habilitación de los puestos de venta construidos en el área de servicio poniente, ubicada junto al enlace Laraquete Sur.

REGISTRO FOTOGRAFICO

