

INFORME WEB **CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS – ACCESO NORTE A CORONEL** **MES DE MARZO 2016**

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato : Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel.
Concesionaria : Soc. Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.
Decreto de Adjudicación : D.S. M.O.P. N° 411 del 27.06.2008.
Publicación Diario Oficial : 13.09.2008.
Región de Emplazamiento : VIII Región del Biobío.
Inicio de la Concesión : 13.09.2008.
Inicio Etapa Construcción : 13.09.2008.
Plazo Etapa Construcción : 47 Meses
Plazo de la Concesión : 480 Meses.
Inspector Fiscal : Lester Poblete Godoy.
Puesta en Servicio Provisoria:
 Tramo A : **En construcción**
 Tramo B : **13.08.13** (Res. DGOP N°3267 del 12.08.2013)
Convenios Complementarios : D.S. MOP N°274 del 17.09.2013
Presupuesto Oficial : UF 7.700.000
Inversión Oferta Técnica (ITC): UF 7.950.000
Asesoría IF : Zañartu Ingenieros Consultores SPA.
 (Resolución DGOP N° 406 10.11.2008)

• La Concesión, está comprendida entre el Acceso Norte a Coronel y la localidad de Cerro Alto, con una extensión aproximada de 89 km.

• El trazado de la Ruta Concesionada, se desarrolla a través de las comunas de Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, y Los Álamos.

• El proyecto regulariza el perfil existente, a una doble calzada de dos pistas por sentido, de 3,5 metros de ancho cada una, en toda su extensión.

• Además incluye obras como: Mejoramiento de Estructuras Existentes, Construcción de Puentes, Pasarelas, Pasos Desnivelados, Nuevos Enlaces, Obras de Saneamiento, Señalización y Seguridad Vial, Iluminación, Paraderos Peatonales, Áreas de Servicios y aproximadamente 13 km de Calles de Servicio. Igualmente incorpora los baipás de Lota, Laraquete y Villa Los Ríos.



Colocación de membrana impermeable en losa de estructura Paso Superior Laraquete Sur.




AVANCE DEL CONTRATO: En base a programa de avances presentado por la Sociedad Concesionaria, comparándolo con los avances reales y los hitos del contrato (al día 30 de cada mes):

Tramo A (Dm 14.300 – 61.835) : Avance de **99,56%**
Tramo B (Dm 101.390 – 102.054) : Avance del **99,88%**



AVANCE GENERAL
 (al 31 de Marzo de 2016):
99,69 %

PLANO DE UBICACIÓN

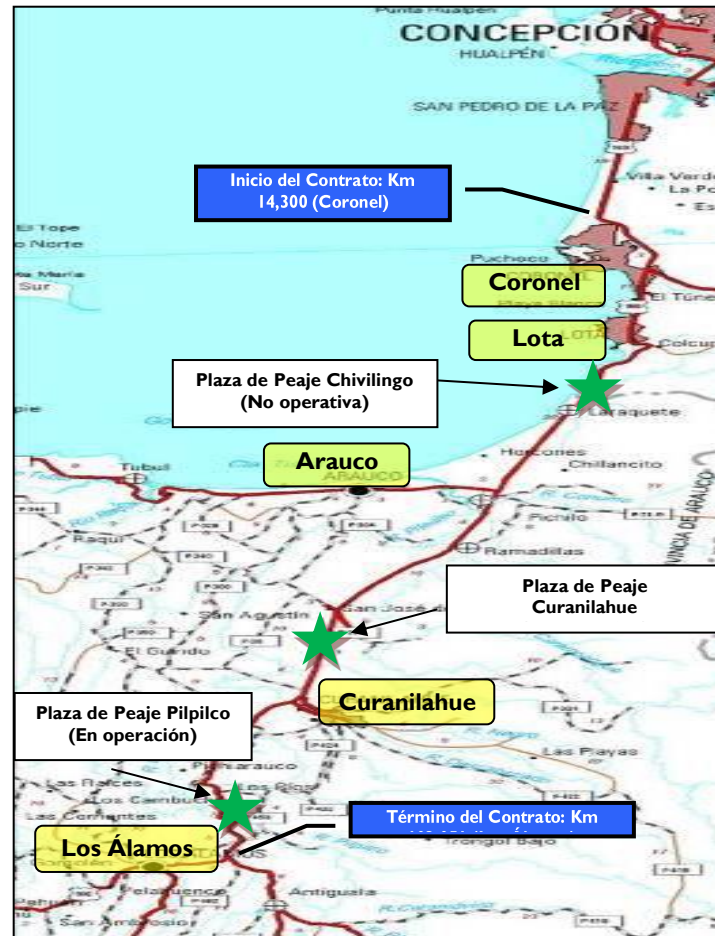

OBRAS EN EJECUCIÓN (Avance al 31.03.16)

Los trabajos realizados en el contrato durante del mes de enero son los siguientes:

- Pavimentación de calzada poniente sector Colcura.
- Pavimentación de acceso poniente a paso superior Laraquete Sur.
- Baño y vestidores en locales de ventas para Palomitas en área de servicio oriente, sector Laraquete sur.
- Reparación de talud de corte en sector Chivilingo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Colocación Concreto Asfáltico de Rodadura, en Área de Servicios Tramo A Sector II Lado Poniente km: 47,730.



Colocación de Capa Intermedia Binder Acceso Estribo de Salida Paso Superior Laraquete Sur Tramo A Sector II Lado Izq/Der km: 0,480 – 0,837.



Hormigonado Mampostería Abanico y Colocación de Malla, Acceso Estribo de Salida Paso Superior Laraquete Sur Tramo A Sector II Lado Izq/Der km: 0,480.



Movimiento de Tierras Retaluzado y Retiro de Tocones Terraza N° 2, Sector Chivilingo Tramo A Sector II Lado Izquierdo en km: 40,000 – 40,400.



Colocación de Estuco, Interior y Exterior de los Baños en Área de Servicios Tramo A Sector II Lado Poniente km: 47,730.



Instalación de Moldajes y Enfierraduras para la Construcción de Barreras Hormigón Tipo F, Eje N° 10 Laraquete Sur Tramo A Sector II Lado Izquierdo km: 0,480 – 0,515.



TEMA RELEVANTE DEL MES

Con fecha 24 de marzo de 2016, esta Inspección Fiscal en conjunto con la Sociedad Concesionaria realiza reunión informativa con dirigentes de la Junta de Vecinos Villa Bicentenario, en donde se dio a conocer el inicio de los trabajos de la pasarela Bicentenario.

REGISTRO FOTOGRAFICO

