


1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	:	Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría
Concesionaria	:	Consortio de Salud Santiago Oriente S.A. Sociedad Concesionaria
Decreto de Adjudicación	:	Decreto Supremo N° 141 de 11.02.2014
Publicación Diario Oficial	:	28.05.2014
Región de Emplazamiento	:	Región Metropolitana
Inicio de Concesión	:	28.05.2014
Inicio Etapa Construcción	:	29.07.2016 (Entrega Terrenos Primera Etapa)
Inicio de Obras	:	09.01.2017 (Obras Preliminares) 21.06.2019 (Obra Gruesa) Son 1.625 días contados de acuerdo a lo señalado en DS MOP N°120.
Plazo Etapa Construcción	:	Plazo de la Concesión : 30 semestres desde APS
Plazo de la Concesión	:	
Puesta en Servicio Provisoria (PSP)	:	10 de mayo 2023
Puesta en Servicio Definitiva (PSD)	:	09 de mayo 2024
Modificaciones de Contrato	:	1. DS MOP N°242 de fecha 20 de agosto de 2015. 2. DS N°243 de fecha 20 de agosto de 2015. 3. DS N°322 de fecha 03 de diciembre de 2015. 4. DS N°120 de fecha 01 de agosto de 2018
Presupuesto Oficial (UF)	:	UF 6.714.000
Inspector Fiscal	:	Roberto Ibaceta Prieto
Asesoría IF	:	CyD Ingeniería Ltda.

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO

El terreno donde se construirá este proyecto corresponde al polígono delimitado por:

- Avenida Salvador por el poniente,
- Calle Dr. Hernán Alessandri por el norte,
- Calle José Manuel Infante por el oriente, y
- Capilla del Hospital Salvador.

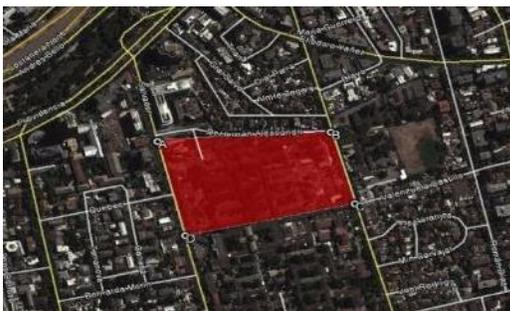

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de concesión “Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría” comprende la construcción de un establecimiento de alta complejidad en el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 641 camas, y se ubicará en la comuna de Providencia, RM. El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios Complementarios que se indican a continuación:

Servicios Básicos:

- Aseo y Limpieza General
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
- Control Sanitario de Vectores
- Gestión de Ropería
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico

Servicios Especiales Obligatorios:

- Cafetería
- Seguridad y Vigilancia
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica

Servicios Complementarios

- Alimentación a Público en General
- Estacionamiento para Público en General
- Instalación y Explotación de Máquinas Dispensadoras
- Área Multiservicio.

Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone del modelo BIM que permite la integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades. Es destacable la inclusión, de aisladores sísmicos como integrante de la estructura, que disipen la propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, reduciendo así los riesgos de daños.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

El Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría está orientado, principalmente a la población adulta del área oriente de Santiago, con una población beneficiaria aproximada de 500 mil habitantes provenientes de 8 comunas, a la que se agrega la demanda de referencia nacional para ambas entidades. Además, este centro cuenta con Unidades de Referencia Nacional, como la Unidad de Oftalmología (con la única Unidad de Trauma Ocular del País), la Unidad de Trasplantes y el único Hospital Geriátrico de Chile. El centro hospitalario tendrá una dotación de 641 camas, repartidas de la siguiente manera:

Hospital del Salvador:

- 360 Camas Indiferenciadas adultos
- 44 Camas Pensionado
- 71 Camas U.P.C. Adultos
- 30 Camas de Pacientes Agudos
- 24 Camas Psiquiatría

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes:

- 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía)
- 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatría)
- 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas de toma de muestras)
- 62 Box profesionales
- 18 Box dentales

Instituto Nacional de Geriatría:

- 100 Camas Indiferenciadas adultos
- 12 Camas Pensionado

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes:

- 12 Box médicos
- 16 Box de procedimientos
- 28 Box profesionales

1.3 NUEVAS INVERSIONES

No hubo nuevas inversiones ejecutadas durante el periodo.

2. PRINCIPALES OBRAS

2.1. PRINCIPALES OBRAS DEL MES EN PROGRESO

Para efectos de la siguiente descripción, se debe considerar que el Hospital del Salvador se compone de dos grandes edificaciones: Atención Abierta (denominada como AA) y Hospitalización (denominada como HDS). Mientras que al Instituto Nacional de Geriatría lo abreviaremos como ING.

▪ Nivel -3:

- En AA e ING, salvo las escaleras y rampas que aún están en ejecución, prácticamente han finalizado los trabajos de obra gruesa.
- Se ejecutó hormigonado de rampa de acceso vehicular en el área 4, que comunica nivel -2 con el nivel -3.
- En AA y HDS continúan los trabajos de instalación de soportes para ductos de alcantarillado, extinción de incendio, electricidad y corrientes débiles.

▪ Nivel -2:

- En AA y HDS, salvo las escaleras y rampas que aún están en ejecución, prácticamente han finalizado los trabajos de obra gruesa.
- En HDS se inicia instalación de soportes para ductos de alcantarillado, extensión de incendio, electricidad y corrientes débiles.
- Se iniciaron trabajos de instalación de baldosas y perfiles para tabiques en los tres edificios.

▪ Nivel -1:

- En HDS e ING continuó ejecución de trabajos de instalación de soportes para ductos de alcantarillado, extensión de incendio, electricidad y corrientes débiles.
- En HDS e ING continúan instalación de baldosas y perfiles para tabiques en los 3 edificios.

▪ Nivel 1:

- En AA finalizó la ejecución de pilares y losa del cielo del nivel 4.
- Continuó ejecución de losas en HDS.
- Continuó ejecución de pilares HDS.
- Continuó ejecución de trabajos de instalación de baldosas y perfiles para tabiques en ING

▪ Nivel 2:

- En HDS e ING finalizó la construcción de losa del nivel -1.
- Continuó ejecución de trabajos de instalación de baldosas y perfiles para tabiques en ING.

▪ Nivel 3:

- En HDS se continuó hormigonado de losa del cielo.
- Continuó ejecución de trabajos de instalación de moldajes y armaduras de las vigas postensadas del puente interior HDS.
- Inician trabajos de instalación de baldosas y perfiles para tabiques en ING.

- **Nivel 4:**
 - En AA la losa de cielo continuó en ejecución. En HDS sin avance.
 - Pilares en ING terminada su construcción. En AA e ING sin avance.
 - Continúan los trabajos de instalación de baldosas en ING.
- **Piso Técnico:**
 - Finalizó el hormigonado del muro perimetral en ING.


2.2. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS



Avance del edificio Instituto Nacional de Geriatria. Áreas 9 y 10. Instalación de baldosas



Área 6. Preparación de vigas postensadas del puente en HDS. Nivel 2

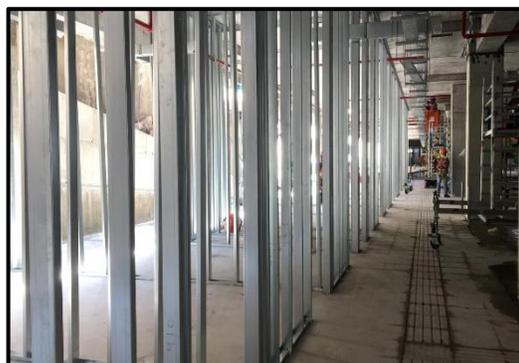

Instalación de perfiles de tabiquería en área 1 de AA. Nivel -1



Área 8 HDS. Hormigón de pilares piso 2

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL MES

- Respecto del riesgo de contagio por COVID - 19, la Sociedad Concesionaria mantiene un protocolo y una serie de medidas de prevención de contagio para todo su personal en oficinas y de obras en terreno (contratista y subcontratistas), el cual se ha reforzado y se mantiene hasta la fecha.
- La comuna de Providencia donde se ubica el Hospital, estuvo hasta el 17 de marzo en Fase 3 Preparación, para luego a partir del 18 de marzo retrocedió a Fase 2 Transición. Finalmente, a partir del 27 de marzo la comuna retrocedió a Fase 1 Cuarentena. El pasado 29 de abril la comuna retornó a Fase 2, la que se mantuvo durante el mes de Mayo. El proyecto continúa su ejecución con relativa normalidad, cumpliendo con las indicaciones sanitarias que la Autoridad ha decretado.
- El mes de mayo de 2021 finalizó con una dotación de personal de 1.219 trabajadores.
