

CONCESIÓN HOSPITAL DEL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

OCTUBRE 2024

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría
Tipología del Contrato	Infraestructura Hospitalaria
Mandante del Contrato	Ministerio de Salud Subsecretaría de Redes Asistenciales Servicio de Salud Metropolitano Oriente
Emplazamiento del Proyecto	Región Metropolitana Provincia de Santiago. Comuna de Providencia.
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 6.714.000
Adquisición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico – Etapa Construcción	UF 2.104.396
Adquisición de Mobiliario No Clínico – Etapa Construcción	UF 116.485
Número de camas	641 camas
Superficie del Proyecto	172.500 m ²
Área de Concesión	Polígono concesión UTM 45.381 m ²
Nombre del Concesionario	Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. Sociedad Concesionaria
Accionistas del Concesionario	Constructora y Edificadora Gia+A SA de Capital Variable. (55,86%) Salvador Holding Chile SpA (44,14%).
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N°141, de 11 de febrero de 2014, publicado en el Diario Oficial el 28 de mayo de 2014.
Inicio de la Concesión	28 de mayo de 2014
Plazo de la Concesión	30 semestres corridos desde la autorización de pagos de subsidios
Fecha Llamado a licitación	15 de octubre de 2013
Apertura Ofertas Técnicas	20 de enero de 2014
Apertura Ofertas Económicas	29 de enero de 2014
Inicio de Ejecución de las Obras	27 de noviembre de 2018 (DS MOP N°120)
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	30 de junio de 2026
Término de la Concesión	30 semestres corridos desde la autorización de pagos de subsidios
Inspector Fiscal Titular	Miguel Ara Santana designado según Res. Ex. N° 1694, de 03 de junio de 2024
Inspector Fiscal Suplente	Sr. Ignacio Gysling Vidal según Res. Ex. N° 1694, de 03 de junio de 2024
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	CyD Ingeniería Ltda. Adjudica RES. DGC N°0081 del 23.08.2021
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	Declaración de Impacto ambiental calificada favorablemente con la Resolución Exenta N°628/2016.

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO



El terreno está ubicado en la comuna de Providencia en un sector central y consolidado de la ciudad. La zona de implantación del nuevo edificio tiene forma trapezoidal y se sitúa al norte del complejo hospitalario existente. El área concesionada, limita al Norte con la calle Dr. Hernán Alessandri. Al Sur, con el Hospital Salvador actual. Al Oriente con la calle José Manuel Infante y al Occidente con la Avda. Salvador. Comuna de Providencia. Santiago R. M.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de concesión “Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría” comprende la construcción de un establecimiento de alta complejidad en el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 641 camas, y se ubicará en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, de Santiago.

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y Mobiliario Asociado a la Infraestructura, y la explotación de Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios Complementarios.

Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone del modelo BIM (Building Information Modeling) que permite la integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades.

Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, reduciendo así los riesgos de daños.

Las 641 camas que tendrá el centro hospitalario quedarán repartidas de la siguiente manera:

Hospital del Salvador

- 360 Camas Indiferenciadas adultos
- 44 Camas Pensionado
- 71 Camas U.P.C. Adultos
- 30 Camas de Pacientes Agudos

CONCESIÓN HOSPITAL DEL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

OCTUBRE 2024

- 22 Camas Psiquiatría

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes:

- 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía)
- 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatría)
- 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas toma de muestras)
- 62 Box profesionales
- 18 Box dentales

Instituto Nacional de Geriatria

- 100 Camas Indiferenciadas adultos
- 12 Camas Pensionado
- Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes:
- 12 Box médicos
- 16 Box de procedimientos (incluye 1 sala de toma de muestras)
- 28 Box profesionales

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

- Obras Exteriores (Paisajismo, Pavimentos, Soterramiento, Etc.
- Avance y Término de Instalaciones: Clima, sanitarias, eléctricas, PCI, tabiquerías y terminaciones (principalmente).
- Instalación de:
 - o Equipos Industriales (Estanques de petróleo, chillers, etc)
 - o Ductos, cableados, cañerías
 - o Pavimentos, pinturas y cielos.
- Inicio instalación de:
 - o Equipos médicos
 - o Mobiliario Clínico
 - o Mobiliario de línea (no clínico)

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto mejorará la red asistencial, mediante la modernización de la infraestructura, equipamiento y sistemas de información para dar una mejor respuesta a las demandas de la comunidad, disminuyendo la brecha de camas y de recursos.

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

El proyecto está orientado especialmente a la atención de población adulta del área oriente de Santiago, estimándose que beneficiará a más de 500 mil habitantes provenientes de ocho comunas (Providencia, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, Macul, Vitacura y Lo Barnechea).

Sin perjuicio de lo anterior, por la complejidad de su cartera de servicios clínicos, es un hospital de referencia nacional para la atención del trauma ocular, trasplantes y geriatría, entre otros.

6. SERVICIOS CONCESIONADOS

Servicios básicos:

- Aseo y Limpieza General
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
- Control Sanitario de Vectores
- Gestión de Ropería
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario asociado a la Infraestructura
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico.

Servicios Especiales Obligatorios:

- Cafetería
- Seguridad y Vigilancia
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.

Servicios Complementarios:

- Alimentación a Público General
- Estacionamiento para Público General
- Instalación y Explotación de Máquinas Dispensadoras
- Área Multiservicio.

7. SUBSIDIOS

7.1 Subsidio Fijo a la Construcción (1.12.2.1 de las BALI)

Pagos por Subsidio Fijo a la Construcción					
Cuotas	Plazo	Fecha estimada de pago	Monto		Estado
			HDS	ING	
1ra y 2da cuota SFC para cada establecimiento se pagarán a más tardar 30 días contados el IF apruebe respectiva declaración de avance correspondiente al 80%	30 días	12-06-2024	UF 1.365.833	UF 299.817	Pagado
3ra cuota SFC para cada establecimiento se pagarán a más tardar 30 días contados el IF apruebe respectiva declaración de avance correspondiente al 90%	30 días	dic-24	UF 682.917	UF 149.909	Proceso de Pago
4ta cuota SFC para cada establecimiento se pagarán a más tardar 30 días contados el IF apruebe respectiva declaración de avance correspondiente al 98%	30 días	jun-25	UF 682.917	UF 149.909	Pendiente

CONCESIÓN HOSPITAL DEL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

OCTUBRE 2024

Pagos por Subsidio Fijo a la Construcción					
Cuotas	Plazo	Fecha estimada de pago	Monto		Estado
			HDS	ING	
5ta cuota SFC para cada establecimiento se pagarán a más tardar 30 días contados se obtenga la autorización de pagos de subsidios del establecimiento de salud respectiva.	30 días	sept-25	UF 682.917	UF 149.909	Pendiente
6ta cuota SFC para cada establecimiento se pagará el 31 de marzo o 30 de septiembre inmediatamente siguiente al pago de la quinta cuota del SFC.	30 días	31-03-2026	UF 682.917	UF 149.909	Pendiente
Cada cuota restante del SFC, a partir de la séptima cuota se pagarán semestral y consecutivamente, el 31 de marzo y el 30 de septiembre según corresponda, hasta contemplar el pago de las 14 cuotas semestrales.	-	30/09/2026 hasta 31/03/2030	UF 682.917	UF 149.909	Pendiente

Pagos por Subsidio Fijo a la Operación					
Cuotas	Plazo	Fecha estimada de pago	Monto		Estado
			HDS	ING	
Décima Octava	Semestral	31-03-2034	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Décima Novena	Semestral	30-09-2034	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Vigésima	Semestral	31-03-2035	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Vigésima Primera	Semestral	30-09-2035	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Vigésima Segunda	Semestral	31-03-2036	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Vigésima Tercera	Semestral	30-09-2036	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Vigésima Cuarta	Semestral	31-03-2037	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Vigésima Quinta	Semestral	30-09-2037	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Vigésima Sexta	Semestral	31-03-2038	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Vigésima Séptima	Semestral	30-09-2038	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Vigésima Octava	Semestral	31-03-2039	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Vigésima Novena	Semestral	30-09-2039	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Trigésima	Semestral	31-03-2040	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente

7.2 Subsidio Fijo a la Operación (1.12.2.2 de las BALI)

Pagos por Subsidio Fijo a la Operación					
Cuotas	Plazo	Fecha estimada de pago	Monto		Estado
			HDS	ING	
Primera	60 días	nov-25	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Segunda	Semestral	31-03-2026	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Tercera	Semestral	30-09-2026	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Cuarta	Semestral	31-03-2027	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Quinta	Semestral	30-09-2027	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Sexta	Semestral	31-03-2028	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Séptima	Semestral	30-09-2028	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Octava	Semestral	31-03-2029	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Novena	Semestral	30-09-2029	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Décima	Semestral	31-03-2030	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Décima Primera	Semestral	30-09-2030	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Décima segunda	Semestral	31-03-2031	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Décima Tercera	Semestral	30-09-2031	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Décima Cuarta	Semestral	31-03-2032	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Décima Quinta	Semestral	30-09-2032	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Décima Sexta	Semestral	31-03-2033	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente
Décima Séptima	Semestral	30-09-2033	UF 196.800	UF 43.200	Pendiente

7.3 Subsidio Fijo por concepto de adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico (1.12.2.7 de las BALI)

Subsidio Fijo por concepto de Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico					
Cuotas	Plazo	Fecha estimada de pago	Monto		Estado
			ING	HDS	
1ra cuota Subsidio fijo concepto adquisición y reposición MNC, se pagará a más tardar 30 días contados desde IF certifique para el establecimiento de salud, el pago de al menos 20% del respectivo VMA y el ingreso y acopio temporal al interior de los edificios MNC.	30 días	sept-24	UF 874	UF 3.979	Pendiente
2da cuota Subsidio fijo concepto adquisición y reposición MNC, se pagará a más tardar 30 días contados desde IF certifique para el establecimiento de salud, el pago de al menos 40% del respectivo VMA y el ingreso y acopio temporal al interior de los edificios MNC.	30 días	nov-24	UF 874	UF 3.979	Pendiente
3ra cuota Subsidio fijo concepto adquisición y reposición MNC, se pagará el 30 de septiembre del año que se obtenga la autorización de pagos de subsidios de salud respectivo, siempre y cuando se obtenga durante los primeros 5 meses del año. En caso contrario, la 3ra cuota será pagada el 31 de marzo del año siguiente obtenga la autorización de pagos de subsidios de salud respectivo.	Anual	31-03-2026	UF 874	UF 3.979	Pendiente
4ta cuota Subsidio fijo concepto adquisición y reposición MNC, se pagará el 31 de marzo inmediatamente al siguiente al pago de la tercera cuota.	Anual	31-03-2027	UF 874	UF 3.979	Pendiente
Cada una de las cuotas restantes del subsidio fijo de adquisición y reposición de MNC, a partir de la quinta cuota se pagarán anual y consecutivamente, el 31 de marzo de cada año hasta completar el pago de las 15 cuotas anuales.	Anual	31/03/2028 hasta 31/03/2038	UF 874	UF 3.979	Pendiente

7.4 Subsidio Fijo por concepto de adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico (1.12.2.8 de las BALI)

Subsidio Fijo por concepto de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico					
Cuotas	Plazo	Fecha estimada de pago	Monto		Estado
			HDS	ING	
1ra cuota Subsidio fijo concepto adquisición y reposición EMMC, se pagará a más tardar 30 días contados desde IF certifique para el establecimiento de salud, el pago de al menos 20% del respectivo VMA y el ingreso y acopio temporal al interior de los edificios EMMC.	30 días	sept-24	UF 126.021	UF 27.663	Pendiente
2da cuota Subsidio fijo concepto adquisición y reposición EMMC, se pagará a más tardar 30 días contados desde IF certifique para el establecimiento de salud, el pago de al menos 40% del respectivo VMA y el ingreso y acopio temporal al interior de los edificios EMMC.	30 días	nov-24	UF 126.021	UF 27.663	Pendiente
3ra cuota Subsidio fijo concepto adquisición y reposición EMMC, se pagará el 30 de septiembre del año que se obtenga la autorización de pagos de subsidios de salud respectivo, siempre y cuando se obtenga durante los primeros 5 meses del año. En caso contrario, la 3ra cuota será pagada el 31 de marzo del año siguiente obtenga la autorización de pagos de subsidios de salud respectivo	Anual	31-03-2026	UF 126.021	UF 27.663	Pendiente
4ta cuota Subsidio fijo concepto adquisición y reposición EMMC, se pagará el 31 de marzo inmediatamente al siguiente al pago de la tercera cuota	Anual	31-03-2027	UF 126.021	UF 27.663	Pendiente
Cada una de las cuotas restantes del subsidio fijo de adquisición y reposición de EMMC, a partir de la quinta cuota se pagarán anual y consecutivamente, el 31 de marzo de cada año hasta completar el pago de las 15 cuotas anuales	Anual	31/03/2028 hasta 31/03/2038	UF 126.021	UF 27.663	Pendiente

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

El Proyecto de Ingeniería Definitiva se encuentra 100% aprobado.

9. INICIO DE OBRA

Establecimientos	Fecha de Inicio de Obras Preliminares	Fecha de Inicio de Obras
HDS e ING	30/12/2016	27/11/2018

10.- AVANCE DE LA OBRA

Los trabajos en el HDS/ING, se agrupan en cuatro grandes especialidades, Obra Gruesa y Estructura, Arquitectura (Terminaciones), Instalaciones, Equipamiento Médico. Los principales trabajos ejecutados durante el mes de octubre de 2024 se resumen a continuación, de acuerdo a las mediciones realizadas por el CPT.

Obra Gruesa y Estructura: El avance de la obra gruesa y estructura a la fecha alcanza un 99,99%, con principales avances del mes en estructura metálica en shafts ING, estructura metálica de pilares, vigas y crucetas en PT en HDS, estructura metálica pasarelas P3-PT en HDS.

Arquitectura: Con respecto a las actividades de Arquitectura se han ejecutado un 90,27% de las obras, entre las cuales se puede mencionar el avance de la Instalación de soportería metálica en patios de PT en AA, instalación ventanas en P1 en HDS. Trabajos de instalación de tabiques, ya sea primera o segunda cara, preparación de muro y pintura en P2 y PT en ING y PT en AA, instalación de perfilería metálica, instalación de puertas RF y aluminio vidrio en P1, P2, P3, P4 y PT en HDS.

Instalaciones: En cuanto a las Instalaciones, a la fecha se lleva ejecutado un 84,38% del avance, de las cuales destacan avances en Gases Clínicos (instalación de tuberías, instalación de CPI), cableado estructurado y corrientes débiles (instalación de cable y equipos), Control centralizado y automatización, instalación de canalizaciones bus de datos. Se mantienen con avance las instalaciones sanitarias, aguas lluvias, eléctricas (instalación de luminarias/enchufes, instalación de canalizaciones, instalación de tableros de distribución), instalaciones térmicas (instalación de ductos y aislación de tuberías, instalación y conexión de equipos).

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico: Para el presente período no se tiene de avance en la Instalación del EMMC. Cabe destacar la importancia de la instalación del EMMC ya que el hospital no puede empezar a operar sin ellos.

El avance físico mensual acumulado de la obra es el siguiente:

Mes-Año	Avance Físico de la Obra (%)		
	Anterior	Mensual	Acumulado
octubre-2024	87,39%	2,96%	90,35%

11. HITOS DE AVANCE

Descripción	Avance	Fecha límite	Carta SC Presentación	Fecha	Cumplimiento Fecha	ORD IF Aprobación	Fecha
1ª Declaración de avance	15%	16-12-2020	CS-IF-2560	06-10-2020	30-09-2020	ORD.IF-HSG-2634	27-10-2020
2ª Declaración de avance	35%	27-07-2021	CS-IF-3019	05-07-2021	02-07-2021	ORD.IF-HSG-3151	23-07-2021
3ª Declaración de avance	60%	29-10-2022	CS-IF-4089	18-08-2022	30-07-2022	ORD.IF-HSG-4055	02-09-2022
Adicional según DS N° 26	80%	15-04-2024	CS-IF-5895	10-04-2024	15-04-2024	ORD.IF-HSG-406	26-04-2024
4ª Declaración de avance	85%	30-06-2024	CS-IF-6425	30-08-2024	30-08-2024	ORD IF-HSG N° 881	27-09-2024
Adicional según DS N° 26	90%	15-10-2024	CS-IF-6612	15-10-2024	15/10/2025	ORD IF-HSG N° 1015	08-11-2024
Adicional según DS N° 26	98%	15-04-2025					
P.S.P		30-06-2025					
P.S.D		30-06-2026					



Fachadas HDS e ING




Respaldo eléctrico Pabellones



Pasillo HDS



Subterráneo 2

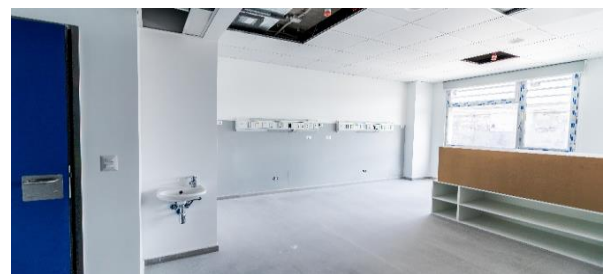

Hospitalización

12.- PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS OBRAS

Establecimiento	Fecha máx de solicitud PSP		Autorización PSP		Tipo de PSP: Parciales, fases, total
	BALI	Estimada	Fecha	Resolución y fecha	
HDS e ING	1.10.3	30-06-2025		Pendiente	Total

13.- MANO DE OBRA

Total	Mayo-2023
Mano de Obra Ingeniería	0
Mano de Obra Construcción	2220
Empleos Indirectos	39

14.- HECHOS RELEVANTES

La Sociedad Concesionaria con carta CS-IF 6612, de 15 de octubre de 2024, declaró que el avance de las obras al 15 de octubre de 2025 alcanzó a un 90,67%, la Inspección Fiscal mediante ORD IF-HSG N° 1015, de 08 de noviembre de 2024, informa a la SC que el promedio matemático registrado por cada una de las integrantes de la Comisión de Peritos, alcanzó un 90,14%, por lo que dio por cumplida la obligación contractual de la SC, que debía alcanzar el 90% de avance físico de las obras al 15 de octubre de 2024. Cumplido este HITO, el MINSAL debe pagar a más tardar dentro de 30 días desde la fecha de aprobación por parte del IF, la tercera cuota por concepto de pago por Subsidio Fijo a la Construcción.

15.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA
