


1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Mejoramiento Ruta Nahuelbuta
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial Interurbana
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del Proyecto	Regiones del Bio-Bío y de La Araucanía
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 6.125.000 + IVA
Superficie del Proyecto	55,020 Km
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A.
Accionistas del Concesionario	Besalco S.A.(50%) Concesiones Constructora S.A.(50%) Empresa Belfi
Decreto de Adjudicación	D.S MOP N°144 de 11.12.2017, publicado en el Diario Oficial el 10.04.2018
Plazo de la Concesión	Plazo máximo igual a 420 meses (35 años)
Inicio de Ejecución de las Obras	20 de Octubre 2020
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	Julio de 2023
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	Enero de 2024
Término de la Concesión	Abril de 2053
Inspector Fiscal Titular	Alex Leighton González
Inspector Fiscal Suplente	Renato Gaete Menendez
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Zañartu Ingenieros Consultores SpA.
Modificaciones al Contrato	No hay
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	Mediante Resolución Exenta N°0292/2019 de 08.03.19, la Dirección Ejecutiva del SEA resuelve que el proyecto no se encuentra obligado a someterse al SEIA en forma previa a su ejecución
Subsidios	Subsidio a la Construcción: 10 Cuotas UF 465.500
Página Web de la Concesión	No tiene

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto contempla el Mejoramiento y Ampliación a doble calzada de la Ruta 180, en el tramo comprendido entre Avda. Camilo Henríquez en la Ciudad de Los Ángeles Dm. 0.000 y Avda. O'Higgins en la Localidad de Huequén, Comuna de Angol, Dm. 55.020, en una longitud aproximada de 55 Kilómetros.

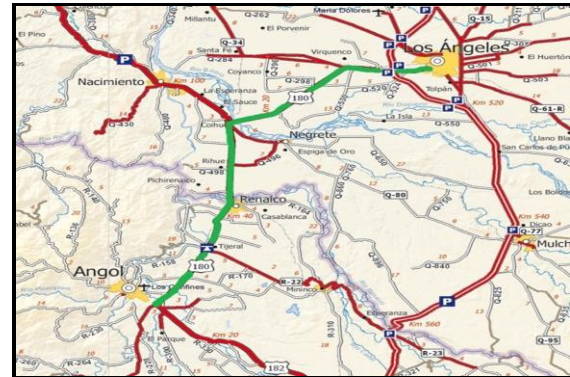

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Fundamentalmente se consideran obras de mejoramiento y la reposición de la calzada existente de la Ruta 180, además de la construcción de una nueva segunda calzada, construcción de variantes, ampliación de bermas, construcción de calles de servicio, construcción de ciclovías, incorporación de enlaces y estructuras a desnivel en sus principales intersecciones viales, construcción de cruces ferroviarios, construcción de puentes, mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje, incorporación de elementos de Seguridad Vial, paraderos de buses y teléfonos S.O.S. al costado de la Ruta, iluminación y Paisajismo en sectores puntuales, un área de servicios generales y atención de emergencias, entre otras.

En el siguiente cuadro se puede dar cuenta de un resumen en la cual se muestra los sectores involucrados.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Se pueden destacar principalmente las siguientes obras a construir:

OBRAS	CANTIDAD
Intersecciones a	17
Pasos de Ferrocarril	2
Puentes Nuevos	15
Intersecciones a Nivel	30
Pasarelas	23
Plazas de Peaje	3
Calles de Servicio	32 Km.
Ciclovías	21 Km.
Paraderos de Buses	78
Miradores	2
Área de Control	1

A lo anterior se agrega la construcción de una nueva calzada, lo cual ampliaría la actual Ruta a doble calzada con dos pistas por sentido. Además, se consideran obras de rehabilitación de la infraestructura preexistente.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Al ampliar la Ruta 180 a doble calzada y construir pasos a desnivel esto ayuda ostensiblemente a mejorar los tiempos de viaje, la seguridad tanto de los usuarios peatonales así como los vehiculares, mejora el diseño de la Ruta, implementa zonas de seguridad, otorga conectividad segura con cruces de caminos a través de enlaces desnivelados.

- Mejora Diseño Geométrico de la Ruta 180
- Aumenta la velocidad de operación
- Disminuye los tiempos de viaje
- Aumenta Seguridad Peatonal y Vehicular.
- Se rehabilitan Estructuras de larga data.
- Se rehabilita y mejora la Infraestructura existente.
- Permite la circulación de camiones con el máximo Tonelaje permitido por ley.
- Se genera un Área de Servicios, Atención de Emergencias, y un Control de Carreteras.
- Se construyen Calles de Servicio y Ciclovía para la conexión vehicular segura a la Ruta 180 y circulación exclusiva de bicicletas, respectivamente.
- Se mejora el Saneamiento y drenaje de la Plataforma.
- Se mejora las intersecciones y los accesos privados a nivel y de accesos que acceden a la Ruta 180.

- Construcción de una nueva plaza de pesaje fija y modificaciones a la plaza de pesaje fija preexistente.
- Construcción de Paraderos de Buses.

6.- SERVICIOS

Se consideran Áreas de Servicios Generales y Atención de Emergencias. Esta zona poseerá una superficie útil mínima de 10.000 m² con zonas pavimentadas y capacidad para 15 automóviles y 5 buses.

Servicio de Asistencia en Ruta: Vehículo de patrullaje permanente en la Ruta, encargado de vigilar y prestar atención de emergencia primaria en el área de Concesión.

Servicio de Ambulancia: Ambulancia equipada con medios e instrumental especializados, destinada al transporte de accidentados en estado crítico de alto riesgo, que requieran asistencia médica durante el traslado al Hospital.

Servicio de Red de Teléfonos S.O.S.: Red de Teléfonos S.O.S en funcionamiento permanente.

Servicio de Conservación: Destinado a la mantención y conservación de las obras para asegurar su funcionamiento de acuerdo a las características para las cuales fueron diseñadas.

Servicio de Vigilancia y Seguridad del Área de Servicios Generales: Durante toda la etapa de explotación debe contar con el personal entrenado y capacitado para prestar este Servicio.

Servicio de Atención a Usuarios: Plataforma de Atención a Clientes que cuente a lo menos con un canal presencial, un canal telefónico y un portal Web.

Servicio de Gestión y Cobro: Información a los usuarios de manera oportuna y eficiente relativo al cobro de la

Sector	Subsector	Descripción	Dmi al Dmf	Long. (Km.)
A	1	Los Ángeles – Ruta 5	0 al 3.500	3,50
	2	Ruta 5 – Puente Coihue	3.500 al 23.560	20,06
	3	Variante Coihue	23.560 al 26.540	2,98
B	4	Variante Coihue – Variante Renaico	26.540 al 35.290	8,75
	5	Variante Renaico – Huequén	35.290 al 55.020	19,73

tarifa.

7.- HECHOS RELEVANTES

No hubo hechos relevantes que mencionar durante el mes de Diciembre 2020

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

El día 31.12.2020, se envía al Concesionario, las Observaciones que arrojó la revisión del Proyecto Hidráulico del Puente Pichirenaico, calzada derecha y calzada izquierda, para su resolución.

Con fecha 17.12.2020, se remitió al Jefe Departamento Seguridad Vial del MOP, los Proyectos de Señalización, Demarcación y Seguridad Vial, asociado al Sector B, para su pronunciamiento.

También, con fecha 17.12.2020 se remite al Sub-Director de Mantenimiento de la Dirección de Vialidad, los Proyectos Consolidados de las Plazas de Pesaje de Rarínco y Tijeral, para su conocimiento y pronunciamiento.


El día 11.12.2020, se envía al Jefe Departamento de Cobros de la División de Operaciones de la DGC, los Proyectos de Iluminación y Sistema de Cobro de Peajes e ITS, asociado al Sector "A", para su revisión.

Con fecha 03.12.2020, se informa al Concesionario que se ha aprobado el Proyecto Hidráulico del Puente Coyanco, Calzada Izquierda.

9.- AVANCE DE OBRA

A la fecha se continua con la preparación de la enfierradura que forma parte de la Estructura de los Pilotes a instalar en el Puente Coihue, conjuntamente con el hormigonado de Pilotes. Paralelamente, se ejecutan obras relativas a la Conservación y Mantención de la Ruta 180.

El avance Físico Mensual Acumulado en la obra es:

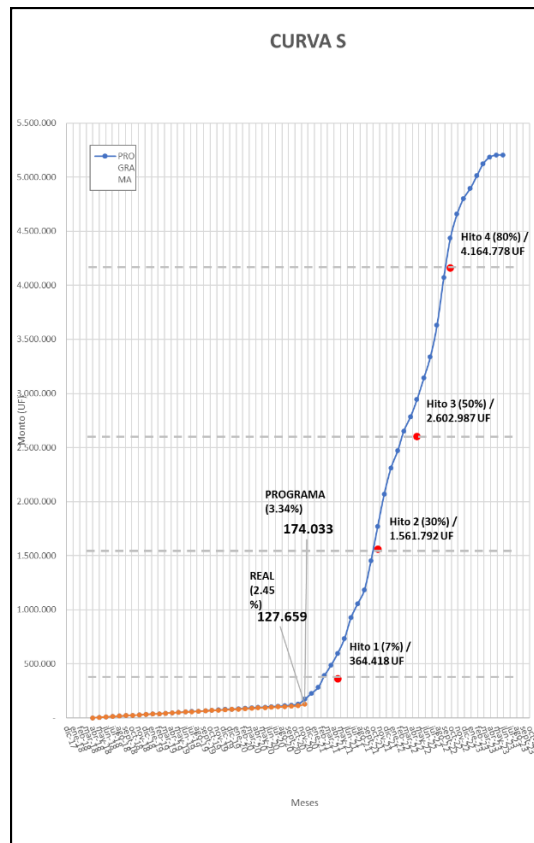

Fecha	Programado	Real	Acumulado
abr-18	0,04%	0,04%	0,04%
may-18	0,06%	0,06%	0,10%
jun-18	0,06%	0,06%	0,16%
jul-18	0,06%	0,06%	0,23%
ago-18	0,06%	0,06%	0,29%
sept-18	0,06%	0,06%	0,35%
oct-18	0,06%	0,06%	0,42%
nov-18	0,06%	0,06%	0,48%
dic-18	0,06%	0,06%	0,54%
ene-19	0,06%	0,06%	0,60%
feb-19	0,06%	0,06%	0,66%
mar-19	0,06%	0,06%	0,72%
abr-19	0,06%	0,06%	0,78%
may-19	0,06%	0,06%	0,85%
jun-19	0,06%	0,05%	0,90%
jul-19	0,06%	0,06%	0,96%
ago-19	0,06%	0,06%	1,02%
sept-19	0,06%	0,05%	1,07%
oct-19	0,06%	0,06%	1,13%
nov-19	0,06%	0,05%	1,18%
dic-19	0,06%	0,06%	1,24%
ene-20	0,06%	0,06%	1,30%
feb-20	0,06%	0,05%	1,35%
mar-20	0,06%	0,06%	1,41%
abr-20	0,06%	0,05%	1,46%
may-20	0,06%	0,06%	1,52%
jun-20	0,06%	0,05%	1,57%
jul-20	0,06%	0,06%	1,63%
ago-20	0,06%	0,05%	1,68%
sept-20	0,06%	0,05%	1,73%
oct-20	0,09%	0,08%	1,81%
nov-20	0,17%	0,05%	1,86%
dic-20	0,74%	0,22%	2,08%

10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



Ilustración N°1: Pilotes Pre-excavados in Situ Puente Coihue



Ilustración N°2: Pilotes Pre-excavados in Situ Puente Coihue



Ilustración N°3: Formación y Compactación de Terraplén Ruta 180



Ilustración N°4 Instalación de Tubos OAT Ruta 180



Ilustración N°5: Formación y Compactación de Terraplén
Ruta 180



Ilustración N°6: Armadura para Pilotes Puente Coihue
