

# MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA


ABRIL 2023

## 1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Mejoramiento Ruta Nahuelbuta
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial Interurbana
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del Proyecto	Regiones del Bio-Bío y de La Araucanía
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 6.125.000 + IVA
Longitud del Proyecto	55,020 km
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Ruta Nahuelbuta S.A.
Accionistas del Concesionario	Besalco Concesiones S.A. (50%) Empresa Constructora Belfi S.A. (50%)
Decreto de Adjudicación	D.S MOP N°144 de 11.12.2017, publicado en el Diario Oficial el 10.04.2018
Plazo de la Concesión	Plazo máximo igual a 420 meses (35 años)
Inicio de Ejecución de las Obras	20 de octubre 2020
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	10 de Junio de 2024
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	10 de Diciembre de 2024
Término de la Concesión	Abril de 2053
Inspector Fiscal Titular	Renato Gaete Menéndez
Inspector Fiscal Suplente	Alex Leighton González
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Zañartu Ingenieros Consultores SpA.
Subsidios	Subsidio a la Construcción: 10 Cuotas UF 465.500
Página Web de la Concesión	www.rutanahuelbuta.cl

## 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto contempla el Mejoramiento y Ampliación a doble calzada de la Ruta 180, en el tramo comprendido entre Avda. Camilo Henríquez en la Ciudad de Los Ángeles Dm. 0.000 y Avda. O'Higgins en la Localidad de Huequén, Comuna de Angol, Dm. 55.020.

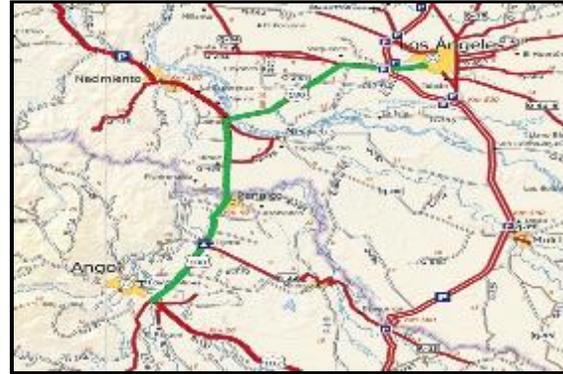

## 3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Considera obras de mejoramiento y reposición de la calzada existente, la construcción de una nueva calzada, la construcción de variantes, ampliación de bermas, construcción de calles de servicio, construcción de ciclovías, incorporación de enlaces y estructuras a desnivel en sus principales intersecciones viales, construcción de cruces ferroviarios, construcción de puentes, mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje, incorporación de elementos de Seguridad Vial, paraderos de buses y teléfonos S.O.S., iluminación y Paisajismo en sectores puntuales, un área de servicios generales y atención de emergencias, entre otras.

En el siguiente cuadro muestra la sectorización del contrato según Bases de Licitación.

Sector	Subsector	Descripción	Dmi al Dmf	Long. (Km.)
A	1	Los Ángeles – Ruta 5	0 al 3.500	3,50
	2	Ruta 5 – Puente Coihue	3.500 al 23.560	20,06
	3	Variante Coihue	23.560 al 26.540	2,98
B	4	Variante Coihue – Variante Renaico	26.540 al 35.290	8,75
	5	Variante Renaico – Huequén	35.290 al 55.020	19,73

#### **4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO**

Se pueden destacar las siguientes obras, derivadas de la ampliación a doble calzada de la Ruta 180

OBRAS	CANTIDAD
Intersecciones a Desnivel	24
Puentes Nuevos	15
Pasarelas	23
Plazas de Peaje	3
Calles de Servicio	32 Km.
Ciclo vías	21 Km.
Paraderos de Buses	78
Miradores	2
Área de Control	1
Área de Servicios Generales	1

#### **5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO**

Al ampliar la Ruta 180 a doble calzada y construir pasos a desnivel, ayuda a mejorar los tiempos de viaje, mejora la seguridad vial, tanto de los peatones como de los vehículos, implementa zonas de seguridad, otorga conectividad segura con cruces de caminos a través de enlaces desnivelados.

- Mejora Diseño Geométrico de la Ruta 180
- Aumenta la velocidad de operación
- Disminuye los tiempos de viaje
- Aumenta Seguridad Peatonal y Vehicular.
- Se genera un Área de Servicios Generales y, Atención de Emergencias, y un Área de Control de Carreteras.
- Se construyen Calles de Servicio y Ciclo vías para mejorar la conectividad local y circulación de bicicletas.
- Se mejora el Saneamiento y drenaje de la Plataforma.
- Construcción de una nueva plaza de pesaje fija y modificaciones a la plaza de pesaje fija preexistente.
- Construcción de Paraderos de Buses.

#### **6.- SERVICIOS**

Se consideran Áreas de Servicios Generales y Atención de Emergencias. Esta zona poseerá una superficie útil mínima de 10.000 m<sup>2</sup> con zonas pavimentadas y capacidad para 15 automóviles y 5 buses.

Servicio de Asistencia en Ruta: Vehículo de patrullaje permanente en la Ruta, encargado de vigilar y prestar atención de emergencia primaria en el área de Concesión.

Servicio de Ambulancia: Ambulancia equipada con medios e instrumental especializados, destinada al transporte de accidentados en estado crítico de alto riesgo, que requieran asistencia médica durante el traslado al Hospital.

Servicio de Red de Teléfonos S.O.S.: Red de Teléfonos S.O.S en funcionamiento permanente.

Servicio de Conservación: Destinado a la mantención y conservación de las obras para asegurar su funcionamiento de acuerdo a las características para las cuales fueron diseñadas.

Servicio de Vigilancia y Seguridad del Área de Servicios Generales: Durante toda la etapa de explotación debe contar con el personal entrenado y capacitado para prestar este Servicio.

Servicio de Atención a Usuarios: Plataforma de Atención a Clientes que cuente a lo menos con un canal presencial, un canal telefónico y un portal Web.

Servicio de Gestión y Cobro: Información a los usuarios de manera oportuna y eficiente relativo al cobro de la tarifa.

#### **7.- HECHOS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO**

Con fecha 27 de Abril 2023, realiza una visita al Contrato de Concesión, el Sr. SEREMI MOP de la Región de La Araucanía, Sr. Patricio Poza Barrera, en conjunto con la Sra. Delegada Presidencial Provincial de Malleco, Sra. Andrea Parra Sauterel, para interiorizarse de los avances del mismo.

#### **8.- AVANCE DE OBRA**

Se continuo con el avance de diversas estructuras, tanto en las Superestructura, así como también en la Infraestructura de ellas.

En la construcción de los Pasos Inferiores La Suerte y Tijeral, el trabajo se desarrolló principalmente en la confección de armadura de las vigas travesaños y la confección de armadura de la losa del tablero, respectivamente.

## MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA

ABRIL 2023

En el Paso Inferior acceso norte a Renaico, las obras dieron cuenta del montaje de las vigas primordialmente.


Las Obras asociadas al Paso Superior Viaducto Coihue Norte y Viaducto Coihue Sur, se laboró en la confección de armaduras de la viga travesaño y el montaje de las vigas mismas.

Para el Puente Malleco, las faenas se centraron en las labores de hormigonado de las vigas travesaños y de la losa.

Las Obras asociadas a la construcción del Puente Huequén, que da la continuidad a la calle de servicio, se abocaron en la confección de la armadura de la losa del tablero.


En lo que dice relación con la construcción de Pasarelas, se trabajó en la Pasarela Santa Cecilia emplazada en el Dm. 51.555 del contrato, y cuya faena principal durante el mes de Abril, dice relación con la confección de armadura y colocación de los moldajes en sus columnas.

Avance Físico de la Obra (Sector "A")		
Mes-Año	Mensual	Acumulado
nov-19	0,06%	1,37%
dic-19	0,07%	1,44%
ene-20	0,06%	1,50%
feb-20	0,06%	1,56%
mar-20	0,07%	1,63%
abr-20	0,06%	1,69%
may-20	0,07%	1,76%
jun-20	0,06%	1,82%
jul-20	0,07%	1,89%
ago-20	0,06%	1,95%
sept-20	0,06%	2,01%
oct-20	0,06%	2,07%
nov-20	0,04%	2,11%
dic-20	0,31%	2,42%
ene-21	0,70%	3,12%
feb-21	1,23%	4,35%
mar-21	0,45%	4,80%
abr-21	0,27%	5,07%
may-21	2,32%	7,39%
jun-21	1,63%	9,02%
jul-21	1,59%	10,61%
ago-21	0,49%	11,10%
sep-21	0,30%	11,40%
oct-21	0,16%	11,56%
nov-21	0,46%	12,02%
dic-21	0,70%	12,72%
ene-22	0,67%	13,39%
feb-22	0,46%	13,85%
mar-22	0,29%	14,14%
abr-22	1,54%	15,68%
may-22	1,81%	17,49%
Jun-22	2,21%	19,70%
Jul-22	3,00%	22,70%
ago-22	2,84%	25,54%
sep-22	1,59%	27,13%
oct-22	2,42%	29,55%
nov-22	1,86%	31,41%
dic-22	1,87%	33,28%
ene-23	2,11%	35,39%
feb-23	1,59%	36,98%
mar-23	1,34%	38,32%
abr-23	1,53%	39,85%

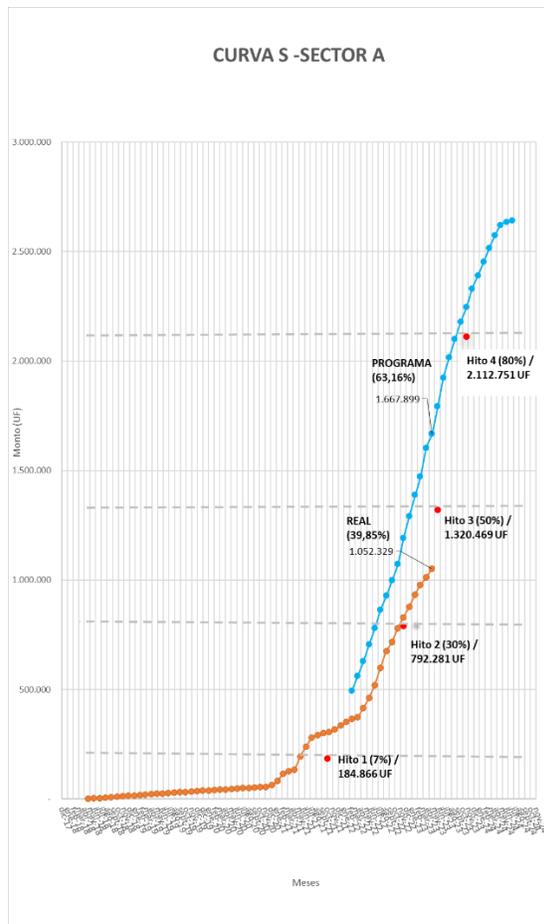

## MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA

ABRIL 2023

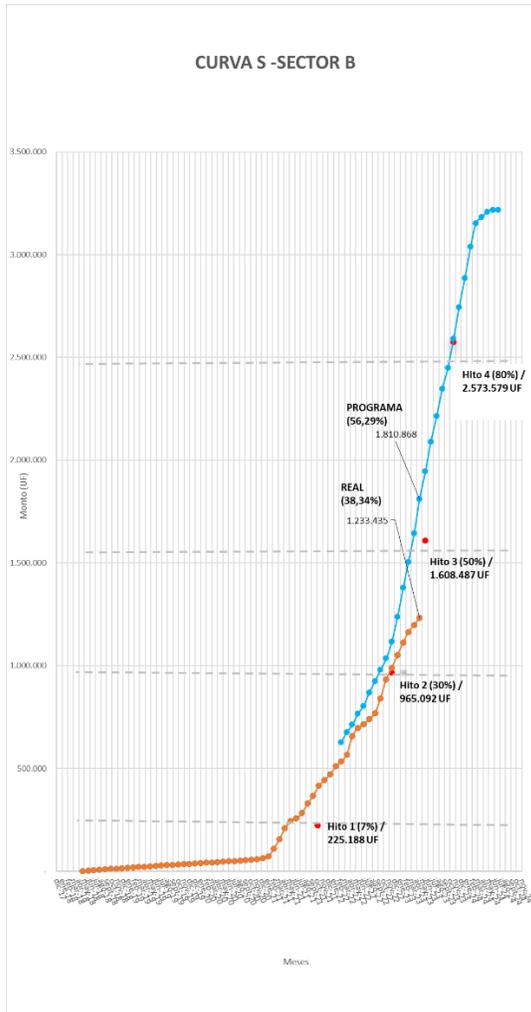


Avance Físico de la Obra (Sector "B")		
Mes-Año	Mensual	Acumulado
nov-19	0,06%	1,13%
dic-19	0,05%	1,18%
ene-20	0,05%	1,23%
feb-20	0,05%	1,28%
mar-20	0,06%	1,34%
abr-20	0,05%	1,39%
may-20	0,05%	1,44%
jun-20	0,06%	1,50%
jul-20	0,05%	1,55%
ago-20	0,05%	1,60%
sept-20	0,05%	1,65%
oct-20	0,10%	1,75%
nov-20	0,06%	1,81%
dic-20	0,17%	1,98%
ene-21	0,26%	2,24%
feb-21	1,16%	3,40%
mar-21	1,41%	4,81%
abr-21	1,70%	6,51%
may-21	1,05%	7,56%
jun-21	0,44%	8,00%
jul-21	0,78%	8,78%
ago-21	1,47%	10,25%
sep-21	1,13%	11,38%
oct-21	1,55%	12,93%
nov-21	0,88%	13,81%
dic-21	0,87%	14,68%
ene-22	1,17%	15,85%
feb-22	0,78%	16,63%
mar-22	1,02%	17,65%
abr-22	2,75%	20,40%
may-22	1,27%	21,67%
Jun-22	0,57%	22,24%
Jul-22	0,75%	22,99%
ago-22	0,92%	23,91%
sep-22	2,21%	26,12%
oct-22	2,89%	29,01%
nov-22	1,74%	30,75%
dic-22	1,94%	32,69%
ene-23	1,86%	34,55%
feb-23	1,62%	36,17%
mar-23	1,08%	37,25%
abr-23	1,09%	38,34%

# MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA

ABRIL 2023

Avance Físico Total de la Obra (Sector A + Sector B)		
Mes-Año	Mensual	Acumulado
nov-19	0,06%	1,24%
dic-19	0,06%	1,30%
ene-20	0,05%	1,35%
feb-20	0,06%	1,41%
mar-20	0,06%	1,47%
abr-20	0,06%	1,53%
may-20	0,06%	1,59%
jun-20	0,05%	1,64%
jul-20	0,06%	1,70%
ago-20	0,06%	1,76%
sept-20	0,05%	1,81%
oct-20	0,08%	1,89%
nov-20	0,06%	1,95%
dic-20	0,23%	2,18%
ene-21	0,46%	2,64%
feb-21	1,19%	3,82%
mar-21	0,98%	4,80%
abr-21	1,05%	5,85%
may-21	1,63%	7,48%
jun-21	0,97%	8,45%
jul-21	1,15%	9,60%
ago-21	1,03%	10,63%
sep-21	0,76%	11,39%
oct-21	0,92%	12,31%
nov-21	0,69%	13,00%
dic-21	0,80%	13,80%
ene-22	0,94%	14,74%
feb-22	0,64%	15,38%
mar-22	0,69%	16,07%
abr-22	2,21%	18,28%
may-22	1,51%	19,79%
Jun-22	1,31%	21,10%
Jul-22	1,76%	22,86%
ago-22	1,78%	24,64%
sep-22	1,93%	26,57%
oct-22	2,68%	29,25%
nov-22	1,79%	31,04%
dic-22	1,91%	32,95%
ene-23	1,97%	34,92%
feb-23	1,61%	36,53%
mar-23	1,20%	37,73%
abr-23	1,29%	39,02%

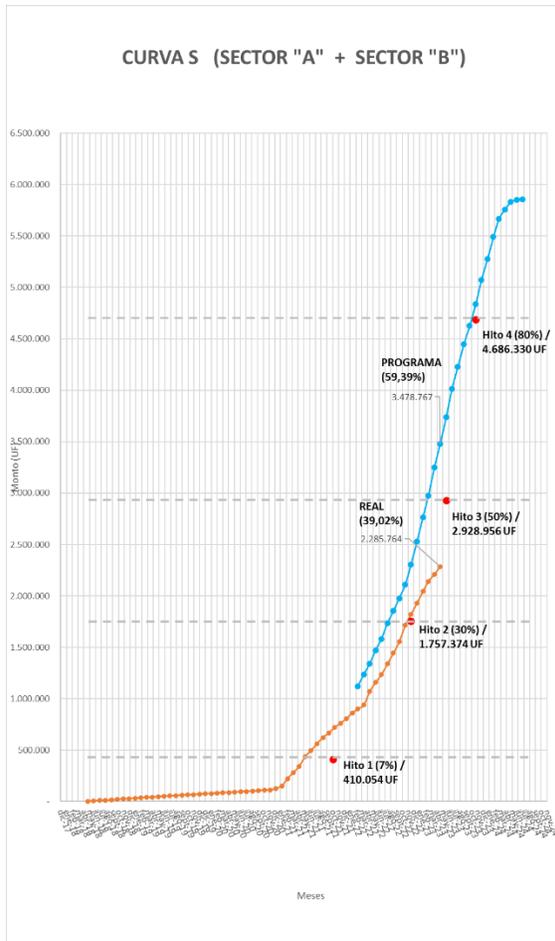

**9.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA**



**Ilustración N°1: Fundación Cepa Paso Inferior Las Violetas**



**Ilustración N°2: Armadura Elevación EE Puente Tijeral**



**Ilustración N°3: Losa Acceso Puente Huequén Calzada Derecha**



**Ilustración N°4 Puente Coihue con Carpeta Asfáltica**



**Ilustración N°5: Variante Coihue Ejes 1 y 2**



**Ilustración N°6 Montaje Vigas Paso Inferior La Paz**
