

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Hospital de Coquimbo
Tipología del Contrato	Infraestructura Hospitalaria
Mandante del Contrato	Ministerio de Salud Subsecretaría Redes Asistenciales Servicio Salud de Coquimbo
Emplazamiento del Proyecto	Región de Coquimbo. Provincia del Elqui. Comuna de La Serena.
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 6.528.211
Adquisición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico – Etapa Construcción	UF 1.422.463
Adquisición de Mobiliario No Clínico – Etapa Construcción	UF 42.513
Número de camas	605 camas.
Superficie del Proyecto	131.395 m ²
Área de Concesión	60.312,23 m ²
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Hospital de Coquimbo S.A
Accionistas del Concesionario	China Railway Construction Corporation (International) Limited (75%) China Railway Construction Group Limited (25%)
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N° 98 de 02 mayo de 2022 publicado en el Diario Oficial el 09 de septiembre de 2022
Inicio de la Concesión	09 de septiembre de 2022
Plazo de la Concesión	Plazo fijo igual a 180 meses
Fecha Llamado a licitación	22 de mayo de 2021
Apertura Ofertas Técnicas	10 de enero de 2022
Apertura Ofertas Económicas	31 de enero de 2022
Inicio de Ejecución de las Obras	08-07-2024
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	07-02-2029
Término de la Concesión	Marzo 2043
Inspector Fiscal Titular	Juan Carlos García Arango Resolución exenta N°3827 de fecha 18-11-2024
Inspector Fiscal Suplente	Nelson Acosta Fernández Resolución exenta N°3827 de fecha 18-11-2024
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda. Resolución de Adjudicación; N°88 y Fecha 30-11-2023
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	Según RES.EXT.N°20230410125 del 02.02.2023, proyecto no obligado a someterse al SEIA

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO



La construcción “Hospital de Coquimbo”, se ubicará en Avenida La Cantería 2370, en la comuna de Coquimbo, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo. El Proyecto se emplaza en una superficie total de 60.312 m² (área de la concesión) y una superficie a construir de 131.395 m².

El predio tiene el Rol SII N° 907-00870, Correspondiente al resto del Lote B, resultante de la subdivisión del fundo El Recreo, este se implementará bajo las zonificaciones establecidas en la actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Coquimbo, dichos terrenos fueron traspasados a la Concesionaria el día 09/11/2022.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Corresponde a la construcción y operación de un recinto médico de alta complejidad en la ciudad de Coquimbo con capacidad para 605 camas de hospitalización y 22 pabellones. El desarrollo y potencialización de todas sus áreas definen al establecimiento como un hospital con perfil asistencial de alta complejidad, reafirmando su rol como centro de derivación y máximo referente en las áreas de neurocirugía, Traumatología de alta complejidad, Dermatología, Cuidados críticos pediátricos, Procuramiento de órganos y tejidos. A nivel regional mantiene la mayor complejidad en Psiquiatría adulto, Dermatología, Anatomía Patológica, Neurofisiología y estudios del sueño.

Considera también la mantención de la infraestructura a desarrollar y la adquisición, mantención y reposición de equipamiento médico y mobiliario clínico, y mobiliario no clínico.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

El proyecto a nivel general considera 7 pisos de altura, con un piso de estacionamiento subterráneos, con aisladores sísmicos, más un piso mecánico superior, alcanzando una altura aproximada de 35 m. En el área posterior del terreno, se contemplaron volúmenes aislados de uno y tres pisos, para ubicar la sala cuna, salud mental y recintos técnicos. Se consideran alrededor de 750 estacionamientos de vehículos y 1.130 para bicicletas.

Las principales obras que desarrolla el proyecto son las que se indican a continuación:

- Construcción de los edificios y áreas descritas en el art. 1.2.3. y 1.3.4, ambos de las Bases de Licitación.
- Demoliciones de todas las estructuras que existiesen y retiro de escombros, según corresponda.

- Las obras de pavimentación y urbanización que correspondan de conformidad al Proyecto Definitivo, establecido en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación; aquellas que sean requeridas por la Municipalidad de acuerdo con la normativa vigente y en particular por la aplicación de lo dispuesto en el capítulo III del Título V de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y en el D.S. N° 30 de 2019 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que aprueba Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local Derivados de Proyectos de Crecimiento Urbano.

- Las obras asociadas al cierre en todo el perímetro del área de concesión, señalado en el artículo 2.2 de las Bases de Licitación.

- Soterramiento de líneas de electricidad de media tensión, baja tensión y alumbrado público; redes de empresas de telecomunicaciones; y cualquier otro sistema o servicio aéreo que se encuentre actualmente en las postaciones frente al área de concesión.

Implementación del equipamiento médico y mobiliario clínico y no clínico dispuesto en el Anexo I de las Bases de Licitación de conformidad al año de incorporación, según el documento "Gradualidad de implementación Camas de Hospitalización y Pabellones Quirúrgicos" dispuesto en el anexo complementario del artículo 1.3.4 de las Bases de Licitación.

- Otras obras que resulten o se identifiquen en el artículo 2.4.1 de las Bases de Licitación.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El nuevo Hospital de Coquimbo contempla una inversión de 255 millones de dólares (UF 6.528.211) y considera un plazo de 15 años de operación. El proyecto contempla una capacidad de ocupación de aproximadamente 8.500 personas. Abarcando una población beneficiaria a nivel comunal, Bi provincial (Elqui-Choapa), Regional (Región de Coquimbo) y Supra regional (Región de Atacama) y funcionará coordinadamente con el Hospital de La Serena.

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

767.268 personas pertenecientes a Fonasa de una población del área de influencia de más de 983.000 habitantes.

6. SERVICIOS CONCESIONADOS

Servicios básicos:

- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura.
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico.
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico.

Servicios Especiales Obligatorios:

- Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

Servicios Complementarios:

- Instalación y explotación de máquinas dispensadoras.

7. SUBSIDIOS

N° de Cuota	Valor Cuota [UF]	Total [UF]	Tipo
1	421.168	8.423.360	Subsidio Fijo a la Construcción (Art. 1.12.2.1)
2	421.168		
3	421.168		
4	421.168		

5	421.168	4.071.000	Subsidio Fijo a la Operación (Art. 1.12.2.2)
6	421.168		
7	421.168		
8	421.168		
9	421.168		
10	421.168		
11	421.168		
12	421.168		
13	421.168		
14	421.168		
15	421.168		
16	421.168		
17	421.168		
18	421.168		
19	421.168		
20	421.168		
1	135.700		
2	135.700		
3	135.700		
4	135.700		
5	135.700		
6	135.700		
7	135.700		
8	135.700		
9	135.700		
10	135.700		
11	135.700		
12	135.700		
13	135.700		
14	135.700		
15	135.700		
16	135.700		
17	135.700		
18	135.700		
19	135.700		
20	135.700		
21	135.700		
22	135.700		
23	135.700		
24	135.700		
25	135.700		
26	135.700		
27	135.700		
28	135.700		
29	135.700		
30	135.700		

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

Avance de Ejecución del PID (%):	79%
Avance de Aprobación del PID (%):	17%

9. INICIO DE OBRA

Establecimientos	Fecha de Inicio de Obras Preliminares (Estimado o Autorizado según corresponda)	Fecha de Inicio de Obras (Estimado o Autorizado según corresponda)
Hospital de Coquimbo	16-11-2023 (autorizado)	08-07- 2024 (autorizado)

10.- AVANCE DE LA OBRA

El avance físico mensual acumulado de la obra registrado a partir del inicio de obras de construcción (informado por la Sociedad Concesionaria) es el siguiente:

Mes-Año	Avance Físico de la Obra (%)		
	Anterior	Mensual	Acumulado
Feb -25	13,08%	1,18%	15,39%

11.- MANO DE OBRA

Total	Mes febrero
Mano de Obra Ingeniería	93
Mano de Obra Construcción	194
Empleos Indirectos	55

12.- HECHOS RELEVANTES

En el periodo se continúa con avance de la obra gruesa, según los registros del concesionario la obra cuenta con un avance de 15,39%.


13.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



Inicio de Instalación de aisladores sísmicos



Rellenos de mejoramiento bajo radier

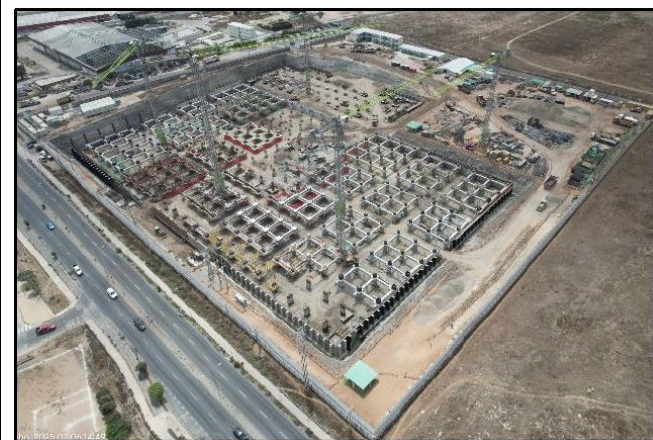

Instalación de Aisladores sísmicos
