

I. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN


Nombre del Contrato	interconexión Vial Santiago – Valparaíso - Viña del Mar
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial Urbana e Interurbana
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas.
Emplazamiento del Proyecto	Regiones de Valparaíso y Metropolitana / Comunas Lo Prado, Maipú, Pudahuel, Curacaví, Casablanca, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 35.970.000.
Longitud del Proyecto	140,92 km
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Ruta 68 a la Costa.
Accionistas del Concesionario	Sacyr Concesiones Chile S.P.A.: 99% Sacyr Chile S.A: 1%
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N°06 de 17 enero de 2025, publicado en el Diario Oficial el 09 de mayo de 2025.
Inicio de la Concesión	09 de mayo de 2025
PSP de Obras Preexistentes	Resolución ExN°2242 de 30 de junio de 2025
Plazo de la Concesión	Plazo variable (VPI ≥ ITC), o un máximo de 360 meses (30 años)
Fecha Llamado a licitación	31 de diciembre de 2021
Apertura Ofertas Técnicas	15 de octubre de 2024
Apertura Ofertas Económicas	12 de noviembre de 2024
Valor ITC (Ingresos Totales Concesión)	45.790.000 UF
Inicio de Ejecución de las Obras	No hay obras en ejecución.
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	-
Término de la Concesión	Mayo de 2055
Inspector Fiscal Titular	Claudio Luna González
Inspector Fiscal Suplente	Ricardo Oyarzo Carcamo
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Consorcio Stradale - RFA. Resolución de Adjudicación: N°58 de 02/09/2025

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto se emplaza en las regiones Metropolitana de Santiago y Valparaíso. Abarca las comunas de Estación Central, Lo Prado y Pudahuel, en la provincia de Santiago; Curacaví, en la provincia de Melipilla; Quilpué y Villa Alemana, en la provincia de Marga Marga y Casablanca; Viña del Mar y Valparaíso, en la provincia de Valparaíso.

El proyecto comprende aproximadamente 140,92 km de longitud e incluye la Ruta 68, las rutas secundarias Ruta 60-CH Vía Las Palmas, Ruta 60 CH Troncal Sur hasta 10 metros antes de la rotonda con calle Limache, y una parte del proyecto “Nudo Pajaritos” en el subsector H del sector 4; con longitudes de 109,2 km, 9,95 km, 20,85 km y 1,22 km respectivamente.

2.1.- IMAGEN O MAPA DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO

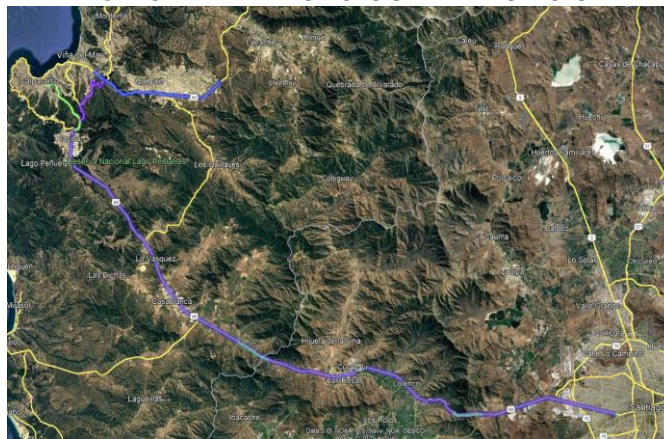

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en términos generales en el mejoramiento, construcción, mantención y explotación tanto de las obras preexistentes, como de las nuevas obras del tramo que comprende la obra pública fiscal denominada “Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar”; lo anterior, con el objeto de mejorar el estándar técnico y los niveles de servicio de la ruta y, por consiguiente, garantizar condiciones de seguridad y confort a sus usuarios.

La sectorización del proyecto según las Bases de Licitación es:

Sector	Subsectores	Descripción	Dm inicio aprox.	Dm final aprox.	Longitud (km) aprox.
1	A	Desde el Dm 0.400 de Ruta 68 hasta el Enlace Costanera Norte.	0.400 ⁽¹⁾	9.500 ⁽¹⁾	9,1
	B	Desde Enlace Costanera Norte hasta Enlace Pudahuel.	9.500 ⁽¹⁾	11.500 ⁽¹⁾	2,0
	C	Desde el Enlace Pudahuel hasta el actual peaje Lo Prado.	11.500 ⁽¹⁾	17.800 ⁽¹⁾	6,3
2	D	Desde el actual Peaje Lo Prado hasta 800 m después del Enlace Las Cenizas.	17.800 ⁽¹⁾	100.600 ⁽¹⁾	82,8

3	E	Desde 800 m después del Enlace Las Cenizas hasta 500 m antes de la intersección con Av. Argentina (Santos Ossa).	100.600 ⁽¹⁾	109.600 ⁽¹⁾	9,0
	F	Ruta 60-CH Vía Las Palmas, desde Cruce Ruta 68 (Santos Ossa) hasta Cruce Vía Las Palmas, correspondiente al enlace con el Troncal Sur. Incluye Viaducto El Salto.	0.000 ⁽²⁾	9.950 ⁽²⁾	9,95
	G	Ruta 60-CH Troncal Sur, desde el Cruce Peñablanca hasta el Cruce Vía Las Palmas con su proyección por el mismo eje, desde el Cruce Vía Las Palmas hasta 10 m antes de la rotonda con Calle Limache.	86.950 ⁽³⁾	107.500	20,55
4	H	(i) Desde el Dm -0.420 hacia el poniente por el eje Av. Alameda Libertador Bernardo O'Higgins, hasta el Dm 0.400 de Ruta 68 de 0,82 km. Excluye el bandejón central de Av. Alameda Libertador Bernardo O'Higgins. (ii) Ramal a Maipú que va desde Av. Alameda Libertador Bernardo O'Higgins hasta emerger en Av. Gladys Marín Millie, de 0,4 km.	-0.420 ⁽⁴⁾	0.400 ⁽¹⁾	1,22 ⁽⁵⁾
	I	Desde la intersección con la calle Francisco Zelada por el eje de Av. Alameda Libertador Bernardo O'Higgins hasta el Dm -0.420 de Ruta 68.	-1.060 ⁽⁴⁾	-0.420 ⁽⁴⁾	0,64

Notas:

(1): Dm referido al eje actual de Ruta 68.

(2): Dm referido al eje actual de Ruta 60-CH Vía Las Palmas.

(3): Dm situado 310 m al oriente del Cruce Peñablanca. Los Dm ascienden hacia el poniente.

(4): Dm referido a la continuación del eje actual de Ruta 68 por el eje Av. Alameda Libertador Bernardo O'Higgins. Los Dm negativos se cuentan desde el Dm 0.000 de la Ruta 68 hacia el oriente.

(5): Longitud considera los 0,4 km del Ramal a Maipú.

Fuente: Art. 1.3.1.1 BALI

Obras de Tempranas

N°	Obra	Dm (Aproximado)	Subsector ⁽¹⁾
1	Ampliación Provisoria Pasarela Pajaritos	0.460 ⁽²⁾	A
2	Mejoramiento Enlace Noruega	107.935 ⁽²⁾	E
3	Mejoramiento Conexión Ruta 68 con Ruta 60-CH Troncal Sur.	6.500 – 6.900 ⁽³⁾ 7.200 – 7.500 ⁽³⁾ 7.700 – 8.000 ⁽³⁾ 8.200 – 8.700 ⁽³⁾	F
4	Ampliación de Capacidad en Ramal Enlace Rodelillo	2.500 ⁽³⁾	F

Notas:

(1) Subsectores definidos en la Tabla N 1 del artículo 1.3.1.1.

(2) Dm referido al eje actual de Ruta 68.

(3) Dm referido al eje actual de Ruta 60-CH Vía Las Palmas.”.

Fuente: Art. 1.8.9.2 BALI

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

EL proyecto contempla el mejoramiento, construcción, mantención y explotación de obras preexistentes y nuevas obras, con el objetivo de elevar el estándar técnico y los niveles de servicio de la ruta, garantizando condiciones de seguridad y confort para los usuarios.

Entre las principales obras se incluyen:

- Ampliación de calzadas: terceras pistas hasta el enlace Costanera y cuartas pistas hasta el peaje Lo Prado (aproximadamente 17 km)
- Nueva calzada reversible: desde el km 17.000 hasta el km 109.600 con dos pistas paralelas a la ruta actual
- Construcción de túneles: dos nuevos túneles y mejoramiento de los cuatros existentes.
- Infraestructura complementaria: ampliación y uniformidad de las bermas y medianas, actualización de los elementos de seguridad vial conforme a normativa vigente, construcción de calles de servicios, pasarelas peatonales, paraderos, circuitos peatonales, áreas de pesaje, servicios y emergencias.
- Sistema de cobro: implementación de tecnología Multi Lane Free Flow.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Constituye la principal conexión entre la Región Metropolitana y V Región de Valparaíso, favoreciendo fluido y seguro de carga y pasajeros. Su trazado permite un fácil acceso desde Santiago a las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, además de otras ciudades por tener una importante actividad frutícola, industrial minera, y por, sobre todo, un importante flujo turístico durante todo el año, alcanzando un flujo de 3.500.000 vehículos durante la temporada estival.

Paralelamente, mejora la accesibilidad poniente al Gran Santiago, facilitando el transporte de carga reduciendo considerablemente los tiempos de viaje entre las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Su diseño incluye elementos que mejoran notablemente la seguridad, asimismo tiene áreas de control policial con moderna edificación, helipuerto y áreas SS.GG

En su trazado aproximadamente el 70 % de la ruta permite circular a 120km/h, con alto estándar de seguridad, lo que traduce en considerables en ellos tiempos para viajes entre la Región Metropolitana y la V Región.

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

1.180.000 personas pertenecientes entre las comunas y provincias de las Regiones de Valparaíso y Metropolitana se verán beneficiadas por el proyecto.

6. TARIFAS

Según las Bases de Licitación, numeral 1.14, las Tarifas de Plazas de Peajes Troncales y Laterales ruta 68, Troncal Sur a contar del 1° de julio de 2025 se detalla a continuación:

Tipo Vehículo	Trocál Zapata y Lo Prado		Tarifas Laterales Ruta 68	Tarifas Troncal Sur
	Normal	Punta	Normal	Normal
1 Motos y Motonetas	\$800	\$1.200	\$300	\$300
2 Autos y Camionetas	\$2.600	\$3.900	\$1.000	\$1.000
3 Autos y Camionetas con Remolque	\$2.600	\$3.900	\$1.000	\$1.000
4 Buses de 2 ejes	\$4.700	\$7.000	\$1.800	\$1.800
5 Camiones de 2 ejes	\$4.700	\$7.000	\$1.800	\$1.800
6 Buses de más de 2 ejes	\$8.300	\$12.400	\$3.400	\$3.400
7 Camiones de más de 2 ejes	\$8.300	\$12.400	\$3.400	\$3.400

6.1 HORARIOS DE TARIFA PUNTA

Fin de Semana: Desde las 17:00:00 horas del viernes hasta las 00:00:00 del lunes.

Fin de Semana Largo: Desde las 17:00:00 horas del día víspera del Fin de Semana Largo hasta las 00:00:00 del día hábil siguiente al último día feriado legal del Fin de Semana Largo.

6.2 GESTIONES DE TARIFA

Se implementaron acciones preventivas de tráfico para el FSL Día Nacional Iglesias Evangélicas y Protestantes. Día de Todos Los Santos, con tarifas a \$1000 para autos y camioneta, y rebaja de 50% para camiones de 2 o más ejes en días y horarios definidos:

- Domingo 02 de noviembre, desde las 07:00 horas hasta las 12:00 horas, se implementó rebaja tarifaria “peaje a luca” para vehículos menores, sentido poniente.
- Domingo 02 de noviembre, desde las 00:00 horas hasta las 07:00 horas, se implementó rebaja tarifaria 50% mínimo para camiones de 2 o más ejes, sentido poniente.

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

Avance de Ejecución del PID (%):	0,00%
Avance de Aprobación del PID (%):	0,00%

7.1 AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA DE OBRAS TEMPRANAS

Avance de Ejecución del PID (%):	0,00%
Avance de Aprobación del PID (%):	0,00%

El plazo máximo para la entrega de estos Proyectos de Ingeniería de Detalle será de 8 (ocho) meses contados desde la fecha de adjudicación del contrato de concesión.

8.- AVANCE DE LA OBRA

Actualmente no existen obras en ejecución.

Mes-Año	Avance Físico de la Obra (%)		
	Anterior	Mensual	Acumulado
Nov-2025	0,0%	0,0%	0,0%

8.1 AVANCE DE LA OBRA DE OBRAS TEMPRANAS

Actualmente no existen obras en ejecución.

Mes-Año	Avance Físico de la Obra (%)		
	Anterior	Mensual	Acumulado
Nov-2025	0,0%	0,0%	0,0%

9.- MANO DE OBRA

Actualmente no existen obras en ejecución.

Total	F	M	Total Nov.25
Mano de Obra Ingeniería	-	-	-
Mano de Obra Construcción	-	-	-
Mano de Obra Operación	-	-	-
Empleos Indirectos	-	-	-

II. ANTECEDENTES TERRITORIALES DEL CONTRATO DE CONCESION

1.- ASPECTOS AMBIENTALES

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Se encuentra en elaboración, por lo anterior, se procedió a informar a los municipios de Estación Central, Lo Prado y Pudahuel que se tomarían datos de flora y fauna en las inmediaciones de estas comunas y la Ruta 68. Cabe destacar que la toma de datos de estos

componentes ambientales se realizara 2 veces en el año esto es primavera y otoño.

Conflictos asociados a Medio Ambiente: Durante el mes informado no han existido conflictos ambientales.

2.- TEMATICAS TERRITORIALES

En el siguiente cuadro se resumen reuniones de participación Ciudadana durante el mes de noviembre 2025.

Contrato Concesión	Actores	Solicitudes	Resultados
Ruta 68	Alcalde I.M. Curacaví. Inspector fiscal R68 y equipo de asesoría. DGC. Gerente general de SACYR y equipo de SC.	Presentación del proyecto de "Interconexión vial Stgo – Valparaíso – Viña del Mar" -Alcalde solicita revisar ubicación de pódicos. Porque las calles de Curacaví no están preparadas para recibir gran cantidad de vehículos, si las personas intentan evitar los pódicos de la ruta.	Se realizarán nuevas reuniones con los directores de los distintos departamentos municipales y con el SOCOC para la presentación del proyecto y acordar beneficios para la comuna en relación al proyecto. Se mantendrá una comunicación y coordinación eficaz y constante entre la Municipalidad, la Inspección fiscal y la Sociedad concesionaria para lograr la consolidación del proyecto de la mejor manera.

3.- TEMAS RELEVANTES EN DESARROLLO

Actualmente se está recabando la información bibliográfica y a su vez se encuentran en las primeras campañas de toma de datos de la componente ambiental Flora y Fauna

III. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



Trabajos de Reposición de cercos dañados



Trabajos de ejecución excavación calicata



Trabajos de retiro de basura manual



Trabajos de ejecución sondaje muestras de material

V. ETAPA DE EXPLOTACIÓN
1.- INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR

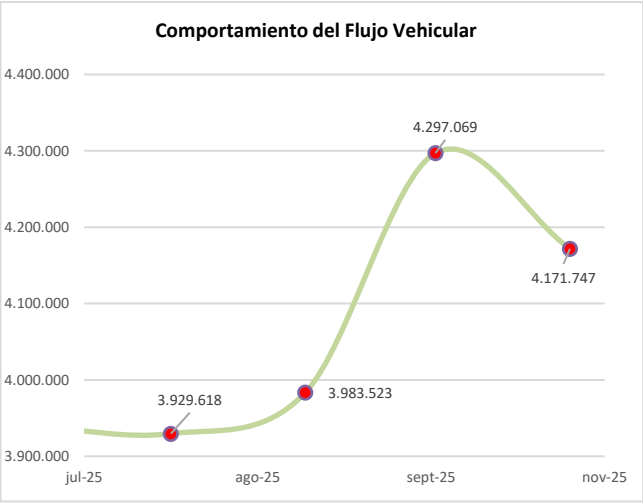


Grafico 1: Flujos Mensuales Comparativos desde inicio de la concesión hasta el periodo informado
Fuente : AIF

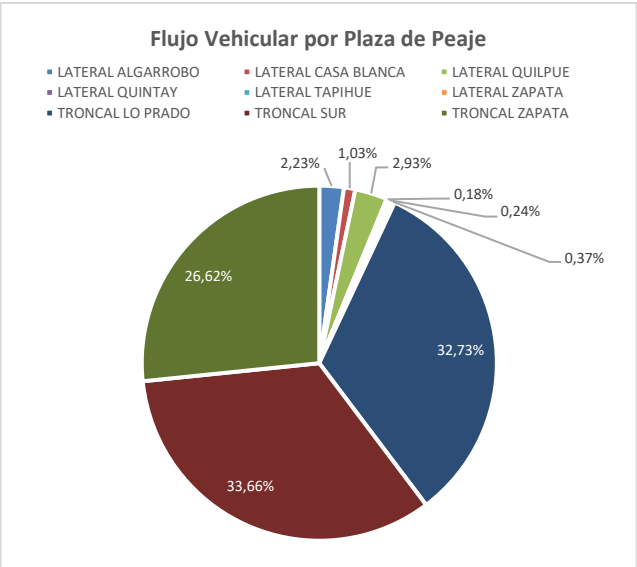


Grafico 2: Flujos Mensuales correspondientes al mes de noviembre 2025. Fuente : AIF

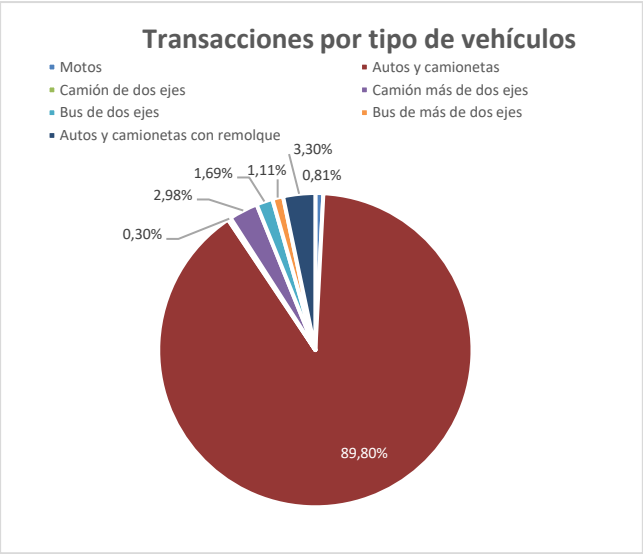


Grafico 3: Flujos Mensuales correspondientes al mes de noviembre 2025. Fuente : AIF

El flujo vehicular neto (desc. Liberado ETC) durante el presente mes fue de 4.156.057 vehículos, distribuidos en 7 categorías existentes. De este flujo, el 89,80% corresponde a vehículos livianos, y el 10,20% restante se distribuye en motos y vehículos pesados.

Años	Meses												TOTAL
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2021	2.771.662	3.203.281	2.769.582	2.020.856	2.751.935	2.913.894	4.115.196	4.139.375	4.158.722	4.440.540	4.247.832	4.637.784	42.170.659
2022	4.755.657	4.264.500	4.207.397	3.999.313	3.972.646	3.691.750	3.953.235	3.901.615	3.872.877	4.123.635	3.905.763	4.293.136	48.941.524
2023	4.521.069	4.207.382	4.054.293	3.775.292	3.759.415	3.432.397	3.938.295	3.790.807	3.792.181	3.988.300	3.869.855	4.159.230	47.288.516
2024	4.544.495	3.278.584	4.101.980	3.764.617	3.642.579	3.419.226	3.878.345	3.838.632	3.824.702	4.001.612	4.135.342	4.312.677	46.744.815
2025	4.589.933	4.298.415	3.831.933	3.751.755	3.764.718	3.703.274	3.939.070	3.929.618	3.983.523	4.297.069	4.171.747	-	44.261.055

2.- INFORMACIÓN DE INGRESOS

Mes	Ingresos 2025
Julio	\$ 9.903.121.700
Agosto	\$ 10.163.945.200
Septiembre	\$ 9.787.568.925
Octubre	\$ 10.550.695.425
Noviembre	\$ 10.454.273.700
TOTAL	\$ 50.859.574.950

El ingreso total mensual alcanzó un monto de \$ 10.454.273.700, equivalentes a UF 263.707 al 30/11/2025. El mayor aporte a dichos ingresos los hizo la Plaza de Peaje Lo Prado con MM\$ 4.763.883.550 (45,57%).

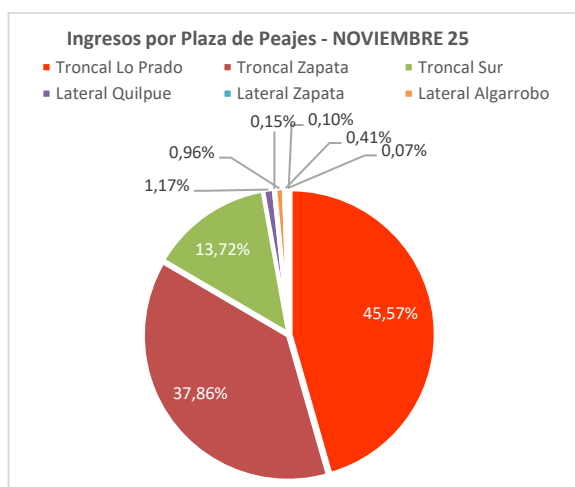


Gráfico 5: Distribución de Ingresos por Plaza de Peaje
Fuente: AIF

3.- ACCIDENTABILIDAD (CC)

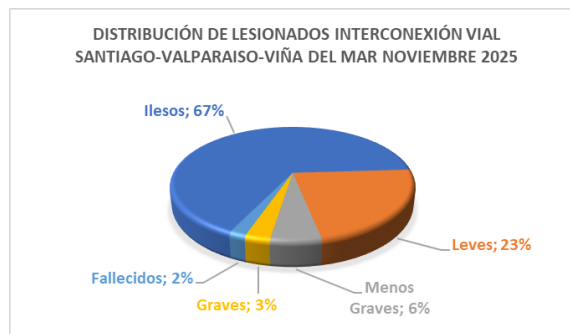


Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados
Fuente: Reporte 34 SICE

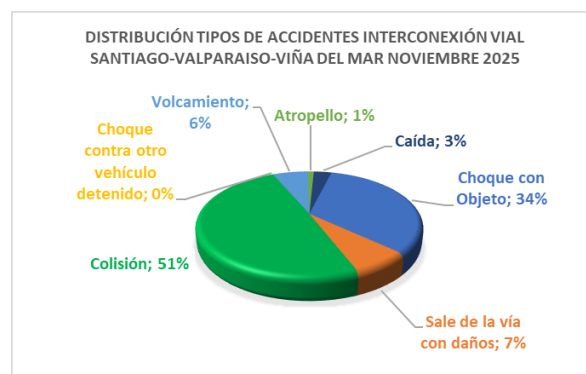


Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes
Fuente: Reporte 34 SICE

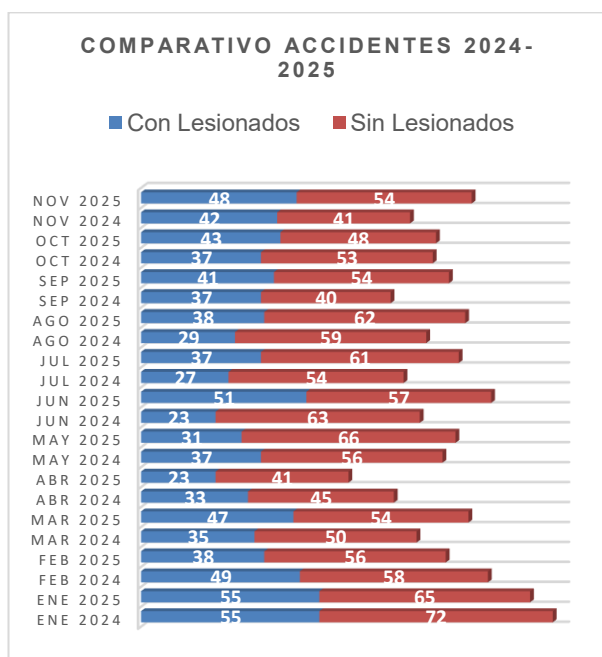


Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2024-2025, accidentes con lesionados y sin lesionados
Fuente: Reporte 33 SICE

4.- RECLAMOS DE USUARIOS

El mes de noviembre de 2025 se registraron un total de 6.136 atenciones a usuarios de los cuales 370 (6.03%) corresponden a reclamos

5.- ASISTENCIA A USUARIO

Mes	Tipo / N° de Asistencias									Total Asistencias
	Reparación Vehículos In Situ	Remolque de vehículo en panne	Panne por falta de combustible	Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio	Primeros Auxilios	Auxilio en accidente	Traslado de usuario a centro asistencial	Instalación de señalización Preventiva	Otros	
Enero	107	373	12	0	6	0	0	1	34	533
Febrero	108	312	12	0	6	0	0	0	7	445
Marzo	108	296	6	0	8	0	0	0	9	427
Abril	92	251	10	0	11	0	0	0	10	374
Mayo	70	235	7	0	12	0	0	0	14	338
Junio	65	207	10	0	2	0	0	0	8	292
Julio	119	258	14	0	5	0	0	0	2	398
Agosto	154	296	22	0	11	0	0	0	7	490
Septiembre	127	318	18	0	4	0	0	0	7	474
Octubre	164	344	13	0	5	0	0	0	8	534
Noviembre	151	374	18	0	8	0	0	0	11	562
TOTAL	1265	3264	142	0	78	0	0	1	117	4867

Tipos de atenciones de los Servicios

1: Reparación del vehículo In situ	151
2: Remolque del vehículo en panne	374
3: Panne por falta de combustible	18
4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio	0
5: Primeros auxilios	8
6: Auxilio en accidente	0
7: Traslado de usuario a centro asistencial	0
8: Instalación de señalización preventiva	0
9: Otros	11

Medios de Solicitud de Servicio

C: Citófono	13
V: Vigilancia	98
T: Teléfono directo/celular	437
O: Otros	14

Durante el período del mes de noviembre del 2025 en el contrato de Concesión Interconexión Vial Santiago-Valparaíso- Viña del Mar, se presentaron un total de 562 solicitudes de atención en la Ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros. El principal requerimiento fue el Remolque de vehículos en panne con 374 atenciones.

6.- HECHOS RELEVANTES

Reuniones de coordinación multistitucional por contingencia
Peregrinación santuario Lo Vázquez (08-12-2025)
