

Concesión Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatria

Julio 2026

I. Antecedentes Generales del contrato de concesión.

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatria
Tipología del Contrato	Infraestructura Hospitalaria
Mandante del Contrato	Ministerio de Salud Subsecretaría de Redes Asistenciales Servicio de Salud Metropolitano Oriente
Emplazamiento del Proyecto	Región Metropolitana Provincia de Santiago. Comuna de Providencia.
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 6.714.000
Adquisición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico – Etapa Construcción	UF 2.104.396
Adquisición de Mobiliario No Clínico – Etapa Construcción	UF 116.485
Número de camas	641 camas
Superficie del Proyecto	172.500 m ²
Superficie del proyecto	45.381 m ² terreno y 172.466 m ² superficie
Nombre del Concesionario	Consortio de Salud Santiago Oriente S.A. Sociedad Concesionaria
Accionistas del Concesionario	Constructora y Edificadora Gia+A SA de Capital Variable. (55,86%) Salvador Holding Chile SpA (44,14%).
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N°141, de 11 de febrero de 2014, publicado en el Diario Oficial el 28 de mayo de 2014.
Fecha inicio de contrato	28 de mayo de 2014
Plazo de la Concesión	30 semestres corridos desde la autorización de pagos de subsidios
Fecha Llamado a licitación	15 de octubre de 2013
Apertura Ofertas Técnicas	20 de enero de 2014
Apertura Ofertas Económicas	29 de enero de 2014
Fecha de entrega de terreno	26 de junio de 2016
Fecha de Inicio de Obras Preliminares	30 de diciembre de 2016
Inicio de Construcción de las Obras	27 de noviembre de 2018 (DS MOP N°120)
Inspector Fiscal Titular	Paz Fuentes Acevedo, designado según Res. Ex. N° 1726, de 12 de junio de 2026
Inspector Fiscal Suplente	Miguel Ara Santana designado según Res. Ex. N° 1726, de 12 de junio de 2026
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	CyD Ingeniería Ltda. Adjudica Res. DGC N°0081 del 23.08.2021

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO



El terreno está ubicado en la comuna de Providencia en un sector central y consolidado de la ciudad de Santiago. La zona de implantación del nuevo edificio tiene forma trapezoidal y se sitúa al norte del complejo hospitalario existente. El área concesionada, limita al Norte con la calle Dr. Hernán Alessandri. Al Sur, con el Hospital Salvador actual. Al Oriente con la calle José Manuel Infante y al Occidente con la Avda. Salvador.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de concesión “Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatria” comprende la construcción de un establecimiento de alta complejidad en el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 641 camas.

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y Mobiliario Asociado a la Infraestructura, y la explotación de Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios Complementarios.

Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone del modelo BIM (Building Information Modeling) que permite la integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades.

Es destacable la inclusión, en el hospital, de aisladores sísmicos como parte integrante de la estructura, que disipa la propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, reduciendo así los riesgos de daños.

Las 641 camas que tendrá el centro hospitalario quedarán repartidas de la siguiente manera:

Hospital del Salvador

- 360 Camas Indiferenciadas adultos
- 44 Camas Pensionado
- 71 Camas U.P.C. Adultos
- 30 Camas de Pacientes Agudos
- 24 Camas Psiquiatria

Concesión Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriátria

Julio 2026

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes:

- 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía)
- 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatría)
- 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas de toma de muestras)
- 62 Box profesionales
- 18 Box dentales

Instituto Nacional de Geriátria

- 100 Camas Indiferenciadas adultos
- 12 Camas Pensionado
- Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes:
- 12 Box médicos
- 16 Box de procedimientos (incluye 1 sala de toma de muestras)
- 28 Box profesionales

4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

- Obras Exteriores (Paisajismo, Pavimentos, Soterramiento, Etc.)
- Avance y Término de Instalaciones: Clima, sanitarias, eléctricas, PCI, tabiquerías y terminaciones (principalmente).
- Instalación de:
 - o Equipos Industriales (Estanques de petróleo, chillers, etc)
 - o Ductos, cableados, cañerías
 - o Pavimentos, pinturas y cielos.
- Inicio instalación de:
 - o Equipos médicos
 - o Mobiliario Clínico
 - o Mobiliario de línea (no clínico)

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto mejorará la red asistencial, mediante la modernización de la infraestructura, equipamiento y sistemas de información para dar una mejor respuesta a las demandas de la comunidad, disminuyendo la brecha de camas y de recursos.

El proyecto está orientado especialmente a la atención de población adulta del área oriente de Santiago, estimándose que beneficiará a más de 500 mil habitantes provenientes de ocho comunas (Providencia, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, Macul, Vitacura y Lo Barnechea).

Sin perjuicio de lo anterior, por la complejidad de su cartera de servicios clínicos, es un hospital de referencia nacional para la atención del trauma ocular, trasplantes y geriatría, entre otros.

6. SERVICIOS CONCESIONADOS

Servicios básicos:

- Aseo y Limpieza General

- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
- Control Sanitario de Vectores
- Gestión de Ropería
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario asociado a la Infraestructura
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico.

Servicios Especiales Obligatorios:

- Cafetería
- Seguridad y Vigilancia
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica.

Servicios Complementarios:

- Alimentación a Público General
- Estacionamiento para Público General
- Instalación y Explotación de Máquinas Dispensadoras
- Área Multiservicio.

7. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

El Proyecto de Ingeniería Definitiva se encuentra 100% aprobado.

8. AVANCE DE LA OBRA

Los trabajos en el HDS/ING, se agrupan en cuatro grandes especialidades, Obra Gruesa y Estructura, Arquitectura (Terminaciones), Instalaciones, Equipamiento Médico. Los principales trabajos ejecutados durante el mes de julio de 2026 se resumen a continuación, de acuerdo a las mediciones realizadas por la AIF.

Obra Gruesa y Estructura: El avance de la obra gruesa y estructura a la fecha alcanza un 100%.

Arquitectura: Los avances de arquitectura en terreno están orientados a la finalización de terminaciones interiores. Los principales avances que se han observado en la especialidad de arquitectura durante el período están referidos a las siguientes partidas del proyecto:

- Avances en cierre de Tabiques con intervenciones por PINS y VMA.
- Avances en instalación estructura de cielo de Angiógrafos.
- Revisión DOM de Núcleos de Escaleras.
- Avance en Esclusas y estructuración de Cielos en Inmunosuprimidos (UIS).
- Instalación de EQM en Imagenología

Concesión Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriátria

Julio 2026

- Avances en Puertas y Terminaciones Unidad de Trauma Ocular (UTO)
- Avances PSP Pabellones, UIS, MOA.
- Avances revestimientos interiores Pabellones Históricos

Instalaciones: Gases clínicos, se realizaron pruebas de conexiones no cruzadas y obstrucción, pruebas de cierre de cajas de válvulas, instalación de flexibles eje 20 HDS y montaje líneas de descarga de los manifold. Correo neumático, sólo le faltan las pruebas con el BMS a sala de control. Gas y combustible, faltan pruebas con equipos instalados en la cocina. Cableado estructurado y corrientes débiles, destaca el avance de puesta en marcha. Instalaciones eléctricas, se continúa con entregas de instalación de canalizaciones menores en edificios AA, HDS e ING, entregas de cableado en bandejas, en los edificios AA, HDS e ING, se avanza en la instalación de cableado y conexión de paneles fotovoltaicos e los edificios AA e ING.

Mes-Año	Avance Físico de la Obra (%)		
	Anterior	Mensual	Acumulado
jul -2026	98,76%	0,08%	98,84%


9. MANO DE OBRA

Total	F	M	Mes julio 26
Mano de Obra Ingeniería	0	0	0
Mano de Obra Construcción	103	758	758
Empleos Indirectos	26	66	92

Concesión Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría

Julio 2026

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

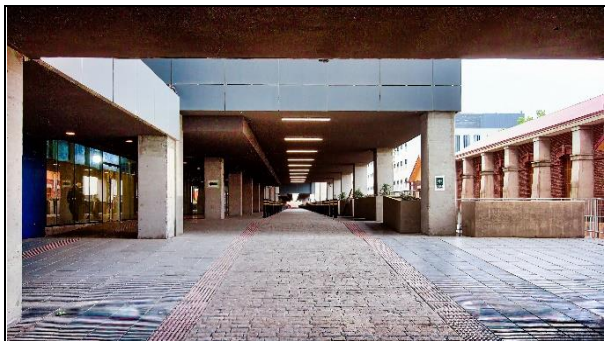


Avenida Hospitalaria



UPC



Hall Atención Abierta

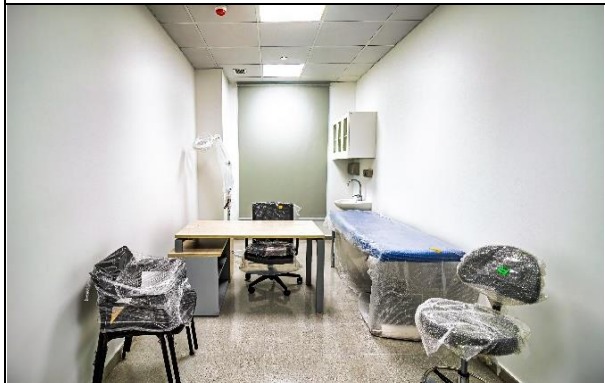

Consulta Médica Atención Abierta



Fachada ING



Pabellones Quirúrgicos



Farmacia Central PS1 HDS



Hall ING
