

INFORME WEB DE AVANCE

ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESION		Objetivo del Contrato de Concesión
Nombre del Contrato	: Concesión Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, CMVRC.	<p>Este contrato consiste en delegar al Concesionario la custodia de los vehículos retirados de Circulación, que actualmente es función de las Municipalidades, de manera de elevar en forma considerable, los estándares del servicio. Para ello, el Concesionario debe diseñar y construir un Centro de Custodia especialmente habilitado para estacionar los vehículos retirados de circulación o de las vías públicas, el cual contará con las instalaciones, equipamientos y sistemas de seguridad e informáticos, necesarios para el resguardo de los vehículos en condiciones de seguridad, confiabilidad y eficiencia, requisitos que son exigidos y fiscalizados por la Coordinadora de Concesiones del MOP. El Concesionario tiene, además, la obligación de trasladar a dicho Centro de Custodia los vehículos retirados de circulación desde el lugar que determine la Autoridad (Carabineros de Chile, Inspectores Municipales y Fiscales). El terreno de emplazamiento está ubicado en Km 3 del camino Lo Echevers (Ruta G-16), comuna de Quilicura.</p>
Concesionaria	: S.C. Concesionaria Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación S.A.	
Decreto de Adjudicación	: D.S. MOP N° 136 del 15 de febrero de 2010	
Publicación Diario Oficial	: 05 de Mayo de 2010.	
Región	: Metropolitana	
Inicio Concesión	: 05 de Mayo de 2010	
Inicio Fase de Ingeniería	: 14 de Octubre de 2011	
Inicio Fase de Construcción	: 07 Enero de 2013	
Plazo Fase de Construcción	: 18 meses	
Plazo máximo de la Concesión	: 300 meses	
Presupuesto de Obra	: UF 485.678	
Inspector Fiscal Titular	: Rene Labra Jarvis	
Asesoría a la Inspección Fiscal	: RFA Ingenieros Ltda.	
Avance Presentación Plataforma Tecnológica	: 100%	
Declaración de Avance N° 1	: 7 de Abril de 2013. Exigido 5% Cumplido	
Declaración de Avance N°2	: 7 de Octubre de 2013. Exigido 40% Cumplido	
Declaración de Avance N°3	: 7 de Febrero de 2014. Exigido 80% Cumplido	
Puesta en Servicio Provisoria	: 5 de Agosto de 2014	



ACTIVIDADES

Durante el mes de Agosto de 2014, las principales actividades realizadas por la Asesoría, corresponden a la preparación de la Puesta en Servicio Provisoria de las obras y el traspaso a Explotación del contrato.


Con fecha 5 de Agosto del 2014, se autoriza a partir de las 00:00 hrs. del día siguiente a la total tramitación de la Resolución Exenta N°2790, el inicio a la Puesta en Servicio Provisoria de las obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. Con esto se da inicio a la etapa de Explotación del contrato.

Comienzan las labores del Inspector Fiscal de Explotación del Contrato y la Asesoría a esta Inspección Fiscal. Por parte de RFA Ingenieros Ltda. Comienzan las tareas de Informe Final del Contrato.

AVANCE DE OBRA

	ENE-13	FEB-13	MAR-13	ABR-13	MAY-13	JUN-13	JUL-13	AGO-13	SEP-13	OCT-13	NOV-13	DIC-13	ENE-14	FEB-14	MAR-14	ABR-14	MAY-14	JUN-14	JUL-14	AGO-14
AV. PARCIAL MENSUAL PROGRAMADO	1.86%	2.28%	3.77%	2.82%	5.35%	11.86%	11.85%	15.81%	15.58%	14.24%	4.32%	4.64%	3.87%	1.57%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AV. ACUMULADO PROGRAMADO	1.86%	4.14%	7.90%	10.72%	16.07%	27.93%	39.78%	55.59%	71.17%	85.41%	89.74%	94.38%	98.26%	99.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
AV. PARCIAL MENSUAL REAL	1.91%	3.54%	4.85%	5.14%	9.82%	6.68%	2.11%	10.03%	13.26%	10.32%	5.37%	5.44%	10.56%	1.42%	1.56%	3.15%	3.81%	0.40%	0.61%	0.00%
AV. ACUMULADO REAL	1.91%	5.45%	10.29%	15.43%	25.25%	31.94%	34.05%	44.09%	57.35%	67.67%	73.04%	78.48%	89.05%	90.47%	92.03%	95.18%	98.99%	99.39%	100.00%	100.00%

CURVA "S" DEL PROYECTO Y LÍNEA DE TENDENCIA

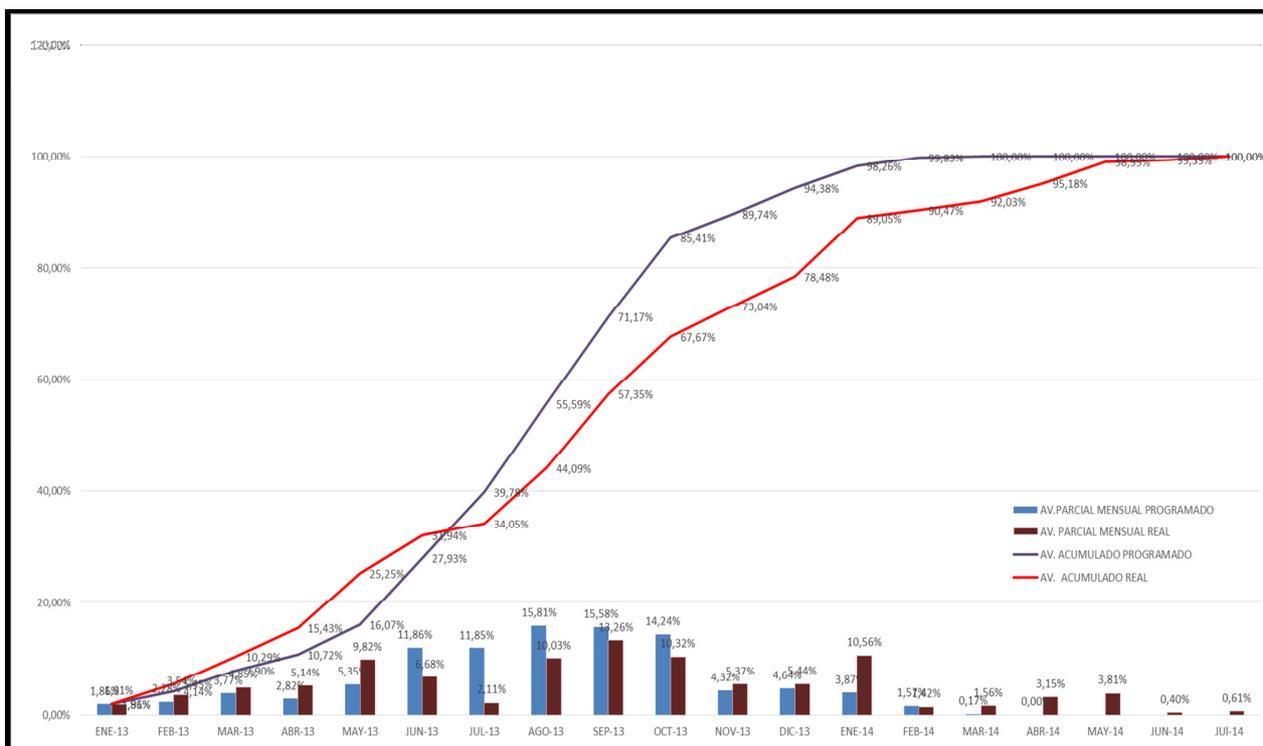



Coordinación
de Concesiones
de Obras
Públicas
Ministerio de Obras
Públicas
Gobierno de Chile

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE CONCESIONES
DIVISION CONSTRUCCION DE OBRAS CONCESIONADAS
CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN

SEPTIEMBRE 2014

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES EN TERRENO CMVRC



Vista Frontal del Edificio CMVRC



Coordinación
de Concesiones
de Obras
Públicas
Ministerio de Obras
Públicas
Gobierno de Chile

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACION DE CONCESIONES
DIVISION CONSTRUCCION DE OBRAS CONCESIONADAS
CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN

SEPTIEMBRE 2014



Vista lateral al edificio CMVRC



Coordinación
de Concesiones
de Obras
Públicas
Ministerio de Obras
Públicas

Gobierno de Chile

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACION DE CONCESIONES
DIVISION CONSTRUCCION DE OBRAS CONCESIONADAS
CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN

SEPTIEMBRE 2014



Vista Parquadero
