

# CONCESIÓN HOSPITAL DE ANTOFAGASTA

MES DE MARZO DE 2025

## ANTECEDENTES GENERALES

|                                                        |   |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Contrato                                    | : | Hospital Regional de Antofagasta                                    |
| Concesionaria                                          | : | Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A                          |
| Decreto de Adjudicación                                | : | D.S. N°141 26/02/2013                                               |
| Región de Emplazamiento                                | : | Región de Antofagasta                                               |
| Inicio del Plazo de Concesión                          | : | 21.06.2013 (Publicación Diario Oficial)                             |
| Inicio Obras de Construcción                           | : | 2° semestre de 2014                                                 |
| Puesta en Servicio Provisoria                          | : | 16.10.2017                                                          |
| Fecha de inicio para el cálculo del Plazo de Concesión | : | 22.12.2017 Res. N°5065 (Fecha de Autorización de Pago de Subsidios) |
| Puesta en Servicio Definitiva                          | : | 1 año posterior a PSP Res. Exenta DGC N°1150, 28.12.2018            |
| Fase actual                                            | : | Explotación                                                         |
| Fin Concesión Explotación                              | : | 22.12.2032                                                          |
| Presupuesto Oficial (UF)                               | : | 5.306.000                                                           |
| Inversión Materializada (UF)                           | : | 5.145.861                                                           |
| Inspector Fiscal                                       | : | Mauricio Miranda Pardo                                              |
| Asesoría IT                                            | : | CyD Ingeniería                                                      |

### 1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO

El Hospital Regional de Antofagasta se ubica entre las calles Monte Grande por el norte, Víctor Jara por el sur, Azapa por el oriente y Pedro Aguirre Cerda por el poniente.



### 1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Contrato de Concesión “Hospital de Antofagasta”, se ubica en la II Región, en la ciudad de Antofagasta. Comprende una infraestructura hospitalaria de alta complejidad en el que se entrega atención hospitalaria y ambulatoria.

En diciembre de 2018 comenzó oficialmente su puesta en marcha definitiva. Tendrá una capacidad de 671 camas, cuando esté funcionando a plena capacidad.

Esta obra pública fue financiada mediante aportes del Estado, a través de subsidios tanto para la construcción como la operación del recinto y el equipamiento médico.

## 2. SERVICIOS CONCESIONADOS

Durante la etapa explotación el contrato consta de Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios Complementarios que se indican a continuación:

### Servicios Básicos:

- Aseo y Limpieza General
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
- Control Sanitario de Vectores
- Gestión de Ropería y Guardarropía
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura. Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario asociado a la Infraestructura.
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico
- Adquisición y Reposición Mobiliario No Clínico

### Servicios Especiales Obligatorios:

- Cafetería
- Seguridad y Vigilancia
- Estacionamiento de Funcionarios
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- Servicio de Infraestructura Tecnológica

### Servicios Complementarios:

- Alimentación a Público en General
- Estacionamientos para Público en General
- Máquinas Dispensadoras
- Áreas Multiservicios

## 3. BENEFICIOS DEL PROYECTO

La superficie construida consta más de 114.000 m<sup>2</sup>, y considera la inclusión de 45 boxes de consulta, 24 boxes de urgencia, 16 boxes dentales, 18 pabellones y 671 camas indiferenciadas. Esta obra pública fue financiada mediante aportes del Estado, a través de subsidios tanto para la construcción como la operación del recinto y el equipamiento médico.

## CONCESIÓN HOSPITAL DE ANTOFAGASTA

MES DE MARZO DE 2025

### Actividades Comunicacionales

Se hizo entrega oficial de materiales a la Residencia Zohara, recursos en directo beneficio de lactantes e infantes en situación de vulneración de derechos. Asimismo se diseño nuevo boletín formativo para pacientes y usuarios del Hospital Regional de Antofagasta.


### Niveles Parciales

Datos del SIC, los niveles de servicios parciales de explotación hasta el 28 de Febrero de 2025 corresponden a:

**NSG → 80,09**

Los Niveles de Servicio se clasifican de acuerdo con el índice obtenido, conforme a los señalado en las Bases de Licitación y Anexos Complementarios. En aquellos casos en que el índice obtenido sea menor a 70 puntos, la Sociedad Concesionaria

debe mejorar sus sistemas de autocontrol que le permitan remontar a niveles buenos o excelentes.

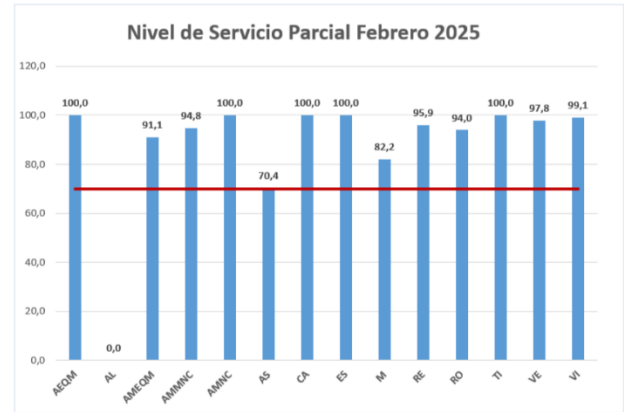

\*NSG y NSP, corresponde al mes de febrero de 2025.

| SIGLA | SERVICIO CONCESIONADO                                                      | SIGLA  | SERVICIO CONCESIONADO                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AEQM: | Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico       | RO:    | Gestión de Ropería                                                                                   |
| AMNC: | Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico                          | AS     | Aseo y Limpieza General                                                                              |
| AMEQM | Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico | M:     | Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario |
| ES:   | Estacionamiento de Funcionarios y Visitas                                  | AMMNC: | Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico                                              |
| VI:   | Seguridad y Vigilancia                                                     | AL:    | Alimentación de Pacientes y Funcionarios                                                             |
| VE:   | Control Sanitario de Vectores                                              | RE:    | Gestión Integral de Residuos Hospitalarios                                                           |
| CA:   | Cafetería                                                                  | TI     | Sistema de Información e Infraestructura Tecnológica                                                 |
