

ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ – SUBTRAMO B1

MARZO 2022


1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial Urbana
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del Proyecto	Región Metropolitana
Presupuesto Oficial del Proyecto (Tramo A+Tramo B)	UF 1.500.000
Longitud del Proyecto Tramo B	7,7 Km.
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria AMB S.A.
Accionistas del Concesionario	Grupo Costanera SpA 99,983 % Gestión Vial S.A. 0,017 %
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N°495 de fecha 21/07/2008
Plazo de la Concesión (*)	Máximo 480 meses ó cuando se cumpla la condición de $VPI_{m} \geq ITC.$, lo que ocurra primero.
Inicio de Ejecución de las Obras Tramo B1	17.06.2021
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Sub Tramo B1	16.07.2023
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	No definida
Término de la Concesión	Julio 2048
Inspector Fiscal Titular	Lester Poblete Godoy
Inspector Fiscal Suplente	Juan Nieto Jones Res. EX DGC (E) N°2410 del 06.10.2021
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Zañartu Ingenieros Consultores SpA
Modificaciones al Contrato	- DS N°326 de 24 Octubre 2011 - DS N°302 – 13 Feb. 2013 CadR N°1. - DS N°339 – 02 Octubre 2014 CadR N°2. - Res N°1244 de 21 abril 2011 - Res N° (E) N°1956 de 12 agosto 2019 Habilitación Acceso Portón N°12 - DS N°7 de 14.05.2021 dispone obras sub tramo B1
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	RCA aprobada de acuerdo a: -Res(exenta) N°121 de 14 Febrero 2012 y -Res (exenta) N°942 de 16 octubre 2014
Subsidios	No tiene
Página Web de la Concesión	www.accesovialamb.cl

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de concesión “Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Tramo B”, se ubica en la Región Metropolitana, abarcando las comunas de Pudahuel, Renca y Quilicura. El Acceso se desarrolla en parte por Camino Lo Boza, parte por Camino Lo Echevers y por nueva faja fiscal paralela al Estero Las Cruces, hasta acometer al Aeropuerto por su deslinde Norte, uniéndose a la vialidad interior del Aeropuerto.

Tiene por objetivo mejorar la infraestructura vial de acceso a dicho aeropuerto, elevando los estándares de servicio de la ruta, materializando un nuevo acceso por el sector Norte al Aeropuerto.

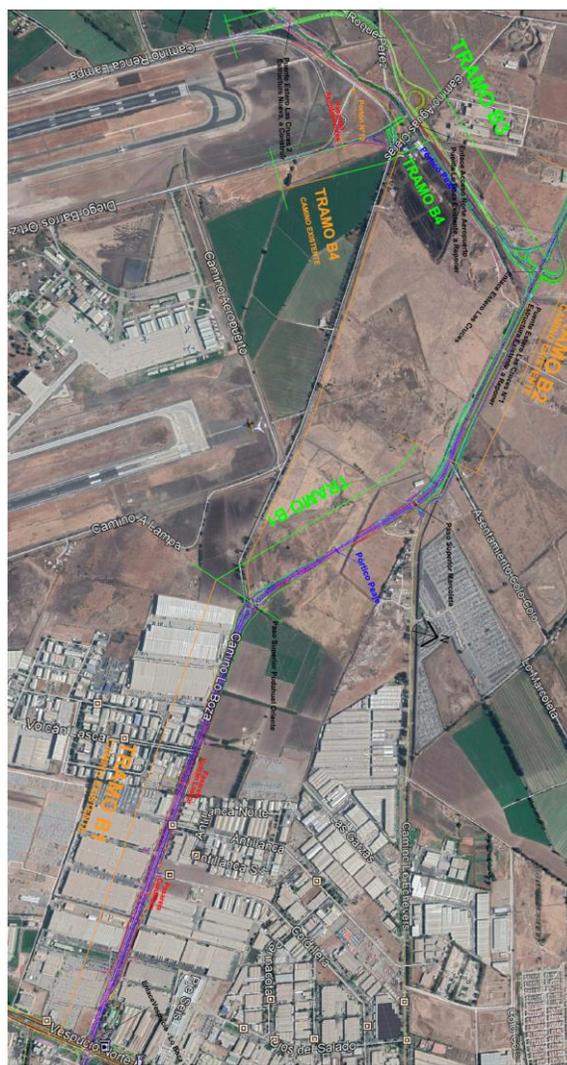

ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ – SUBTRAMO B1

MARZO 2022

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, del Ministerio de Obras Públicas, tiene su origen en el contrato adjudicado a la Sociedad Concesionaria AMB S.A. en Julio del 2008, iniciado el 12 de septiembre del mismo año. Debido a las diferentes características que presentan los accesos Sur y Norte al Aeropuerto, y considerando que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y el artículo 69° de su Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas modificó por razones de interés público las características de las obras y servicios contratados, y se estimó necesario modificar las características de las obras y servicios de este contrato de concesión, disponiendo la ejecución separada de obras en los Tramos A en el acceso Sur ya ejecutadas, y Tramo B en el acceso Norte, actualmente en ejecución el Sub Tramo B1 y conservación de los sub tramos B2, B3 y B4.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

El proyecto correspondiente al tramo B del acceso norte, nueva conexión norte al aeropuerto, de 7,7 Km de extensión, según el detalle que se indica en tabla más abajo, consta de un eje vial de 4,8 Km con doble calzada segregada a partir de los ejes Lo Boza y Lo Echevers, empalmando con la nueva conexión norte al aeropuerto, de 2,9 Km de extensión.

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los subtramos del contrato, el cual en esta oportunidad, contempla la ejecución de las obras del Subtramo B1 y el mantenimiento y conservación de los Subtramos B2, B3 y B4.

Sub-Tramo	Ubicación	Long. (Km)
B1	Calle Condell-Enlace Américo Vespucio con Camino Lo Boza, hasta empalme Lo Boza con camino Lampa, tramo hasta Enlace Lo Marcoleta y Camino Lo Echevers, hasta Km 7,0	3,3
B2	Empalme Camino Lo Echevers desde Km 7.0 hasta Enlace Estero Las Cruces	1,5
B3	Enlace Estero Las Cruces hasta conexión con Camino las Lilas	2,3
B4	Desde Camino Las Lilas, nuevo acceso norte al Aeropuerto, conexión con camino interior y a camino exterior poniente del aeropuerto	0,6

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO-TRAMO B

- Aumento de capacidad en Lo Boza, en el tramo comprendido entre el nudo vial de Vespucio y aproximadamente 3,3 km en dirección hacia Nor-Poniente, generando dos calzadas expresas de 2 pistas cada una, calles de servicio ambos costados, incluyendo una ciclovía por ambos costados, el subtramo considera 2 Estructuras de Paso Superior y 2 pasarelas (Sub-Tramo B1, actualmente en construcción).
- Construcción de aproximadamente 1,5 km de nueva vialidad en doble calzada, con ciclovía, considerada en el PRMS, que conecta Lo Boza con camino Lampa. (Sub- Tramo B2).
- Tramo de camino nuevo, paralelo a Estero Las Cruces en aproximadamente 2,3 km con calzada bidireccional en el tramo comprendido entre; camino a Lampa, Lo Echevers y nuevo enlace de ingreso al Aeropuerto. (Sub-Tramo B3).
- Conexiones al sector norte del Aeropuerto a camino interior y al camino exterior al poniente del Aeropuerto 0,6 Km. (Sub-Tramo B4).
- Implementación del Sistema de cobro Free-Flow en Acceso Norte.

6.- OBRAS DEL PROYECTO-SUB TRAMO B1

- Aumento de capacidad en Lo Boza, en el tramo comprendido entre el nudo vial de Vespucio y aproximadamente 2,0 Km. en dirección hacia el Nor-Poniente, generando dos calzadas expresas de 2 pistas cada una, más calles de servicio a ambos costados.
- Aproximadamente 1,0 Km de nueva vialidad en doble calzada, que conecta Lo Boza con Camino Lampa.
- Paso Superior Lo Marcoleta y Paso Superior Nuevo Pudahuel.
- Dos pasarelas, la primera entre Dm. 4.200 – 4.300, cercano a calle Cordillera y la segunda en el Dm. 4.800 cercano a Av. Volcán Láscar.
- Ciclovía bidireccional de ancho variable, (entre 1,75 y 2,00 m) más una franja de seguridad de 0,25 m, proyectada a ambos lados hasta el Paso superior Pudahuel Oriente, Dm. 5.600 y posteriormente al lado norte del eje.
- Vereda de hormigón de 2 m a ambos lados de la vía, hasta Dm. 5.600 y posteriormente al lado norte del eje.
- Obras de saneamiento y drenaje.
- Paraderos de Buses, obras de seguridad, señalización e iluminación.
- Accesos a todas las propiedades existentes en el tramo.

ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ – SUBTRAMO B1

MARZO 2022

7.- OBRAS QUE SE EXCLUYEN DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL SUB TRAMO B1

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo DS N°7 en su numeral 4, se excluyen de las obras a ejecutar en el Subtramo B1:

- La obligación de instalar y construir las Áreas de Atención de Emergencias señaladas en el artículo 2.7.18.1 de las BALI, e instalar los teléfonos de emergencias del artículo 2.7.18.2 de las BALI.
- Construir la calle de Servicio Local Sur 2 (CLS2) desde el Dm. 6,530 hacia el norte y la calle de Servicio Local Norte 2, así como la vereda y ciclovía adyacente a ésta desde el Dm. 6,800 hacia el norte, las que se encuentran en el límite de los subtramos B1 y B2 de la concesión.
- Las obras e instalaciones correspondientes al Punto de Cobro respectivo a que hace referencia la Tabla N° 5 del artículo 1.14.2 de las Bali, las obras correspondientes a las plazas de peaje manuales y electrónicas que se ubicarían en el Subtramo B1, y la totalidad de las obras e instalaciones electrónicas y electromecánicas establecidas en las Bases de Licitación del Contrato de Concesión para dicho subtramo, tales como espiras y cámaras.

8.- ANTECEDENTES IMPORTANTES

- Con fecha 14.05.2021 se tramitó el DS N°7 de 22.01.2021 por el cual se dispone la ejecución del subtramo B1 del Dm 3.100 al Dm 7.000 y que considera además la compensación por las obras del denominado Portón 12 de la Res (E) N°1956 y la adecuación de la ingeniería complementaria, aplicada al referido subtramo B1.
- Se encuentra ejecutada la Toma de Posesión del 100% de los terrenos en que se construirán las Pasarelas Cordillera y Volcán Láscar.
- Se encuentra aprobado el plan anual de mantenimiento y conservación periódico mediante DS N°326 del 24.10.2011 y en convenio CadR N°1 por un monto de hasta 1.088,80 UF por año, mediante DS N°302 del 13.02.2013.
- Con fecha 17.06.21 mediante ordinario IF AMBTB N° 227 SCAMB 103, se dio inicio a la construcción de la obra en el subtramo B1.
- Con fecha 06.10.21 mediante Res. EX DGC (E) N°2410 se deja sin efecto la Res. EX DGC N°1670 y designa como Inspector Fiscal Titular al sr. Lester Poblete Godoy y como Inspector Fiscal Suplente al sr. Juan Nieto Jones.

9.- HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes que informar en el mes de marzo 2022.

10.- AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SUB TRAMO B1

Proyectos de Ingeniería: Éstos se encuentran aprobados en un 100%, contando con los planos en versión 0.

Cambios de Servicios: Para el periodo de marzo 2022 se informa que existe una reactivación de los trabajado asociados a las transferencias de conexión para el servicio eléctrico en donde se verifico una reactivación contabilizando estimativamente un leve incremento llegando a un 85,58% de avance físico ponderado el cual se desglosa en un 100% de avance físico para los Cambios de Servicio Húmedos y un 72% para los Cambios de Servicios no húmedos, sin embargo, estos últimos ya se encuentran en etapa se reactivación.

En relación al avance financiero no se reporta modificaciones durante el mes de marzo 2022, con lo cual se conserva un 86,8% de avance financiero.

Declaraciones de Avance:

- Con fecha 06.10.21 mediante ordinario IF AMBTB N° 82, se aprobó la 1° Declaración de Avance con un 7,65% de la construcción de la obra en el subtramo B1.
- Con fecha 03.11.21 mediante ordinario IF AMBTB N° 106, se aprobó la 2° Declaración de Avance con un 11,21% de la construcción de la obra en el subtramo B1.

Avance de Obras en el Subtramo B1: en el mes de marzo 2022, se tiene un 6,2% de avance físico parcial de las obras y un avance acumulado de un 40,2% lo que representa una disminución de un 2,2% del avance programado.

A continuación, se describen las principales actividades realizadas durante el mes:

Estructuras:

- Paso superior lo Marcoleta Entrada Sur: hormigón muro barrera TEM
- Paso superior Lo Marcoleta: hormigón muro convencional
- Paso superior Lo Marcoleta: cimbra travesaño
- Paso superior lo Marcoleta: muro TEM
- Paso superior Lo Marcoleta: montaje de vigas
- Paso superior Lo Marcoleta: hormigón de travesaño
- Paso superior Lo Marcoleta: emplantillado muro barrera sobre TEM
- Paso superior Lo Marcoleta: enfierradura muro barrera sobre TEM

ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ – SUBTRAMO B1

MARZO 2022

Saneamiento:

- C.I 1.25 a C.I 1.23 cañería N°1: excavación de colector
- C.I 1.25 a C.I 1.24: cañería N°1: instalación de tubería
- C.I 1.13 Canal Entubado: excavación y construcción
- C.I 1.30 cañería N°1: hormigón losa superior
- C.I 1.31 cañería N°1: relleno compactado
- C.I 1.29 cañería N°1: hormigón losa superior
- C.I 1.23 a C.I 1.24 cañería N°1: excavación
- Obra de arte N°2: hormigón muro boca
- C.I 1.29 cañería N°1: relleno compactado
- C.I 1.28 cañería N°1: hormigón de muros
- C.I 1.13 canal entubado: hormigonado de muros y losa superior
- C.I 1.14 canal entubado: hormigonado de muros y losa superior
- Sumidero 1.2: construcción

Vialidad

- Calle Local Norte Km 3.890 a Km 4.180: preparación de la subrasante
- Calle Local Norte Km 4.180 a Km 4.240: preparación de sello
- Calle Local Sur Ramal N°2 Km 3.580 a Km 3.900: preparación de sello
- Km 3.780 a Km 3.880: instalación de soleras
- Accesos A-21 y A-22: preparación de subrasante
- Accesos A-18 y A-19: preparación de sello

Aceras, ciclovías y otros

- Aceras Km 6300 a Km 6450: hormigón de aceras

11.- FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS DEL SUB TRAMO B1



17 mar. 2022 12:17 p. m.
5360 Camino Lo Boza
Pudahuel
Santiago
Región Metropolitana
Obra Acceso Vial Aeropuerto AMB

Instalación de tuberías de Canal Nro. 1 al sur de PS Pudahuel Oriente



21 mar. 2022 3:42 p. m.
Camino Lo Echeverri
Pudahuel
Santiago
Región Metropolitana
Obra Acceso Vial Aeropuerto AMB

Aplicación de shotcrete para reforzar excavación que alojará foso revestido



21 mar. 2022 4:01 p. m.
891 Camino Lo Echeverri
Pudahuel
Santiago
Región Metropolitana
Obra Acceso Vial Aeropuerto AMB

Talud al sur de Paso Superior Marcoleta con shotcrete terminado



21/3/2022 4:15:34 p. m. hora de verano de Chile
5540 Camino Lo Boza
Pudahuel
Santiago
Región Metropolitana
Obra Acceso Vial Aeropuerto AMB

Preparación de enfierradura en fundación de bandera al sur de Paso Superior Lo Marcoleta

ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ – SUBTRAMO B1


MARZO 2022



Montaje de vigas en Paso Superior Pudahuel Oriente (21 vigas en total)



Otra vista de montaje de vigas en Paso Superior Pudahuel Oriente

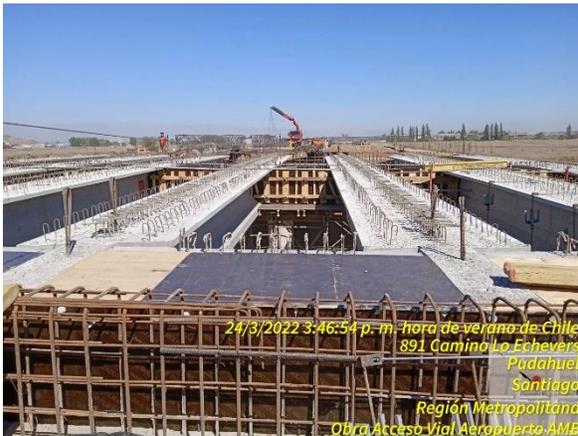

Cámara para recibir sumidero transversal sobre relleno de terraplén de acceso a PS Marcoleta



Colocación de moldajes inferiores para hormigonado de losa de Paso Superior Lo Marcoleta



Preparación de enfierradura en fundación de bandera al sur de Paso Superior Lo Marcoleta



Vista de muro TEM terminado en lado izquierdo de Paso Superior Lo Marcoleta
