

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Teleférico Bicentenario
Tipología del Contrato	Edificación Pública y Transporte
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del Proyecto	Comuna de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba. RM
Presupuesto Oficial del Proyecto	Oficial : UF 1.948.603 + IVA
Superficie del Proyecto	Superficies: E. Santa Clara – 2.929,5 m2 E. Canal San Carlos – 675,13 m2 E. P. Metropolitano – 1240,37 m2 Punto de Quiebre – 28,32 m2 Longitud aproximada de 3.4 k m
Superficie Concesionada	Superficie Expropiación (sin BNUP) Huechuraba – 16.414 m2 Las Condes – 652 m2 Providencia – 248 m2 Vitacura – 4.392 m2
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario S.A.
Accionistas del Concesionario	10% Ciudad Empresarial S.A. 42,5% Icafal Inversiones S.A. 42,5% Doppelmayr Chile Holding SpA 5% Teleférico Bicentenario SpA
Decreto de Adjudicación	D.S. MOP 27 del 01.03.2018, publicado en Diario Oficial el 19.05.2018
Inicio de la Concesión	19 de mayo de 2018
Plazo de la Concesión	420 meses Máximo o 100% ITC ofertado
Fecha Llamado a licitación	11 de julio 2017
Apertura Ofertas Técnicas	15 de diciembre 2017
Apertura Ofertas Económicas	12 de enero 2018
Valor ITC (Ingresos Totales Concesión)	UF 5.759.970 (87,3% del ITC oficial)
Inicio de Ejecución de las Obras	14 de octubre 2024
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	2do. Trimestre 2027 (estimado)
Término de la Concesión	10 de diciembre de 2054 máximo ó 100% del ITC
Inspector Fiscal Titular	Romina Segura Villalobos Res. Ex. N°0671 de 08.03.2024
Inspector Fiscal Suplente	Felipe Gajardo Jiménez Res. Ex. N°0671 de 08.03.2024
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	R&Q Ingeniería S.A. Res. DGC N°0112 del 19.11.2021
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	El proyecto no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO



El proyecto se sitúa en la Región Metropolitana de Santiago, abarcando las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Teleférico Bicentenario, tiene como objetivo la implementación, a través del Sistema de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, de un Teleférico Urbano en la ciudad de Santiago, que permitirá la conexión entre las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba, a través de un tendido de aproximadamente 3.4 kilómetros con 19 torres de apoyo, que se inicia en las cercanías del Mall Costanera Center, con una estación de retorno denominada Canal San Carlos (Tobalaba), ubicada a un costado de Avenida Nueva Tajamar y Avenida Vitacura, siguiendo luego hacia el poniente, con un edificio técnico denominado Punto de Quiebre, enfilando desde éste hacia la estación motriz ubicada en el Parque Metropolitano, que mantiene el mismo nombre, para finalmente el Teleférico terminar en la Ciudad Empresarial de Huechuraba, en la estación de retorno denominada Santa Clara.

La Concesión del Teleférico Bicentenario ha sido adjudicada a la empresa "Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario S.A.", la cual está desarrollando el Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID), como parte de la Etapa de Construcción e Implementación de la Obra.

El Teleférico Bicentenario está constituido por las siguientes obras:

Obras del Teleférico Bicentenario

Obra	Comuna(s)
Estación Canal San Carlos	Providencia y Las Condes
Punto de Quiebre	Las Condes
Torres: T1 y T2	Las Condes
Torres : T3, T4, T5, T6	Providencia
Torres : T7, T8, T9, T10, y T11	Vitacura
Estación Parque Metropolitano	Vitacura
Torre : T12	Vitacura
Torres : T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19	Huechuraba
Estación Santa Clara	Huechuraba



Ubicación Estación Parque Metropolitano



Ubicación Estación Canal San Carlos



Ubicación Punto de Quiebre



Ubicación Estación Santa Clara

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que desarrolla el proyecto son las que se indican a continuación:

- 3 estaciones (una motriz y dos de retorno).
- 1 punto de Quiebre.
- 1 almacén de Cabinas.
- Torres necesarias para la realización de la línea del Teleférico (incluida su instalación).
- Construcción de la infraestructura y sus instalaciones de apoyo.
- Accesos a las estaciones.
- Ampliación de las subestaciones eléctricas y/o construcción de nuevas subestaciones, necesarias para la operación del Teleférico.
- Cierros perimetrales y de seguridad.
- Habilitación de acceso a las torres.
- Obras exteriores para la habilitación del espacio público y paisajismo de las estaciones.
- Obras asociadas a la instalación de equipamiento electromecánico, ascensores, escaleras mecánicas, equipamiento del Teleférico.
- Demolición, reubicación o reinstalación de aquellas obras preexistentes para dar cabida a las nuevas obras del Teleférico.
- Otras obras, definidas en los Antecedentes Referenciales entregado por el MOP y las obras que se consideren dentro de los Proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados por el Inspector Fiscal.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Este sistema de transporte contribuye a mejorar la conectividad y tránsito vehicular y peatonal de uno de los sectores más congestionados de la capital, ofreciendo un modo de transporte eficiente y sustentable.

- Disminuir los tiempos de viaje.
Se podrá efectuar el recorrido entre Providencia y Huechuraba en 13 minutos, lo que es un avance significativo ya que actualmente dicho trayecto puede demorar unos 40 a 45 minutos en transporte público.
- En términos de capacidad, el Teleférico Bicentenario podrá transportar máximo 3.000 pasajeros por hora, por sentido. Es decir, en total 6.000 pasajeros por hora

- No contaminante: El Teleférico es un medio de transporte eléctrico con cero emisiones de gases de efecto invernadero CO2, CO Y PM10. Contará con un sistema de soporte en caso de cortes de energía para permitir que los pasajeros puedan bajar sin problemas del sistema.
- Disminución de los costos de operación y flota del transporte público.
- Disminución de costos de combustible, neumáticos, lubricantes, etc.
- Se puede prever que debido a la existencia de este teleférico los usuarios prefieran este mecanismo y no tanto el uso vehicular, por lo tanto, se mejore los tiempos de desplazamiento en el Túnel San Cristóbal, principalmente en horas punta.
- Contribución a la certidumbre en los tiempos de viaje de las personas.
- Acceso directo al Parque Metropolitano para las personas de la comuna de Huechuraba.
- Contribución a la ciudad como parte del primer hito urbano en transporte sustentable no tradicional.
- Contribución a una mayor conectividad de la comuna de Huechuraba, entre el sector oriente y norte de Santiago, sorteando grandes diferencias de altura, donde el acceso por carretera resulta difícil e insuficiente en horas punta.
- Fomento de la intermodalidad y el uso de otros modos de transporte sustentable.
- Minimización de las expropiaciones y aportes del estado. (Proyecto no requiere de subsidio).

Se trata de un Teleférico que será construido, operado y mantenido con los más elevados estándares internacionales en materias de servicio, seguridad y confort para el transporte por cable urbano, donde sus beneficiarios directos serán aquellas personas que diariamente deben trasladarse a la Ciudad Empresarial por motivos laborales, y los habitantes de la comuna de Huechuraba que deben trasladarse hacia el sector céntrico de la capital (Comunas de Santiago, Providencia) quienes podrán hacerlo de forma expedita, además de combinar con estaciones de Metro hacia otros destinos.

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

Los trabajadores que laboran en sector Ciudad Empresarial podrán acceder en poco tiempo desde y hacia la comuna de Providencia y conectar con la Estación Metro Tobalaba y sus combinaciones. Se estiman como beneficiarios, según número de personas residentes del área de influencia directa (Las Condes, Providencia, Huechuraba y Vitacura): **620.972** (Censo 2017). Más usuarios del sector norte de Santiago podrán acceder al Parque Metropolitano.

6. TARIFAS

Tarifa Base Máxima: \$600 CLP del 31 de diciembre de 2014, establecidos por Bases de Licitación en el acápite 1.13.1. Actualizado a la fecha por IPC resulta una TBM de \$941 CLP.

7. SUBSIDIOS

Las Bases de Licitación no consideran subsidios al Concesionario. Sí contempla Ingresos Mínimos Garantizados (IMG.)

**8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA
PROYECTO DE INGENIERÍA PID MODIFICADO 2**

Con fecha 27.09.2024 la Sociedad Concesionaria ha realizado la tercera entrega del PID en Rev. 0 formato digital de acuerdo a D.S. MOP N°173-2023. Con fecha 18 de octubre 2024, la Inspección Fiscal envía oficio ORD. 1156 SCTB 381, con la revisión del PID Rev.0 digital aprobado, con instrucciones para su entrega final para firmas de documentos y planos.

Avance del PID Modificado 2.

Avance de Ejecución del PID (%):	100%
Avance de Aprobación del PID* (%):	100%

Nota *. De acuerdo a entregables aprobados.

9. INICIO DE OBRA

BALI	Estimado	Autorizado	Documento de autorización Fecha y N° (Libro de obra, oficio)	Tramos
1.9.2.6	4to. trimestre 2024	14.10.2024	Libro de Obra N°1, Folio 27 14.10.2024	1 y 2

10.- AVANCE DE LA OBRA

Se dio inicio a las obras con fecha 14 de octubre 2024

Mes-Año	Avance Físico de la Obra (%)		
	Anterior	Mensual	Acumulado
12-2024	11,95%	6,68%	18,64%

Nota***. Avance informado por la Sociedad Concesionaria

11.- MANO DE OBRA

Mano de obra Ingeniería y Construcción, empleo indirecto

Total	Mes Diciembre-2024
Mano de Obra Ingeniería	10
Mano de Obra Construcción	185
Empleos Indirectos	168

12.- HECHOS RELEVANTES

OBRAS CONVENIO PARQUEMET-MOP-SERVIU

- a) Con fecha 06.12.2024, El Director de Parquemet envía ORD. N°496 “Responde ORD. N°1082 respecto de nuevo Estanque Los Gemelos en Parque Metropolitano y adjunta observaciones para el desarrollo del Proyecto Ingeniería de Detalles, de fecha 8 de enero de 2024.

DESVÍOS DE TRÁNSITO

- a) Con fecha 18.12.2024, la Sociedad Concesionaria informa a través de su carta GG 2024 12 18 – 1, entrega de Oficio N° 37424/2024 SRM-RM emitido por el SEREMI Metropolitano del Ministerio de Transportes, relacionado con los Desvíos de Tránsito para la Construcción del Edificio Punto de Quiebre y de la Torre 3, en sector de Las Condes y Providencia, respectivamente.
- b) Con fecha 26.12.2024, la Sociedad Concesionaria informa a través de su carta GG 2024 12 26 – 1, que en conjunto con Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente han acordado la propuesta de desvío de tránsito de la Torre 15, cuyo inicio está programado a contar del martes 07 de enero de 2025.
- c) Por otra parte, se encuentra pendiente de aprobación los desvíos de Torre 4 con la concesionaria de Túnel San Cristóbal.

CONVENIO CANALISTAS DE MAIPO – SCTB - MOP

Con fecha 09.12.2024, la Sociedad Concesionaria envía respuestas a las observaciones a la Poliza de Responsabilidad Civil realizadas por la Asociación de Canalistas del Maipo.

CAMBIOS DE SERVICIOS

En visitas a terreno se aprecia que el avance ponderado, según reporte de la SC, es del orden de un 65,59% al 31.12.2024, continuando en estatus atrasado respecto del programa interno de la SC.

13.- LLEGADA EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÍNICO

Las próximas llegadas de equipamiento electromecánico declaradas por la SC son las siguientes:

- Equipamiento Punto de Quiebre: Llegaba a fines de diciembre 2024
- Estructuras Torres completas: Llegaban a principios de noviembre 2024.
- Punto de Quiebre: Llegada para fines de diciembre 2024.
- Vehículos desembragables: Llegada a fines de mayo de 2025.
- Equipo Eléctrico de todas las estaciones y línea: Llegada a fines de enero de 2025.
- Equipo Periféricos (herramientas y repuestos, etc.,): Llegada a fines de enero de 2025.

**14.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA
PROYECTO VIGENTE (PID MODIFICADO 2 rev 0 digital)**



Estación Parque Metropolitano



Estación Canal San Carlos




Estación Santa Clara



Punto de Quiebre

EDIFICIO TECNICO PUNTO DE QUIEBRE (LAS CONDES)

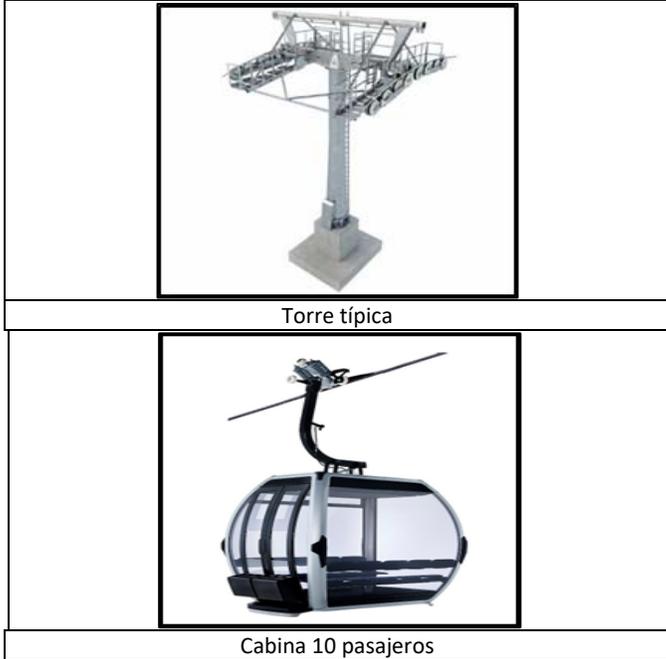

N°	Fecha	Ubicación	Descripción	Registro Fotográfico
01	23.12.24	Punto de Quebre	Prueba de carga de macropilotes días 20 y 23 de diciembre de 2024	
02	23-12-2024	Punto de Quebre	Sin actividad de avance en obras	

ESTACION PARQUE METROPOLITANO (VITACURA)

N°	Fecha	Ubicación	Descripción	Registro Fotográfico
01	30.12.24	Parque Metropolitano.	Excavación protección talud Soil Nailing	
02	23.12.24	Parque Metropolitano.	Torre grúa montada	
07	26.12.24	Parque Metropolitano	Mástiles M 1-1, M 2-1, M 2-2, fundaciones hormigonadas.	

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

AVANCES OBRAS TELEFERICO BICENTENARIO

ESTACION CANAL SAN CARLOS (PROVIDENCIA – LAS CONDES)

N°	Fecha	Ubicación	Descripción	Registro Fotográfico
01	30.12.24	Est. Canal San Carlos	Rellenos compactados en plomo de edificio Estacion	
02	23.12.24	Est. Canal San Carlos	Demolición de calzadas y soleras. Excavaciones a espera de aprobación de proyectos de fundaciones.	
03	23.12.24	Est. Canal San Carlos	Reposición de calzadas es esquina Vitacura y Nueva Tajamar.	

ESTACION SANTA CLARA (HUECHURABA)

N°	Fecha	Ubicación	Descripción	Registro Fotográfico
01	23.12.24	Estación Santa Clara	Hormigonado Mastiles sistema electromecánico.	
02	23.12.24	Estación Santa Clara	Medición de ductilidad en hormigonado	
01	30.12.24	Estación Santa Clara	Armadura mástiles de estación.	
02	30.12.24	Estación Santa Clara	Limpieza residuos de derrame de hormigón	

AVANCES TORRES DEL SISTEMA ELECTROMECHANICO

05	26.12.24	Torres	Torre N°9 Armadura y preparación de moldajes de fundación	
06	23.12.24	Torres	Torre N°10 Esperando aprobación reparación de tubería de mego afectada. Sin movimiento esta semana	
06	30.12.24	Torres	Torre N°16 Emplantillado para armadura de fundaciones.	
07	30.12.24	Torres	Torre N°17 Segregación para próxima intervención	
