

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del proyecto	Región de Coquimbo. Provincia Choapa, Limarí y Elqui. Comunas de Los Vilos, Canela, Ovalle, Coquimbo y La Serena.
Presupuesto Oficial	UF 12.155.000
Longitud del Proyecto	Tramo Urbano: 16 Kms. Tramo Interurbano: 229 Kms.
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui S.A.
Accionistas del Concesionario	Sacyr Concesiones Chile SpA. Accionistas del Concesionario (99%), Sacyr Chile S.A. (1%)
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N° 47 de 30 abril de 2019, publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2019
Plazo de la Concesión	Plazo Máximo 360 meses
Fecha llamada a licitación	12 Mayo 2018 Publicación D. Oficial
Valor ITC (Ingresos Totales de la Concesión)	UF 13.399.900
Inicio de ejecución de las Obras	Desde aprobación de los Proyectos (20 meses aprox.)
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	28 abril 2027 (90 meses)
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	28 octubre 2027
Término de la concesión	Noviembre 2049
Inspector Fiscal Titular	Jaime Yáñez Urzúa Resol. DGC. N°1140 12/04/2023
Inspector Fiscal Suplente	Juan Úbeda Rojas Resol. DGC. N°1140 12/04/2023
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción y explotación	Axioma Ingenieros Consultores S.A. Resol. Adj. N°3107 28/09/2023
Modificaciones del Contrato	No Tiene
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto.	Este proceso se inicia al término del Proyecto de Ingeniería
Subsidios	No Tiene
Página Web	https://rutadelelqui.sacyr.com

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se divide en dos sectores, el primero el tramo Interurbano que se encuentra en operación, tiene una longitud de 229 Km, pasando por las comunas de Los Vilos, Canela, Ovalle y Coquimbo. El sector urbano que está en proyecto, tiene una extensión de 16 Km en las comunas de Coquimbo y La Serena.



3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Tramo interurbano comprende las obras para la rehabilitación y mejoramiento de la calzada preexistente, además de pavimentos nuevos por rectificación del trazado en planta y/o alzado, así como también obras de carpeta asfáltica. Se cambian algunos puentes tales como: Huentelauquen oriente, Limarí poniente, Quebrada Seca y Almendro oriente, se construyen 6 nuevas pasarelas y un enlace en El Panul de Coquimbo.

El Proyecto Referencial original considera una modificación de las obras a ejecutar para el tramo urbano, de las cuales se mencionan a continuación, repavimentación de la doble calzada actual ruta 5, calle de servicio oriente, renovación de señalización y seguridad vial, pistas de transporte público, 1 pasarela, nueva intersección ruta 5 con avenida de Aguirre y extensión de calle libertad, acceso vial a puerto, 2 nuevos puentes y 2 nuevos pasos superiores.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que desarrolló el proyecto, y que se encuentran con su inicio de ejecución son la que se indican a continuación:

Tramo interurbano:

- Calzadas expresas en cuatro sectores de rectificación de trazado.
- 6 pasarelas peatonales
- 4 puentes nuevos
- 1 estructura a desnivel
- 7 actualizaciones estructurales sísmicas de puentes
- 1 cajón nuevo de retorno
- 3 cajones de reemplazo
- Ampliación de Bermas a 2,5 metros
- Paraderos de Buses nueva normativa
- Cierros de protección lateral
- Cierre en mediana sector pasarelas y enlaces
- Obras de seguridad vial
- Obras del sistema de iluminación actualizada a nueva normativa lumínica Regional
- 2 miradores turísticos
- Defensas fluviales
- Tratamiento de taludes
- Plazas de peaje sistema TAG y Manual
- Edificio de administración

Tramo Urbano:

Las principales obras que considera el proyecto, en esta nueva etapa y que se encuentran en proceso de actos administrativos para su ejecución, son las que se indican a continuación:

- Calle de servicio Oriente entre Av. El Sauce y la Av. de Aguirre en una longitud de 14 Kilómetros, con una sección que incluye Ciclovía y acera peatonal e iluminación.
- Renovación de señalización y seguridad vial en vía Expresa
- Pistas exclusivas de transporte público
- Extensión de calle Libertad entre Amunátegui y Huanhualí, en la comuna de La Serena.
- Nueva Pasarela Peatonal Colegio Adventista
- Nueva rotonda intersección Ruta 5 con Avenida de Aguirre
- Acceso vial Puerto de Coquimbo
- Nuevo Puente El Culebrón
- Nuevo Puente FFCC La Garza
- Paso Superior Peñuelas Sur
- Paso Superior Los Perales

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto del Tramo Urbano tiene por objeto el mejoramiento de la Ruta 5 en la Conurbación Coquimbo - La Serena entregando un estándar acorde a las demandas de tránsito y servicios, considerando los siguientes objetivos:

- ✓ Mejoramiento de Seguridad Vial, tanto para vehículos y peatones, de modo de reducir los factores de riesgo de accidentes.
- ✓ Eficiencia, en términos de capacidad de la vía y características de la infraestructura para reducir los tiempos de traslado y los costos de operación de los usuarios entre la comuna de Coquimbo y La Serena.
- ✓ Comodidad, generando las condiciones para que los usuarios puedan satisfacer en forma efectiva sus necesidades de conectividad, así como de provisión de servicios complementarios a los viajes (descanso, carga de combustible, atención a usuarios).
- ✓ Mejoramiento de Accesos al puerto y Centro de la ciudad de Coquimbo, además mejor conectividad con Ruta internacional CH41.

6.- TARIFAS (Art. BALI 1.13 – 1.14)

- Tarifas vigentes, desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2025.

Categoría	Tipo de Vehículo	Tarifas	
		Troncal	Lateral
1	Motos, cuatrimotos y motonetas	\$1.200	\$300
2	Autos y camionetas con o sin remolque, camionetas de doble rueda trasera	\$4.050	\$1.050
3	Buses de dos ejes y casas rodantes	\$7.300	\$1.900
4	Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción de dos ejes	\$7.300	\$1.900
5	Buses de más de dos ejes	\$12.950	\$3.350
6	Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobredimensión	\$12.950	\$3.350

7.- SUBSIDIOS.

No Aplica

8. AVANCE DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

Avance de estudios de Proyectos Viales y Otros Proyectos:

A la fecha, se encuentran aprobados en su totalidad el proyecto Vial y el proyecto de seguridad vial del Tramo Interurbano, ambos se encuentran en su versión 0, que incluyen los subtramos 1 y 2. Por otra parte, las otras especialidades se siguen revisando, interactuando en mesas de trabajo con Depto. de Ingeniería de la DGC. Se continúa trabajando con el último ingreso por parte de la sociedad concesionaria cuya carta es GG/5040/25, que corresponde a Otros Proyectos, versión X del subsector

1, la cual se mantiene en revisión.

Según lo establecido en el DS 27 de fecha 31.01.2023, se han suspendido transitoriamente todas y cada una de las obligaciones relacionadas con las ingenierías del tramo urbano, con el fin de realizar el Estudio de Alternativas Ruta 5 Tramo Urbano Coquimbo – La Serena, Respecto a dicho estudio la sociedad concesionaria sigue avanzando con el proceso de revisión de la fase 5 que corresponde al “Anteproyecto de Expropiaciones”.

Estado de Avance PID Tramo Interurbano:

Avance de Ejecución del PID (%):	84%
Avance de Aprobación del PID (%):	94%

9. INICIO DE OBRAS.

Durante el presente mes se sigue avanzando en obras del tramo interurbano y en preparación en los distintos frentes de trabajo, mientras se espera el cumplimiento del art.1.9.2.6 de la BALI. Se espera en el mes de septiembre completar el hito de expropiación que es obtener el 80% de los terrenos expropiados y por ende dar el inicio formal de la etapa de construcción en el tramo interurbano.

CONSTRUCCIÓN.

Tramo Interurbano.

Durante agosto de 2025, las principales actividades de Construcción se han desarrollado en el tramo interurbano. Cabe destacar las actividades correspondientes a los puentes Huentelauquén en el km 262, puente Quebrada Seca en el km. 396, y El Almendro en el km 412, se encuentran con los pilotes terminados en su totalidad. Se destaca en el caso del Huentelauquén el que ya cuenta con la totalidad de sus Dinteles hormigonados. Con relación a los trabajos en los Atravesos Ñahue (km 234) y Atraveso Chigualoco (km 247), el primero se encuentra completamente terminada la mitad de la parte poniente, mientras que el segundo aún falta la losa superior. Otro nuevo frente de trabajo es el de las Pasarelas Peatonales, específicamente Huentelauquén Sur, km 260 y Mincha Sur, km 262, en ambos casos se avanza en las pilas, con sus respectivas fundaciones, de las rampas de acceso oriente. Respecto a las Barreras metálicas y de hormigón, ambas han continuado de manera normal, acercándose en ambos casos, al extremo norte del tramo interurbano, más precisamente al km 434 (altura de Guanaqueros).

Tramo Urbano

Con relación a la etapa de Construcción, como es de conocimiento el DS N° 27 de fecha 31.01.2023 publicado el 30.05.2023, que modifica las características de las obras y servicios que indica del contrato “Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos – La Serena”, se continúa avanzando en las fases de estudio de la alternativa a ruta 5 circunvalación Coquimbo La Serena y además en el ajuste de las obras que deben ejecutarse en el sector urbano del Contrato de Concesión. Dicho DS deja constancia que para la infraestructura preexistente se mantienen las condiciones y obligaciones

estipuladas en el artículo 1.8.7 de las Bases de Licitación.”

Se está a la espera de la finalización del proceso administrativo del decreto supremo que habilitaría el inicio de los proyectos de ingeniería del proyecto de “Mejoramiento de la Actual Ruta 5, Obras Tempranas”.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Durante el mes de agosto se está a la espera del pronunciamiento por parte del panel técnico de concesiones, respecto del proyecto de la circunvalación Coquimbo – La Serena. Por lo cual se estima que durante el transcurso del segundo semestre del presente año se podría ingresar para su tramitación al SEA, luego de levantar las observaciones surgidas de la revisión.

Expropiaciones

Durante el periodo, se continua con la Toma de Posesión Material (TPM) por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el presente mes se realizan dos campañas de TPM, la primera se realizó los días 1 de agosto de 2025, la segunda se realizó los días 14 de agosto de 2025 y la segunda el 14 de agosto de 2025. En la primera salida se realizaron diligencias a 6 Lotes del tramo interurbano, en la segunda salida se realizaron 6 diligencias, en total en el mes de agosto se realizaron 12 diligencias.

En este periodo, no hubo avances en la entrega de Comunicaciones a los propietarios faltantes ni entrega de lotes a la Sociedad Concesionaria, sin embargo, surgieron situaciones donde se plantea la eliminación de un lote por encontrarse con 2 propietarios. Se planteó el reestudio de antecedentes por parte de la Sociedad Concesionaria, respecto del Lote 17-SS2, por aparecer una subdivisión de éste y figura un segundo propietario. Estos casos entraron en proceso de revisión y se informará al Departamento de Expropiaciones de la DGC.

Situación actual de expropiación:

De un total de 145 lotes efectivos a expropiar en ambos sectores, se dejan fuera de este análisis las áreas de servicio generales, mirador y peajes se da la siguiente situación a la fecha:

Subsector 1 y 2 = 109 lotes en Toma de Posesión Material equivalentes a un 84.00% y oposición 8 lotes equivalentes a un 5%.

Cambios de Servicios

Durante agosto se avanzó en diversas gestiones relacionadas con proyectos en desarrollo. Se emitieron oficios ORD. N°3547-25 empresa HOLCONET (Mundo Pacífico), Grupo de Afectación 11, ORD N°3556-25 empresa Telefónica de Chile S.A. (Movistar), Grupo de Afectación 10 y ORD N°3610-25 correspondientes a distintos tramos y entidades. También se respondió mediante el oficio ORD. N°3579-25 cambios de servicios, aclarando que la normativa vigente aún no permite el envío de oficios vinculados a CCSS Urbano. Además, se llevaron a cabo reuniones de coordinación importantes los días 13 y 21 de agosto, con IF y CCSS Tramo Urbano respectivamente.

10. – AVANCE DE LA OBRA

El avance real a la fecha es de 36 %, principalmente por la ejecución de obras del proyecto de seguridad vial en el tramo interurbano, indicadas en el DS N° 27 de fecha 31.01.2023 publicado el 30.05.2023. Este avance es parte del proyecto del tramo interurbano.

11.- MANO DE OBRA

TOTAL M.O.	Hombre/Mes
Mano de Obra Ingeniería	10
Mano de Obra Construcción	420
Mano de Obra Operación	324
Empleos Indirectos	161

12.- HECHOS RELEVANTES

No Hay Hechos Relevantes en el período.

13.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



Foto 1: Ruta 5, Puente Huentelauquen Oriente, vista general de enfierradura de Dintel.



Foto 2: Ruta 5, Puente Huentelauquen Oriente, pilas hormigonadas de cepa 5.



Foto 3: Ruta 5, Puente Quebrada Seca, Enfierradura y preparación de Moldajes de fundaciones de estribo de acceso.



Foto 4: Ruta 5, Puente Quebrada Seca, vista general de área de trabajo. Pilas y pilotes.



Foto 5: Ruta 5, Puente El almendro Oriente, Vigas despejadas (losa demolida).

14.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN

16.1 INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)

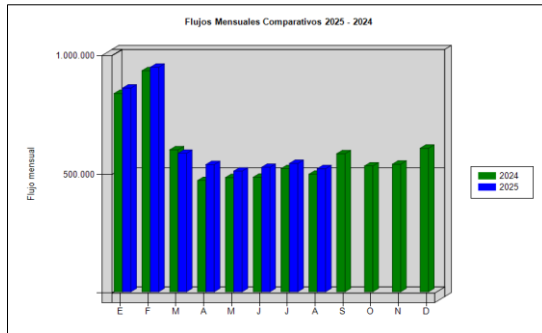


Gráfico 1: Flujos mensuales comparativos 2024-2025
Fuente: Reporte 28 SICE

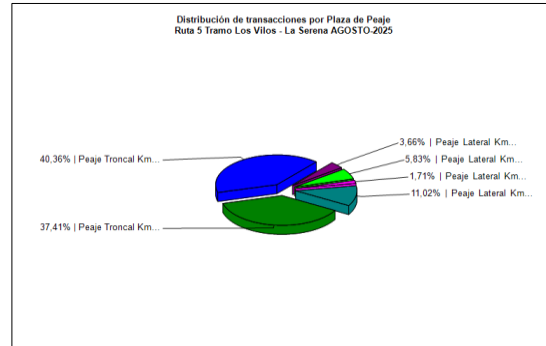


Gráfico 3: Distribución de flujos agosto, por plaza de peajes.
Fuente: Reporte 29 SICE

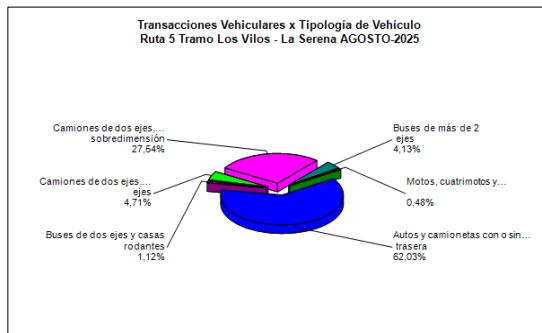


Gráfico 2: Distribución de flujos de agosto por categoría de vehículos.
Fuente: Reporte 29 SICE.

El flujo vehicular neto durante el presente mes fue de 517.971 vehículos, distribuidos en seis categorías.
El flujo vehicular de agosto fue 4,71% mayor que agosto del año 2024.

FLUJOS HISTORICOS DOS AÑOS DE CONCESIÓN.

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
2024	834.759	930.406	597.718	468.482	480.744	482.277	518.343	494.664	580.963	529.530	536.961	604.336
2025	857.091	944.881	582.800	535.519	507.961	523.964	540.139	517.971				

14.2 INFORMACIÓN DE INGRESOS

Comparativo año 2024-2025.

El ingreso del presente mes aumento en un 10.3% con respecto al mes de agosto de 2024, valorizados en pesos chilenos.

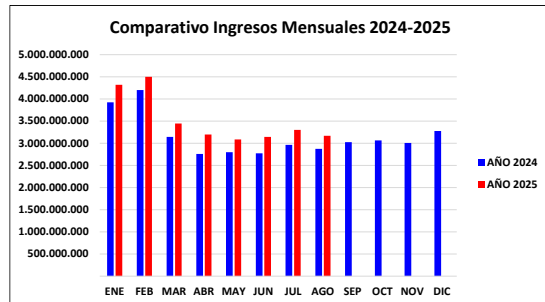


Gráfico 4: Comparativo de ingresos mensuales.
Fuente: Datos SICE

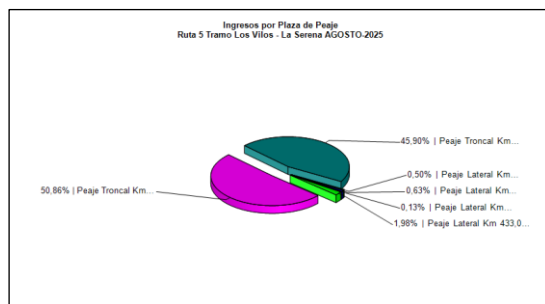


Gráfico 5: Distribución de ingresos agosto por plaza de peaje.
Fuente: Datos SICE

El ingreso mensual alcanzo un monto de \$ 3.168.290.400 equivalentes a 80.756,22 UF (UF diaria del mes de agosto). El mayor aporte de ingresos lo hizo la plaza de peaje de puerto oscuro con un 50.86 % del ingreso total.

14.3 ACCIDENTABILIDAD

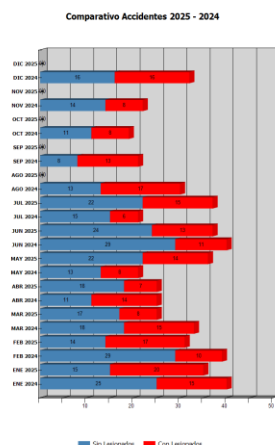


Gráfico 6: Comparativo accidentes 2024-2025.
Fuente: Reporte 33 SICE

Distribución de Lesionados
Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena AGOSTO-2025




Gráfico 7: Distribución Tipos de lesionados
Fuente: Reporte 34 SICE

Distribución Tipos de Accidentes
Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena
AGOSTO-2025




Gráfico 8: Distribución Tipos de accidentes
Fuente: Reporte 34 SICE

	MAY 2024	MAY 2025	JUN 2024	JUN 2025	JUL 2024	JUL 2025	AGO 2024	AGO 2025
Con Lesionados	8	14	11	13	6	15	17	12
Sin Lesionados	13	22	29	24	15	22	13	27
Total Acc.	21	36	40	37	21	37	30	39

Con respecto a las personas lesionadas, al revisar los datos de los 12 accidentes que tuvieron usuarios lesionados, vemos que la mayor parte de ellos resultaron con lesiones leves, por último, menos graves, hubo 1 usuario fallecido. Y no hubo usuarios graves.

ACCIDENTES ACUMULADOS ANUALES (2023-2024-2025).

Años	Accidentes		Victimas				Total	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2023	373	130	9	26	56	139	230	1		44	26	36	2	21
2024	343	141	14	30	49	191	284	6	5	32	26	39	5	28
2025	226	94	20	20	33	122	195	2	2	17	21	33	1	18

14.4 RECLAMOS DE USUARIOS

CASUÍSTICA	Julio	Agosto	Totales
Respecto de datos de Accidentes	9	5	14
Modalidad de cobro en plaza de peaje	0	1	1
Vuelto mal entregado	9	13	22
Acciones de Cobranza	0	1	1
Consultas Comerciales	4	5	9
Imagen corporativa de Sociedad Concesionaria y sus empleados	0	2	2
Calidad de atención de emergencia o asistencia en ruta	1	0	1
Limpieza de la vía y sus alrededores	2	1	3
Estado de baños y dependencias en áreas de servicio	0	1	1
Desvíos	1	0	1
Animal se cruza en la vía	1	4	5
Objeto extraño ocupa la vía	13	18	31
Falta o exceso de iluminación	1	1	2
Problema de tarjeta sin contacto	0	1	1
Sobre otros procedimientos	9	4	13
Difusión y disponibilidad de número telefónico de emergencia	2	0	2
Clasificación tarifaria	3	2	5
Respecto Trabajos en la vía.	1	0	1
Procedimiento sobre dimensionad	0	2	2
Bache en el pavimento de la vía	2	0	2
Información sobre sistema de reclamo presente en la concesión	0	6	6
Cobro Acumulado	1	0	1
Atención en plaza de peaje	2	3	5
Sistema de pago diferido	1	0	1
Otros (Registrar)	22	10	32
TOTALES	84	80	164

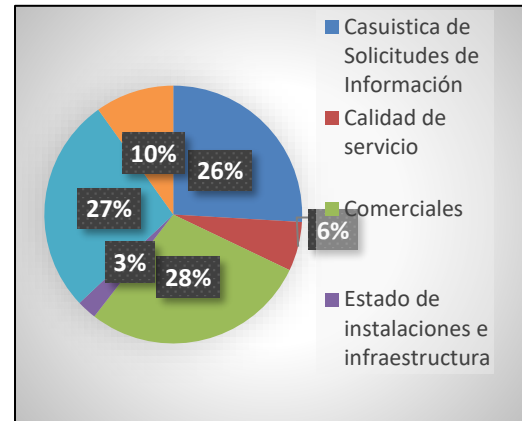



Gráfico 9: Distribución de reclamos por Área Temática
Fuente: SC Ruta Del Elqui.

Los reclamos de usuarios se clasifican en 6 grandes grupos en este mes la mayoría se concentra en temas de solicitud de información y temas comerciales.

14.5 Asistencia a Usuarios

2025										
Mes	Tipo y Nº de atenciones									Total Asistencias
	Reparación vehículo in situ	Remolque	Panne por combustible	Vehículo que requiere otros servicios	Primeros auxilios	Auxilio en accidente	Traslado a centro asistencial	Señalización preventiva	Otros	
Enero	34	204	18	0	2	35	3	28	44	368
Febrero	23	282	29	0	4	31	4	30	68	471
Marzo	19	170	8	0	1	25	3	40	37	303
Abril	34	134	9	0	3	25	3	26	38	272
Mayo	32	125	11	0	2	36	3	38	36	283
Junio	28	28	28	28	28	28	28	28	28	252
Julio	19	19	19	19	19	19	19	19	19	171
Agosto	25	131	6	0	4	39	3	32	32	272
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total	214	1093	128	47	63	238	66	241	302	2392

Tabla de atenciones mensuales y acumuladas.

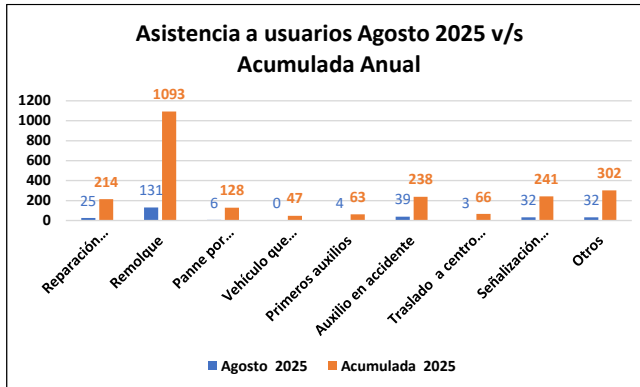

14.6 Hechos relevantes.

No hay hechos relevantes
