


1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Ruta 5 Tramo Talca – Chillán.
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria SURVIAS Maule - Ñuble S.A.
Decreto de Adjudicación	DS MOP N°05 del 07-01-2021 y publicado D.O. el 13-03-2021.
Inicio de Concesión	13-03-2021
Plazo de Concesión	Plazo máximo igual a 384 meses (32 años) o cuando el VPI _m ≥ ITC
Kilómetros Concesionados	193.31 km en el Troncal más 55.8 km del futuro Baipás Talca.
Kilómetros:	- Inicio: 219.490 - Termino: 412.800
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Preexistentes (Sector 1) o de la Fase 1 el 01-04-2021.	Subsector A) Desde el inicio de la Concesión desde la localidad de Camarico en el Km. 219.490 hasta la localidad de San Rafael Km 229.750. Resolución Exenta DGC N°816 del 31-03-2021.
	Subsector B) Desde la localidad de San Rafael Km 229.750 hasta la localidad de San Javier Km 277.000. Resolución Exenta DGC N°816 del 31-03-2021.
	Subsector C) Desde la localidad de San Javier Km 277.000 hasta la localidad de San Carlos Km 377.200. Resolución Exenta DGC N°816 del 31-03-2021.
	Subsector D) Desde la localidad de San Carlos Km 377.200 hasta la localidad de Chillan Viejo km 412.800 (Fin de la Concesión). Resolución Exenta DGC N°816 del 31-03-2021.
Puesta en Servicio Definitiva	-----
Inversión Oficial	UF 19.180.000 / MM USD 804
Convenios Complementarios	No hay a la fecha.
Accionistas y su participación	60% CRCC International Investment Co, LTD 40% CHINA RAILWAY Construcción Corporación (International) Limited
Asesoría Inspección Fiscal.	Consorcio CREAXXION - GAUSS - MAB AIF Talca - Chillán.
Call Center	600 252 6000
Fono Emergencia	600 252 6000
Centro(s) Atención	Ubicados en plazas de peaje Rio Claro y Retiro
Áreas de Servicio	San Rafael Km. 237.000 (Oriente). Putagán Km.291.000 (Poniente). Copihue Km. 334.000 (Oriente). Monte Blanco Km. 382.000 (Poniente).
Estacionamientos de Camiones	San Rafael Km. 237.000 (Oriente). Putagán Km.291.000 (Poniente). Copihue Km. 334.000 (Oriente). Monte Blanco Km. 382.000 (Poniente).
N° Postes SOS	58 postes SOS (GSM-PCS). (29 oriente y 29 poniente).
Mensajería Variable	-----
Página WEB Concesionaria	https://survias.cl

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

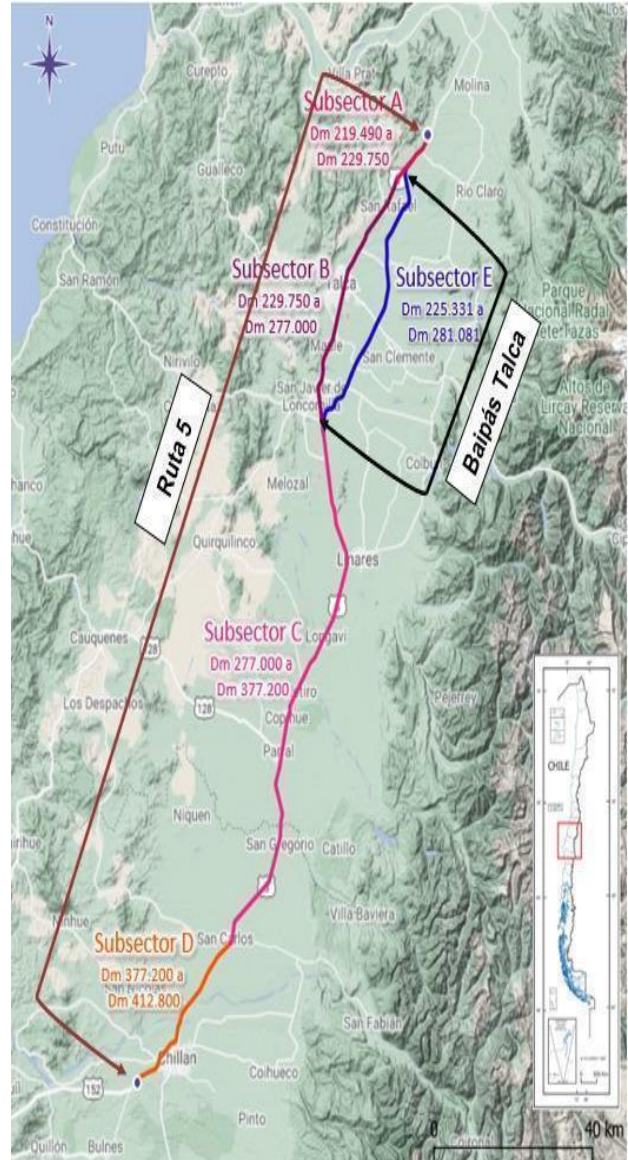

La Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán incluye la ejecución, conservación y explotación de una autopista de doble calzada, que se extiende entre Km 219.490 y 412.800, con una longitud de 193.310 km. abarcando las regiones del Maule y de Ñuble. Se proyecta la construcción del baipás Talca con una longitud de 55,8 km.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán recorre las comunas de Río Claro, San Rafael, Pelarco, Talca y Maule, en la Provincia de Talca; de San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas, Linares, Longaví, Retiro y Parral, en la Provincia de Linares, en la Región del Maule. En tanto, en la Región de Ñuble considera las comunas de Ñiquén, San Carlos y San Nicolás, en la Provincia de Punilla; y de Chillán y Chillán Viejo, en la Provincia de Diguillín.

La obra considera la implementación paulatina de un sistema Free Flow, lo que permitirá a los usuarios ahorrar tiempos de desplazamiento.

El contrato también incluye la operación y conservación rutinaria, periódica y mayor de los kilómetros 219.5 al 412.8 de la Ruta 5, durante toda su vigencia, a excepción del subsector B (San Rafael - San Javier) que considera su

mantenimiento hasta el mes 120 desde la fecha de Publicación del contrato o hasta la PSP de la Totalidad de las Obras o Fase 3, quedando este tramo excluido desde esa fecha del Contrato de Concesión En proyectos de infraestructura vial sectorizado, considera lo siguiente:

Sector	Sub sector	Descripción	Dm inicio – Dm fin aproximadamente	Longitud (km)
1	A	<u>Inicio Concesión.</u> Camarico - San Rafael.	219.490 – 229.750	10.26
	B	San Rafael - San Javier.	229.750 – 277.000	47.25
	C	San Javier - San Carlos	277.000 – 377.200	100.2
	D	San Carlos – Chillán Viejo. <u>Fin Concesión.</u>	377.200 – 412.800	35.6
2	E	Baipás Talca	225.400 – 281.200	55.8



Nuevo puente sobre el Río Maule de 1,5 km de extensión

Animación 3D de Futuro Puente Maule en el Baipás de Talca.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que abarca la concesión se resumen como sigue:

a) Troncal Ruta 5: Obras de Rehabilitación

- Rectificación de curvas y pendientes para una velocidad de 120 km/h con restricciones puntuales.
- Rehabilitación de Pavimentos.
- Actualización de la señalización, demarcación y sistema de contención de acuerdo con la normativa vigente, incluyendo señalización variable.
- Rehabilitación de 9 enlaces, 9 atravesos y 12 puentes preexistentes.
- Rehabilitación de 44 pasarelas con sus respectivos paraderos (accesibilidad universal y adecuación a terceras pistas).
- Ampliación y remodelación de 3 Áreas de Servicios Generales y Atención de Emergencias preexistentes.
- Rehabilitación y obras nuevas de saneamiento.
- Ampliación de bermas y sobreebanchos de plataforma.
- Ensanche de Áreas de Detención para Teléfonos de emergencia tipo (SOS).

b) Troncal Ruta 5. Nuevas Obras

- Treinta (30) km de ampliación a terceras pistas (Tramos comprendidos entre los Dm 377.200-401.000 y 407.000-412.800).
- Doce (12) enlaces, 3 atravesos y 2 retornos.
- Treinta y nueve (39) km de calles de servicio.

- Mejoramiento de treinta y seis (36) km de calles de servicio preexistentes.
- Treinta y dos (32) pasarelas peatonales con sus respectivos paraderos.
- Diez y nueve (19) puentes.
- Obras de paisajismo.
- Treinta y nueve (39) km de ciclovías aproximadamente.
- 13 zonas de cobros que incluyen pagos mediante sistema de telepeaje.
- Construcción de tres (3) Áreas Servicios Generales y Atención de Emergencias donde dos (2) solo para transportistas y cargas peligrosas.
- Construcción Plaza de Pesaje fija con dos estaciones que permita controlar los pesos máximos y dimensiones de los vehículos en ambos sentidos del tránsito de la Ruta 5.

c) Baipás Talca (Norte km 225.4 y Sur km 281.2 - Ruta 5)

Esta obra contempla el desarrollo de una autopista de doble calzada de aproximadamente 55.8 km de longitud para una velocidad de diseño de 120 km/h., con las siguientes obras:

- Ocho puentes. Incluye un nuevo puente sobre el Río Maule de 1.300 m de longitud aproximada.
- Trece enlaces, todos con solución peatonal y paraderos.
- Seis atravesos desnivelados.
- Una pasarela peatonal con su respectivo paradero.
- Cinco kilómetros de calles de servicio.
- Nueva área de Control Policial, obras de seguridad, iluminación, paisajismo, calles de servicio y una nueva Área de Servicios Generales y de Atención de Emergencias.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Esta obra tiene por objetivo mejorar los niveles de servicios de la infraestructura, atendido los cambios que se han generado en el territorio y el sistema de actividades que lo componen. Estas obras beneficiarán a las comunidades de San Rafael, Pelarco, Talca, Maule, San Javier y Villa Alegre, y entre sus principales beneficios podemos indicar:

- Genera capacidad vial en atención a los niveles de tránsito que presenta este sector.
- Permite minimizar las fricciones entre la ruta 5 y las dinámicas propias de la zona urbana de Talca.
- Mejora las actuales condiciones de servicio y seguridad de tránsito.
- Permitirá que el trazado actual pase a servir principalmente los flujos locales, mitigando así el impacto que los camiones y flujos de larga distancia generan sobre la población del entorno de la vía actual. Es decir, permitirá descongestionar la ruta 5 actual de las comunas de San Rafael, Talca, Maule y San Javier.
- Permite generar una red estratégica más robusta en casos de emergencias particularmente con la construcción de un nuevo puente sobre el río Maule, dando mayor resiliencia a la red. Es decir, aumenta la infraestructura crítica y la capacidad de la vía de contener, responder, rehabilitar y afrontar condiciones desfavorables como catástrofes naturales que pudiesen producir, por ejemplo, suspensiones temporales de la operación.
- Permitirá la evacuación del tránsito de camiones pesados de paso internacional Pehuenche a través de Ruta 5.
- Disminuirá tiempos de viajes. Si bien la longitud del baipás es superior el tiempo de viaje es menor debido a que el baipás permitirá circular a una mayor velocidad.
- Mejora de la conectividad y del concepto de ruta 5 como eje estructurante del territorio nacional.
- Con esta nueva concesión, se proyecta generar una red de transporte segura y resiliente, que mejorará la conectividad y desarrollo del país.

6. TARIFAS

Junto con lo anterior, la nueva concesión presentó conforme a las BALI, el cuadro tarifario para el año 2025, donde los valores vigentes a partir del 01 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

CAT.	TIPO VEHICULO	TRONCAL (\$)		LATERAL (\$)	
		2024	2025	2024	2025
1	Motos, cuatrimotos y motonetas	900	900	200	200
2	Autos y camionetas	3.000	3.100	700	800
3	Autos con remolque y camionetas con remolque	4.500	4.700	1.100	1.200
4	Buses de dos ejes y casas rodantes	5.300	5.600	1.300	1.400
5	Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción de dos ejes	5.300	5.600	1.300	1.400
6	Buses de más de dos ejes	9.500	10.000	2.400	2.500
7	Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola de más de dos ejes, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobredimensión	9.500	10.000	2.400	2.500

Además, se encuentra operativo el PID Sistema de Cobro a implementar en Fase (1), desde mediados de septiembre 2022, manteniéndose hasta el mes 79 o a partir de la primera "Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las Obras del Sector 1".

Con el inicio de la concesión comienza el desarrollo de la Ingeniería Definitiva, lo que debiera permitir iniciar las obras de construcción, conforme a lo programado, salvo interferencias no previstas a la fecha.

7. SUBSIDIOS

A la fecha, no hay subsidios de las obras.

8. INICIO DE OBRA

A la fecha, no hay inicio de construcción de las obras.

9. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA

De acuerdo con lo establecido en el Art. 1.9.1.2 de las BALI, el Concesionario deberá realizar los Proyectos de Ingeniería de Detalle de todas las obras que conforman el Contrato de Concesión de acuerdo con lo señalado en Art. 1.9.1.1 y ajustados a lo señalado en Art. 2.2, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación.

A través de la Resolución N°1692 DGC de 10.06.2022, donde autoriza aumento de plazo máximos de entrega de los Proyectos de Ingeniería de Detalle, de acuerdo con el siguiente detalle:

Plazos máximos de entrega de los Proyectos de Ingeniería de Detalle

Sector	Subsector	Plazo Máximo de entrega del Proyecto Vial (meses)	Plazo Máximo de entrega de otros Proyectos (meses)
1	A y C	14	18
	B y D	17	19
2 (*)	E	19	21

Notas: (*) Baipás Talca.

(**)

Los plazos indicados en la tabla anterior se contabilizan a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial del DS MOP N°05 que adjudica el Contrato de Concesión.

En el mes de enero se reporta un avance de la ejecución del PID, de un 89% (valor promedio).

10.- AVANCE PARCIAL DE LA OBRA

Avance PID de la Obra (%)				
Mes-Año	Sub-Sector A-C	Versión	Mensual	Acumulado
Ene-26	Proyecto Vial	CERO	0	94,8%
	Otros Proyectos	AC	4,38 %	89,6%
Mes-Año	Sub-Sector B-D			
Ene-26	Proyecto Vial	CERO	0	98,7%
	Otros Proyectos	AA	2,81 %	86,9%
Mes-Año	Sub-Sector E			
Ene-26	Proyecto Vial	CERO	0	94,0%
	Otros Proyectos	AA1	13,15%	69,7%

Ver Notas 1 y 2, señaladas tabla Avance Acumulado

Nota3: se ajustan % de avance

11.- MANO DE OBRA

El monto indicado corresponderá al total de la Mano de Obra, conforme a la siguiente segregación:

Total	Mes enero 2026
Mano de Obra Ingeniería	39
Mano de Obra Construcción	13
Mano de Obra Operación	500
Empleos Indirectos	55

12.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografías e imágenes del periodo informado corresponden al mes de enero del 2026.



Sector 1 - Subsector A
Dm 220.400 – Peaje



Dm 281,800 – Toma Posesión Material S1SSC Lote 29



Dm 328,280 - Panorámica Pistas, Pasarela Retiro.



Dm 322.400 – Vegetación, lado poniente.



Dm 322.400 –Vegetación, lado poniente



Dm 391,972 – Panorámica Peaje Lateral Cocharcas.



Dm 374,899 - Panorámica Pistas, Enlace Cape.



Dm 396,500 – Panorámica Peaje Lateral Chillán Norte.



Dm 410,739 – Panorámica Vista Sur Pasarela Los Colihues.

13.- INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones).

El flujo vehicular mensual fue de **3.397.927** vehículos distribuidos en las 7 categorías existentes.

De este flujo el **81.9%** corresponde a vehículos livianos, y el **18.1%** restante a vehículos pesados.

El flujo aumentó un **8,2%** respecto del mes anterior, y aumentó un **1,1%** comparado con el mismo mes del año anterior.

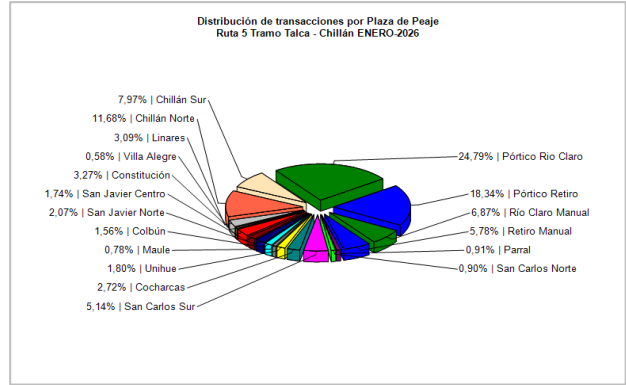


Gráfico 3: Distribución de Flujos de abril, por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte 29

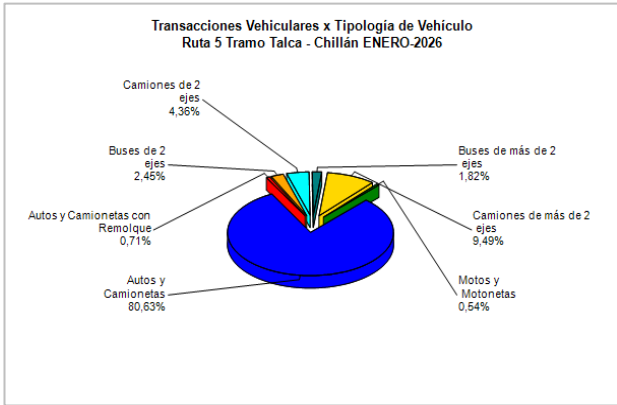


Gráfico 2: Distribución de Flujos por categoría de vehículo
Fuente: Reporte 29 SICE

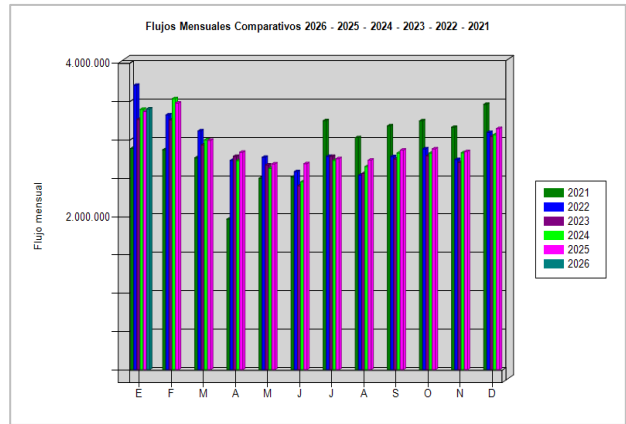


Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2020 – 2025
Fuente: Reporte 28 SICE

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2021	2.883.476	2.864.864	2.760.919	1.961.220	2.494.099	2.508.206	3.243.638	3.022.835	3.176.729	3.241.178	3.158.662	3.456.997
2022	3.706.636	3.319.554	3.110.901	2.726.186	2.767.212	2.580.385	2.778.800	2.533.177	2.776.976	2.878.172	2.737.350	3.090.849
2023	3.262.360	3.252.576	2.928.576	2.779.481	2.667.789	2.395.395	2.778.914	2.556.203	2.742.684	2.784.890	2.701.118	3.037.161
2024	3.392.479	3.531.632	2.994.735	2.724.446	2.621.292	2.447.723	2.726.317	2.645.533	2.823.196	2.822.201	2.826.048	3.061.816
2025	3.361.524	3.474.741	2.988.322	2.832.818	2.681.550	2.684.220	2.749.717	2.729.474	2.860.024	2.877.603	2.842.556	3.141.666
2026	3.397.927											

Fuente: Reporte 30 SICE

17.- INFORMACIÓN DE INGRESOS Comparativa años 2021 – 2025.

El ingreso mensual registró un aumento del **13,88%** respecto del mes anterior y un aumento de un **4,06%** respecto del mismo mes del año anterior.

Año/Mes	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ene.		\$ 8.079.061.400	\$ 7.498.780.900	\$ 8.851.886.400	\$ 9.572.958.700	\$ 9.961.703.900
Feb.		\$ 7.208.714.000	\$ 7.566.550.600	\$ 9.251.182.800	\$ 9.855.413.900	
Mar.		\$ 7.216.008.300	\$ 6.718.967.000	\$ 7.620.324.300	\$ 8.505.118.000	
Abr.	\$ 4.819.635.500	\$ 6.043.948.000	\$ 6.481.027.400	\$ 7.216.077.400	\$ 8.087.427.350	
May.	\$ 5.491.353.800	\$ 6.172.627.600	\$ 6.109.884.200	\$ 6.739.094.900	\$ 7.415.086.800	
Jun.	\$ 5.488.315.700	\$ 5.734.840.800	\$ 5.414.240.500	\$ 6.298.698.200	\$ 7.392.056.100	
Jul.	\$ 6.878.009.900	\$ 5.994.407.100	\$ 6.666.867.600	\$ 7.182.566.300	\$ 7.613.438.800	
Ago.	\$ 6.472.956.700	\$ 5.361.640.800	\$ 6.170.829.700	\$ 6.874.915.600	\$ 7.414.173.900	
Sep.	\$ 6.604.359.400	\$ 5.962.048.900	\$ 6.568.641.300	\$ 7.315.529.300	\$ 7.779.645.800	
Oct.	\$ 6.668.999.500	\$ 6.174.797.200	\$ 6.669.642.700	\$ 7.410.697.400	\$ 7.907.959.900	
Nov.	\$ 6.658.049.300	\$ 6.034.155.600	\$ 6.499.753.100	\$ 7.439.041.700	\$ 7.815.596.300	
Dic.	\$ 7.244.421.700	\$ 6.753.724.700	\$ 7.294.015.000	\$ 8.138.553.000	\$ 8.747.342.300	
Total	\$ 56.326.101.500	\$ 76.735.974.400	\$ 79.659.200.000	\$ 90.338.567.300	\$ 98.106.217.850	\$ 9.961.703.900

(Considera sólo ingresos en plazas de peajes). ingresos en plazas de peajes).

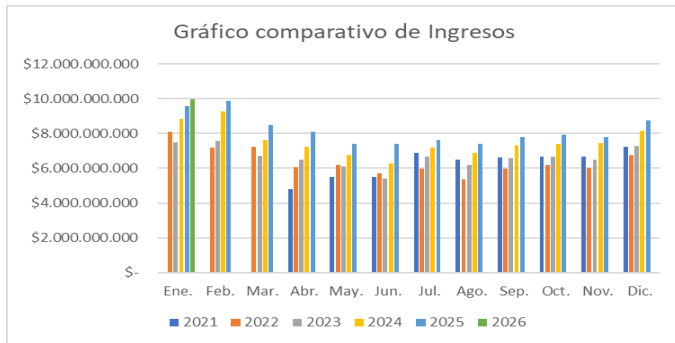


Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales
Fuente: SICE

El ingreso mensual fue de **\$ 9.961.703.900**, equivalentes a **UF 250.886,17** al 31 de enero de 2025.

El mayor aporte a dichos ingresos los hizo la Plaza de Peaje del troncal Pórtico Río Claro con **MM\$ 3.986 (40,02%)**.

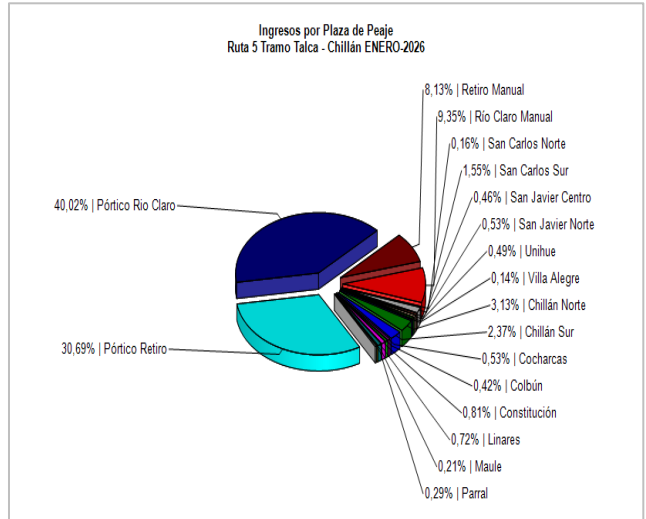


Gráfico 5: Distribución de Ingresos para el mes de marzo por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte 32 SICE

18.- ACCIDENTABILIDAD

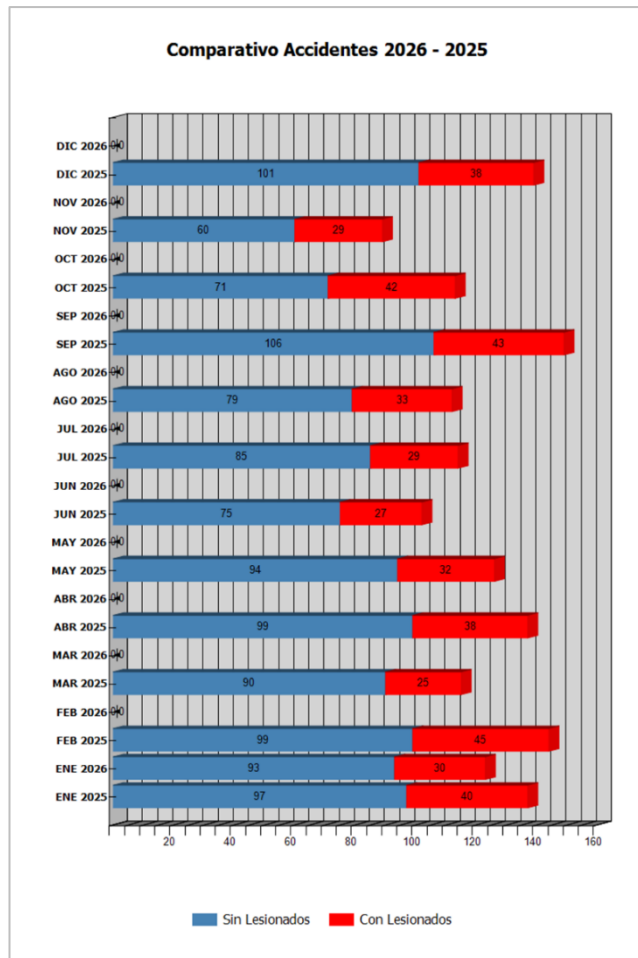


Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2024 - 2025, accidentes con lesionados (-) y sin Lesionados (-)
Fuente: Reporte 33 SICE

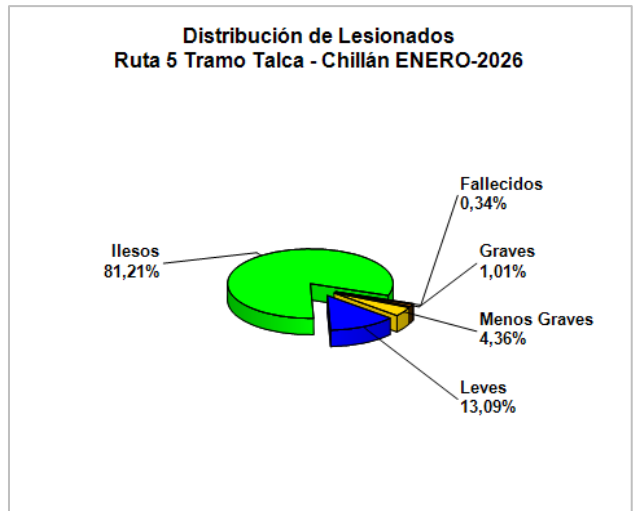


Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados y Fallecidos. No considera personas sin información de Consecuencia.
Fuente: Reporte 34 SICE

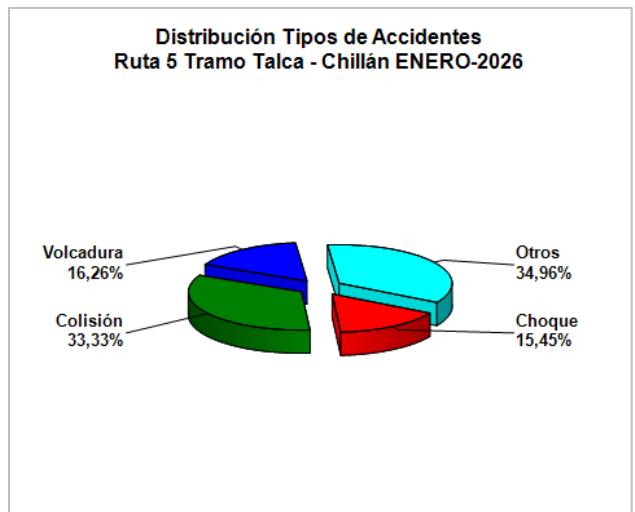


Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes
Fuente: Reporte 34 SICE

Respecto del **origen** de los **123 accidentes** ocurridos durante el mes de **enero** del 2026, el **82,11%** de ellos es atribuido a posible **"Falla humana"**; con un **4,07%** **"Falla mecánica"** y con un **13,82%** **"Animal u obstáculo en la vía"**

De las **319 personas** que se vieron involucradas en los **123 accidentes** registrados durante el mes y **que se conoce su consecuencia (298 personas)**, un **81,21%** resultó **ileso**, un **13,09%** con lesiones **leves**, un **4,36%** resultó con lesiones **menos graves**, un **1,01%** resultó con lesiones **graves**. Este mes se registró **1 víctima fatal (0,34%)**.

Año 2025	ENE 2025	FEB 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAY 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SEP 2025	OCT 2025	NOV 2025	DIC 2025
Con Lesionados	40	45	25	38	32	27	29	33	43	42	29	38
Sin Lesionados	97	99	90	99	94	75	85	79	106	71	60	101
Total Accidentes	137	144	115	137	126	102	114	112	149	113	89	139

Fuente: Reporte 33 SICE

Año 2026	ENE 2026	FEB 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAY 2026	JUN 2026	JUL 2026	AGO 2026	SEP 2026	OCT 2026	NOV 2026	DIC 2026
Con Lesionados	30											
Sin Lesionados	97											
Total Accidentes	123											

Fuente: Reporte 33 SICE

Accidentes Acumulados Anuales (últimos 5 años)

Años	Accidentes		Víctimas				Total Lesionados	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves		Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2021	1011	386	52	42	49	530	673	24	4	98	189	62	1	8
2022	1311	451	31	65	110	529	735	23	11	111	211	87	1	7
2023	1202	384	42	54	134	462	692	19	4	106	153	96	0	6
2024	1283	375	39	56	127	423	645	25	4	68	177	93	0	8
2025	1477	421	25	70	161	484	740	21	0	72	209	72	0	47
2026	123	30	1	3	13	39	56	0	0	8	11	2	0	9

Fuente: Reporte 35 SICE

19.- RECLAMOS DE USUARIOS

SERVICIOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Calidad de Servicio	4												4
Comercial	3.871												3.871
Disponibilidad de información	0												0
Estado de las Instalaciones e Infraestructura	173												173
Factores de Accidentalidad	917												917
Solicitudes de Información	9												9
Total	3.904												3.904

Gráfico 9: Tabla con reclamos del año en curso.

Fuente: AITE

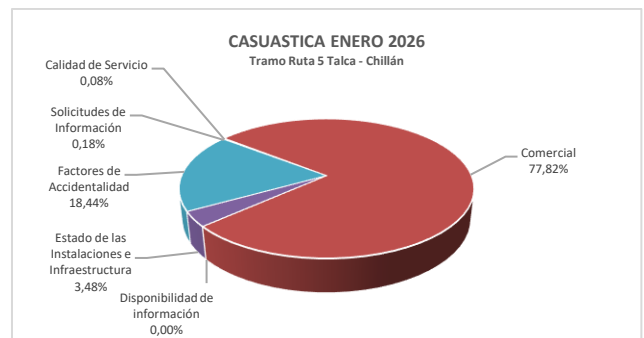


Gráfico 10: Distribución de reclamos por Área Temática

Fuente: AITE

Los reclamos de usuarios se clasifican en 5 grandes grupos. Para el mes informado, los reclamos se concentran principalmente en tema referente a **Factores Comerciales (consulta por facturación y TAG)**.

20.- ASISTENCIA A USUARIO

Mes	TIPO Y N° DE ATENCIONES									Total Asistencias
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Enero	679	557	41	4	20	798	7	1	139	2.246
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total	679	557	41	4	20	798	7	1	139	2.246

Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas

Fuente: Sociedad Concesionaria Survias Maule - Nuble S.A.

- 1: Reparación del vehículo in situ
- 2: Remolque del vehículo en panne
- 3: Panne por falta combustible del vehículo
- 4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
- 5: Primeros auxilios
- 6: Auxilio
- 7: Traslado de usuario a centro asistencial
- 8: Instalación de señalización preventiva
- 9: Otros

CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO TALCA CHILLÁN **ENERO 2026**

Durante el mes de enero del 2026 se generaron **1.542 solicitudes** de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: **citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros**. Además, se realizaron **2.246 asistencias** por parte de la Sociedad Concesionaria (para una solicitud puede ser necesario proporcionar más de un servicio o asistencia a la vez).

Los principales requerimientos para el mes informado fueron: **“Auxilios en accidentes”** con un **35,53%**; le sigue **“Reparación de vehículo in situ”** con un **30,23%**; **“Remolque del vehículo en Panne”** con un **24,80%**; **“Otros”** con un **6,19%**; **“Panne por falta combustible del vehículo”** con un **1,83%**; **“Primeros Auxilios”** con un **0,89%**; **“Traslado de usuario a centro asistencial”** con un **0,31%**; **“Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio”** con un **0,18%** e **“Instalación de señalización preventiva”** con un **0,04%**.

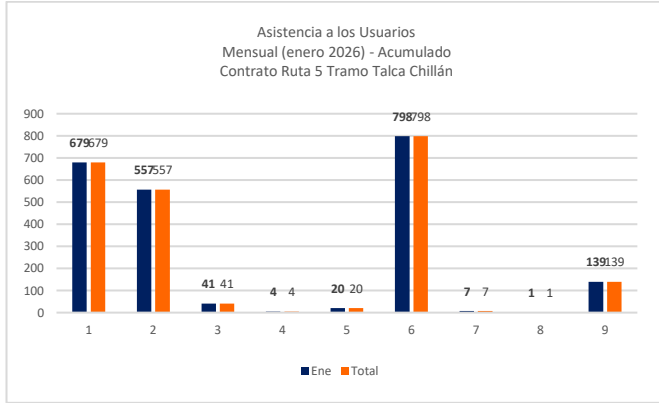


Gráfico 12: Distribución porcentual de las Asistencias
 Fuente: AITE

21.- HECHOS RELEVANTES

En relación con el período correspondiente al mes de enero, se informa que no se han producido acontecimientos de relevancia que ameriten ser reportados.

22.- REUNIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

En cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana, se informa que durante el mes de Enero de 2026 no se realizaron reuniones de este ítem.
