

CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA

JULIO 2025

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique
Tipología del Contrato	Edificación Pública
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del Proyecto	Región de Tarapacá. Provincia de Iquique Comuna de Iquique
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 1.595.658
Superficie del Proyecto	Superficie Ampliada: 10.601 m2 Superficie Remodelada: 10.072 m2
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena de Iquique S.A.
Accionistas del Concesionario	Aport Operaciones S.A. 0,1% Aport S.A. 99,9%
Decreto de Adjudicación	DS MOP N° 082 del 24.07.2017, publicado en el Diario Oficial el 12.10.17
Plazo de la Concesión	300 meses a partir del inicio del plazo de concesión o 25 años, con un mínimo de 8 años. VPI ≥ ITC (UF1.199.870)
Valor ITC (Ingresos Totales Concesión)	UF 1.199.870
Inicio de Ejecución de las Obras	Con fecha 09.08.2019, mediante ORD. IF IQQ N°920/2019, se autoriza solicitud de inicio de la obra.
Solicitud Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	Según lo establecido en la Resolución Exenta N°013 de 03 de febrero de 2025, el plazo máximo que tendrá la Sociedad Concesionaria para Solicitar la PSD el día 26 de agosto de 2025
Plazo Máximo de la Concesión	11.10.2042.
Inspector Fiscal Titular	Fernanda Ardiles García (DGC) Res E DGC N°3978 del 25.11.2024
Inspector Fiscal Suplente	María Ignacia Cabrera (DGC) Res E DGC N°265 del 23.01.2025
Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación	Axioma Ingenieros Consultores S.A., Resolución DGC N°036 (18.06.2025).
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	(RCA) es RES Exenta N°0036 del 20.05.2019 por parte del SEA

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

Las instalaciones del Aeropuerto Internacional Diego Aracena, se encuentra ubicado a 41 kilómetros al suroeste de la ciudad de Iquique, por la ruta A-1, lo que equivale a un viaje de 40 minutos aproximadamente, su referencia geográfica es de 20° 32' 6" de latitud Sur y 70° 10'30" de longitud oeste; su elevación sobre el nivel del Mar es de 47,85 metros, ubicado en la Comuna de Iquique, Región de Tarapacá.



3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las obras que forman parte del nuevo contrato de concesión del Aeropuerto Diego Aracena consiste entre otras, en la ampliación y mejoramiento del EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS, lo que incluye la provisión e instalación de dos nuevos puentes de embarque, esto con el fin de entregar un mejor servicio y comodidad tanto al actual, como al previsto crecimiento del flujo de pasajeros (845.558 PAX/año 2024), además de contribuir al desarrollo de la ciudad en el ámbito comercial y turístico, ya que Iquique cuenta con una ubicación estratégica en Sudamérica para el embarque y desembarque de productos; y es un importante destino turístico.

El objeto de esta nueva concesión consiste principalmente en:

- La ampliación y mejoramiento del Edificio Terminal de Pasajeros.
- El mantenimiento de todas las obras preexistentes y nuevas que debe ejecutar el concesionario dentro del Área de Concesión.
- La Explotación, operación y administración de las obras dentro del Área de Concesión.
- La prestación y explotación de una serie de servicios a los usuarios del Aeropuerto.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que desarrolla el proyecto son las que se indican a continuación:

- **Ampliación y Mejoramiento del Edificio Terminal de Pasajeros:** Considera la ampliación hacia el norte y oriente. Incluye la provisión e instalación de 2 nuevos puentes de embarque.
- **Construcción de Instalaciones Aeronáuticas:** Dentro de estas obras se considera, por ejemplo: Nuevo Edificio Cuartel SSEI y Plataforma Carro SSEI, Nuevo Casino y Auditorio DGAC, nueva subestación eléctrica DGAC, Ampliación Edificio Logístico DGAC, Nuevo Edificio SAR, entre otros.
- **Ampliación de la Plataforma Comercial:** considera la ampliación de la plataforma de estacionamientos de aeronaves hacia al norte y hacia el sur más la ampliación del camino aeronáutico.
- **Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas:** esta planta tratará todos los efluentes provenientes de todas las edificaciones del aeropuerto
- **Remodelación y ampliación de vías de acceso y circulación vehicular del Aeropuerto.**

CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA

JULIO 2025



Edificio	Proyección
Terminal de Pasajeros	20.813 m ²
Estacionamiento Vehiculares	614 un
Superficie Área de Movimiento de Aeronaves	57.600 m ²
Puentes de Embarque de Pasajeros	6
N° Estacionamiento Aeronaves Comerciales	8
N° Counters	30

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

La modernización del Aeropuerto Diego Aracena tiene como finalidad entregar un mejor servicio y comodidad al creciente flujo de pasajeros, además de contribuir al desarrollo de la ciudad en el ámbito comercial y turístico, ya que Iquique cuenta con ubicación estratégica en Sudamérica para el embarque y desembarque de productos; y es un importante/ destino turístico. A modo de ejemplo se presentan las siguientes estadísticas:

- En el año 2024 se procesó un total de 845.558 pasajeros embarcados (PAX).
- Durante Abril de 2025 se embarcaron 62.070 pasajeros, totalizando un acumulado anual de 297.640 PAX el 2025.

En base a lo anteriormente expuesto, los principales beneficios de este proyecto están orientados a:

- Mayor capacidad de procesamiento de pasajeros embarcados.
- Mayor eficacia en el control migratorio de personas, control de mercancías (incluyendo sustancias ilícitas).
- Asegurar la mantención y conservación tanto de la nueva infraestructura, como de la preexistente.
- Mejorar la imagen país para los turistas que ingresan a Chile por este Aeropuerto.
- Contar con nuevos y mejores servicios para los usuarios, tales como, Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida, Zona de Entretenimiento, Conexión Inalámbrica a Internet, mayor cantidad de estacionamiento a público general, entre otros.

5.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS

Población de la Región de Tarapacá, en total 324.930 personas según último CENSO 2017.

6. TARIFAS

- Tarifa por Pasajero Embarcados: Art. 1.14.1.1 de BALI

	Tarifa Anterior	Tarifa Vigente
Valor Tarifa	\$9.810	\$10.001
Resolución Reajuste	Resol. DGC N°441/2025	Resol. DGC N°2744/2025
Período Vigencia	10/01/2025 – 10/07/2025	10/07/2025 – 09/01/2026

- Servicios Aeronáuticos: Art. 1.10.9.1 de BALI

ITEM	Servicio Aeronáuticos	Tarifa Máxima según BALI	Tarifa del Servicio
a.	Sistema de embarque / desembarque nacional	UF 0,25 primeros 45 minutos o fracción UF 0,5 cada media hora adicional o fracción	UF 0,25 primeros 45 minutos o fracción UF 0,5 cada media hora adicional o fracción
b.	Sistema de embarque / desembarque internacional	UF 1,2 primeros 60 minutos o fracción UF 0,6 cada media hora adicional o fracción	UF 1,2 primeros 60 minutos o fracción UF 0,6 cada media hora adicional o fracción
c.	Energía, agua potable, aire acondicionado Aeronaves	UF 0,25 cada 30 minutos o fracción	UF 0,25 cada 30 minutos o fracción
d.	Manejo de equipaje	no indica	sin costo para el usuario

7. SUBSIDIOS

No aplica

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

La medición de avance de ejecución del PID se determina mediante el procedimiento detallado en el Memorandum N°0205 del jefe de División de Construcción, de fecha 30 de septiembre de 2021, donde se desprende lo siguiente:

Avance de Ejecución del PID (%):	100
Avance de Aprobación del PID (%):	100

9. INICIO DE OBRA

El inicio de la obra fue autorizado a través del ORD.IF IQQ N°920/2019, según lo establecido en las Bases de Licitación Art. N°1.7.7 y Art. N°1.9.3.

Esta autorización fue realizada el día 09.08.2019, destacando ciertos alcances que debían estar subsanados en los plazos y condiciones que se definirán a través de los mecanismos contractuales aplicables.

BALI	Estimado	Autorizado	Doc. de autorización Fecha y N° (Libro de obra, oficio)	Tramos
Art. 1.9.3		09.08.2019	ORD.IF.IQQ N°920/2019	

10.- AVANCE DE LA OBRA

El 14 de junio de 2019, mediante Oficio Ord. N°789, la Inspección Fiscal autorizó el inicio de la partida denominada Obras Preliminares, comenzando la construcción de la Instalación de Faenas, despeje de terreno y otros.

Las principales actividades en terreno ejecutadas durante el mes de marzo de 2025 corresponden a actividades de levantamiento de observaciones correspondientes al Acta de la Comisión de autorización de la totalidad de las Obras o PSP2.

El avance físico mensual acumulado de la obra es el siguiente:

Avance físico acumulado al 30.09.2024: 96,43%.

Avance físico parcial mensual a Marzo de 2025: 0,00%.

Avance para PSP2 100% (Trabajos de levantamiento de Observaciones PSP2 en ejecución)

11.- MANO DE OBRA

Total	Marzo
Mano de Obra Ingeniería	0
Mano de Obra Construcción	0
Mano de Obra Operación	99
Empleos Indirectos	450

12.- HECHOS RELEVANTES


Sin hechos relevantes durante el periodo.

13.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA


A continuación, se presentan algunos registros fotográficos de Mantenciones realizadas durante el mes de Julio 2025.



A.1 Muros: Pintura de muros interiores salas de arribo, reparación de revestimientos en muros dañados.

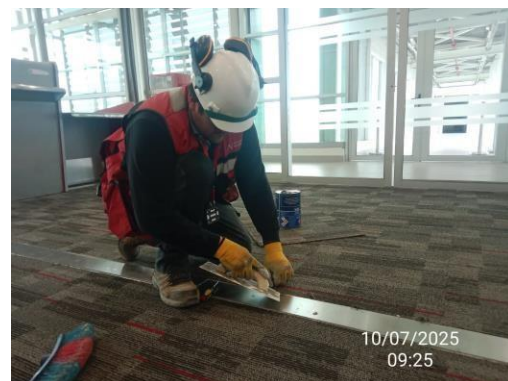

A.5 PISOS: Revisión y/o conservación de alfombras en salas de embarque

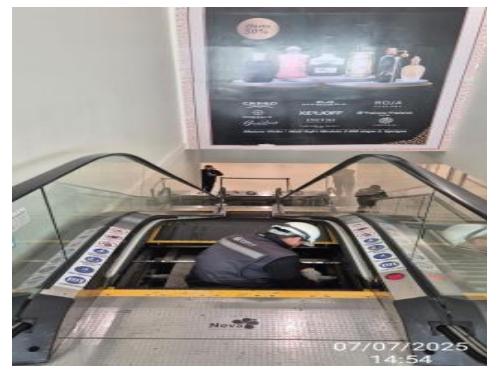

B.2 Escaleras mecánicas: Revisión y/o ajustes de tracción, contrapeso, tablero eléctrico, interior de cabina y motores, empresa certificada

CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA

JULIO 2025

14.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN

La Etapa de Explotación comenzó junto con la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1 (abril 2018) y se extenderá hasta el término de la concesión.

El servicio de explotación del aeropuerto otorga a la Sociedad Concesionaria la posibilidad de percibir ingresos, exclusivamente por:

- Pasajeros embarcados estipulado en Bases de Licitación, numeral 1.14.1.
- Prestación de servicios aeronáuticos y no aeronáuticos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 1.10.9


14.1.- INFORMACIÓN DE PASAJEROS EMBARCADOS (PAX)

En el mes de JULIO 2025, se embarcaron un total de 72.513 pasajeros en Aeropuerto Diego Aracena, totalizando 493.393 pasajeros embarcados en lo que va del año 2025.

La siguiente tabla presenta un resumen de datos del año en curso y la comparación con los últimos 2 años:

Mes/Año	2023	2024	2025	Var. % año anterior	Var. % ± 12 meses
Enero	82.072	88.870	82.997	-6,61%	-7,71%
Febrero	72.928	82.731	81.476	-1,52%	-8,83%
Marzo	80.820	66.303	71.097	7,23%	-6,84%
Abril	71.538	63.079	62.070	-1,60%	-6,07%
Mayo	76.661	63.980	64.167	0,29%	-4,70%
Junio	71.397	55.675	59.073	6,10%	-2,58%
Julio	85.919	74.319	72.513	-2,43%	-1,48%
Agosto	76.815	64.467			-7,67%
Septiembre	73.652	70.958			-15,81%
Octubre	72.318	73.270			-24,60%
Noviembre	68.915	72.999			-33,58%
Diciembre	69.987	68.907			-41,65%
Total	903.022	845.558	493.393		

Se confecciona gráfico de línea del comportamiento mensual de los pasajeros embarcados de la tabla anterior

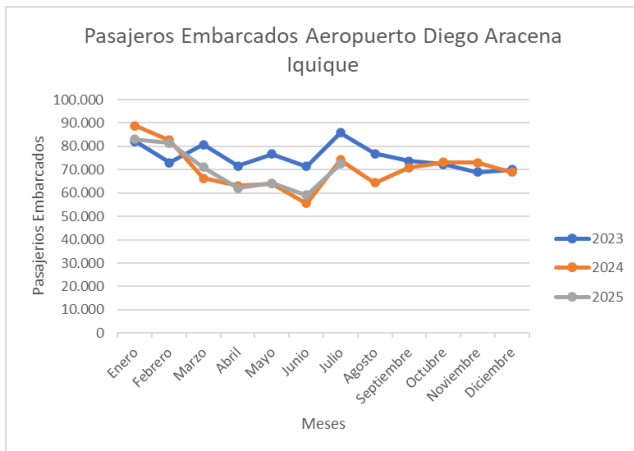

14.2.- INFORMACIÓN DE INGRESOS.

En el mes de JULIO 2025 los ingresos de Pasajeros embarcados UF 6.518,84. Respecto de los Ingresos Comerciales el dato disponible

indica que estos alcanzan a UF 34.176, a ABRIL 2025, lo que genera un total de ingresos de UF 78.283,21 sin considerar los ingresos comerciales de MAYO a JULIO.

Se presenta la información de ingresos mensuales en la siguiente tabla:

Valor UF	Mes	Ingresos PAX Embarcados			Ingresos Comerciales		Ingresos Totales (UF)
		Total (\$)	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	Total año 2025
38.384,41	Enero	286.841.159	7.472,86	47,17%	8.369,68	52,83%	15.842,54
38.647,94	Febrero	283.129.100	7.325,85	47,88%	7.974,60	52,12%	15.300,45
38.894,11	Marzo	247.062.075	6.352,17	41,00%	9.141,40	59,00%	15.493,57
39.075,41	Abril	215.693.250	5.519,92	38,84%	8.690,32	61,16%	14.210,24
39.189,45	Mayo	222.980.325	5.689,80				5.689,80
39.267,07	Junio	205.278.675	5.227,76				5.227,76
39.179,01	Julio	255.401.827	6.518,84				6.518,84
Acum. 2025		1.716.386.411	44.107,21	56,34%	34.176,00	43,66%	78.283,21


Considerando lo señalado, los ingresos por PAX Embarcados representan un 56,34% de los ingresos totales y los Ingresos Comerciales el restante 43,66%.

A continuación, se presenta tabla con ingresos acumulados de año actual y los 2 años anteriores:

Año	Ingresos PAX Embarcados			Ingresos Comerciales Aeronáuticos		Ingresos Totales (UF)
	Total (\$)	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	Total (UF)	Part. % Ing. Total	Total, año
2023	2.913.961.229	80.896	46%	95.328	54%	176.224
2024	2.841.385.326	75.678	43%	101.634	57%	177.312
2025	1.716.386.411	44.107	56%	34.176	44%	78.283

14.3.- INFORMACIÓN DE RECLAMOS RECIBIDOS

MES	SC	Líneas Aéreas, Sub Concesionarios y Servicios Públicos
ago-24	0	2
sept-24	0	3
oct-24	3	0
nov-24	0	3
dic-24	0	3
ene-25	3	1
feb-25	3	2
mar-25	5	0
Abr-25	1	1
may-25	8	1
Jun-25	1	0
Jul-25	2	1
TOTAL AÑO	25	18

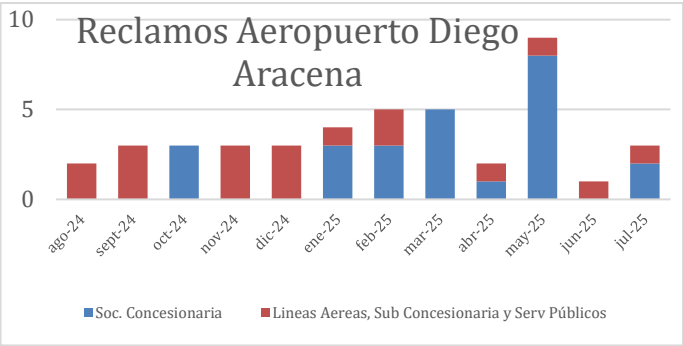

Los reclamos del mes de Julio tienen relación con:

- Estacionamientos (1)
- otros (2)

15.- NIVEL DE SERVICIOS EN EL AEROPUERTO

15.1.- Niveles de Servicio mes:

JULIO 2025			
Servicio	Descripción	Indicador	Mes Vigente
Servicios Aeronáuticos	Sistema de embarque y desembarque de pasajeros	SIC-NS 100%	100%
Servicios Aeronáuticos	Cinta transportadora de equipaje	SIC-NS 100%	100%
Servicios Aeronáuticos	Servicios en Plataforma	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Conservación	SE ENTREGA INFORME DE CUMPLIMIENTO PACO MIENTRAS SE SUBSANAN OBSERVACIONES DE PSP2 A PSD, SEGÚN INDICA MEDIANTE GO	100% (TODAS LAS TAREAS PROGRAMADAS FUERON EJECUTADAS)

		N°202/2025 = 80%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Aseo	Aseo rutinario / Servicios Higiénicos / Aseo aceras públicas > 80%	100%
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Mantenición Áreas Verdes (Paisajismo)	Paisajismo	100%
		> 80%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Gestión de Basura y Residuos	Retiro de Basuras	100%
		> 100%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Señalización	Señalética	100%
		> 80%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Transporte de Equipaje	Carros	100%
		U < 5 min	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Información a los Usuarios	FIDS/ Servicio Información al público/ PAS / Sitio Web	100%
		> 80%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento Aguas Servidas	CCMS	100%
		> 80%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Vigilancia	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		> 90%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	CCTV	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		100%	

CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA

JULIO 2025

Servicios no aeronáuticos no comerciales	Entretención	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		> 90%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Conexión Inalámbrica a Internet	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		100%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Enchufes para Carga de Dispositivos Electrónicos	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		100%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida	SIC-NS	99%
		>95%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Redes de Comunicaciones y Datos	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		100%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Gest. Infraestructura Asociada a Transporte Terrestre de Pasajeros	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		100%	
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Alimentación y Bebida	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		100%	
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Áreas para servicios de comunicaciones	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		100%	
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Counters y oficinas de Apoyo para Compañías Aéreas	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		100%	
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Estacionamientos públicos para Vehículos en General	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		100%	
Servicios no aeronáuticos	Áreas para Servicios	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%

comerciales obligatorios	Comerciales Ámbito Financiero	100%	
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Gestión del Terminal de Carga	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		100%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales Facultativos	Áreas para Locales Comerciales	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		100%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales Facultativos	Áreas para Publicidad y Propaganda	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		100%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales Facultativos	Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		>80%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales Facultativos	Estacionamiento para vehículos en arriendo	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		>80%	
Servicios no aeronáuticos no comerciales Facultativos	Oficina de uso general	PLANILLA ELECTRÓNICA	100%
		>80%	
