


1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del proyecto	Región de Coquimbo. Provincia Choapa, Limarí y Elqui. Comunas de Los Vilos, Canela, Ovalle, Coquimbo y La Serena.
Presupuesto Oficial	UF 12.155.000
Longitud del Proyecto	Tramo Urbano: 16 Kms. Tramo Interurbano: 229 Kms.
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Ruta del Elqui S.A.
Accionistas del Concesionario	Sacyr Concesiones Chile SpA. Accionistas del Concesionario (99%), Sacyr Chile S.A. (1%)
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N° 47 de 30 abril de 2019, publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2019
Plazo de la Concesión	Plazo Máximo 360 meses
Fecha llamada a licitación	12 Mayo 2018 Publicación D. Oficial
Valor ITC (Ingresos Totales de la Concesión)	UF 13.399.900
Inicio de ejecución de las Obras	Desde aprobación de los Proyectos (20 meses aprox.)
Puesta en Servicio Provisoriade las Obras	28 abril 2027 (90 meses)
Puesta en Servicio Definitivade las Obras	28 octubre 2027
Término de la concesión	Noviembre 2049
Inspector Fiscal Titular	Jaime Yáñez Urzúa Resol. DGC. N°4294 26/11/2025
Inspector Fiscal Suplente	Carlos Letelier Rodríguez Resol. DGC. N°4294 26/11/2025
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción y explotación	Axioma Ingenieros Consultores S.A. Resol. Adj. N°3107 28/09/2023
Modificaciones del Contrato	Decreto Supremo N°102 "Modificación Caract. de las obras"
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto.	Este proceso se inicia al término del Proyecto de Ingeniería
Subsidios	No Tiene
Página Web	https://rutadelelqui.sacyr.com

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se emplaza en la región de Coquimbo, y se divide en dos sectores, el primero corresponde al tramo interurbano, actualmente en operación con una longitud de 229 Km, pasando por las comunas de Los Vilos, Canela, Ovalle y Coquimbo. El segundo corresponde al sector urbano, con una extensión de 16 Km en las comunas de Coquimbo y La Serena.

2.1.- MAPA DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO

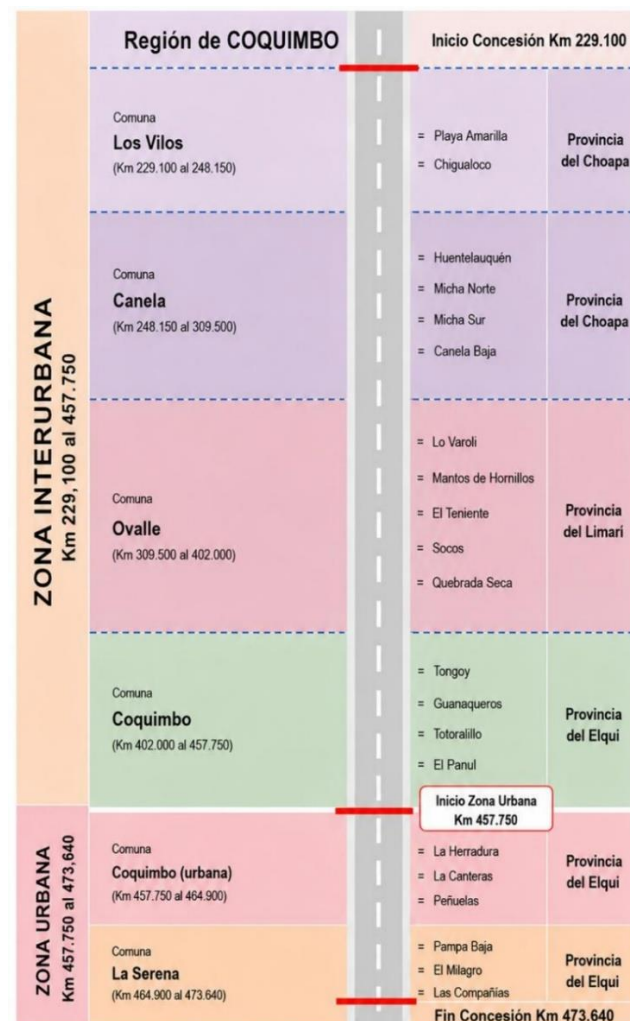

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El tramo interurbano comprende las obras para la rehabilitación y mejoramiento de la calzada preexistente, además de pavimentos nuevos por rectificación del trazado en planta y/o alzado, así como también obras de carpeta asfáltica. Se cambian algunos puentes tales como: Huentelauquen oriente, Limarí poniente, Quebrada Seca y Almendro oriente, se construyen 6 nuevas pasarelas y un enlace en El Panul de Coquimbo.

El proyecto original fue modificado en las obras del tramo urbano, de las cuales se mencionan a continuación, repavimentación de la doble calzada actual ruta 5, calle de servicio oriente, renovación de señalización y seguridad vial, pistas de transporte público, 1 pasarela, nueva intersección ruta 5 con avenida de Aguirre y extensión de calle libertad, acceso vial a puerto, 2 nuevos puentes y 2 nuevos pasos superiores.

La sectorización del proyecto según las Bases de Licitación es:

Sector	Subsector	Descripción	Dm Inicio aprox.	Dm Final aprox.	Longitud (km)
Interurbano	1	Inicio concesión (Los Vilos)	229,100	340.000	111
	2	Termino tramo interurbano	340.000	457,750	118
Urbano	1	Inicio tramo urbano (sector panul, Coquimbo)	457,750	468,600	10
	2	Termino Concesión (La Serena)	468,000	473,640	6

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Tramo interurbano:

- Rectificación de trazado en calzadas expresas, en cuatro sectores.
- 6 pasarelas peatonales (Micha Sur, Mincha Norte, Mantos de Hornillos, Salala Sur, Morrillos y Las Tacas).
- 4 puentes nuevos (Huentelauquen, Quebra Seca, El Almendro, El Limarí).
- 1 estructura a desnivel (Enlace Panorámica)
- 1 cajón nuevo de retorno (Playa Ñague).
- 3 cajones de reemplazo (Peñablanca, Chigualoco, Puerto Oscuro)
- Ampliación de Bermas a 2,5 metros
- Cierre en mediana sector pasarelas y enlaces
- Obras de seguridad vial (reemplazo de barreras y señales).
- Obras del sistema de iluminación.
- 2 miradores turísticos (Totoralillo y Canela).
- Tratamiento de taludes
- Plazas de peaje sistema TAG y Manual

Tramo Urbano:

Las principales obras que considera el proyecto en esta etapa, denominado "Obra Tempranas" son:

- Calle de servicio Oriente entre Av. El Sauce y la Av. de Aguirre en una longitud de 14 Kilómetros, con una sección que incluye Ciclovía y acera peatonal e iluminación.
- Renovación de señalización y seguridad vial en vía Expresa
- Pistas exclusivas de transporte público
- Extensión de calle Libertad entre Amunategui y Huanhuali, en la comuna de La Serena.
- Nueva Pasarela Pateonal Colegio Adventista
- Nueva intersección Ruta 5 con Avenida de Aguirre
- Acceso vial Puerto de Coquimbo
- Nuevo Puente El Culebrón
- Nuevo Puente FFCC La Garza
- Nuevo Paso Superior Peñuelas Sur
- Nuevo Paso Superior Los Perales

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto del Tramo Urbano tiene por objeto el mejoramiento de la Ruta 5 en la Conurbación Coquimbo - La Serena entregando un estándar acorde a las demandas de tránsito y niveles de servicios, considerando los siguientes objetivos:

- ✓ Mejoramiento de Seguridad Vial, tanto para vehículos y peatones, de modo de reducir los factores de riesgo de accidentes.
- ✓ Eficiencia, en términos de capacidad de la vía y características de la infraestructura para reducir los tiempos de traslado y los costos de operación de los usuarios entre la comuna de Coquimbo y La Serena.
- ✓ Comodidad, generando las condiciones para que los usuarios puedan satisfacer en forma efectiva sus necesidades de conectividad, mediante vías exclusivas de transporte público.
- ✓ Mejoramiento de Accesos al puerto y Centro de la ciudad de Coquimbo, además mejor conectividad con Ruta internacional CH41.

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

Los beneficiarios directos se estiman en 600.000 habitantes aproximadamente, pertenecientes a la conurbación de la región de Coquimbo.

6. TARIFAS, Art. Bali 1.14.6 y fecha de publicación 16/12/2026.

Tipo de Vehículo	Clase de Vehículo	Tarifa (\$) Troncales	Tarifa (\$) Laterales
1	Motos, cuatrimotos y motonetas	1.250	350
2	Autos y camionetas con o sin remolque, camionetas de doble rueda trasera	4.250	1.100
3	Buses de dos ejes y casas rodantes	7.600	2.000
4	Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria construcción de dos ejes.	7.600	2.000
5	Buses de más de dos ejes	13.550	3.500
6	Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobre dimensión.	13.550	3.500

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

A la fecha, se sigue en el proceso de revisión de los PID (peajes, ITS, iluminación). Conforme el procedimiento que establecen las bases de licitación en su Art. 1.9.1.2.

Avance de Ejecución del PID (%):	100%
Avance de Aprobación del PID (%):	96%

9.- MANO DE OBRA

Total	F	M	Total
Mano de Obra Ingeniería	0	10	10
Mano de Obra Construcción	26	710	736
Mano de Obra Operación	93	190	283
Empleos Indirectos	33	145	178
Total	152	1055	1207

8.- AVANCE DE LA OBRA

En cumplimiento al Art.1.9.2.6 de la BALI, las obras de para el tramo interurbano, las obras del DS N° 102 para el tramo urbano, se tiene un avance para el mes de junio:

Avance de Obras Interurbano (%)	56,4%
Avance de Obras Urbano (%)	3,5%

CONSTRUCCIÓN.

Tramo Interurbano.

Durante el mes de junio de 2026, las actividades de Construcción continúan desarrollándose en los puentes a reemplazar, el puente Quebrada Seca y El Almendro se encuentra finalizado y entregado al tránsito, el Puente Huentelauquén tiene su estructura finalizada y solo falta el despeje del lecho y la ejecución de defensas fluviales (enrocado). En el caso del Puente Limarí además de los Estribos, se trabaja levantando la Cepa 1, 2, 3 y 4. En relación con los Atravesos, los accesos de Ñague se encuentran pavimentados, en el atraveso Chigualoco aún se trabaja en el movimiento de tierras en los accesos, en tanto que Puerto Oscuro ha sido entregado al tránsito.

Las pasarelas peatonales, Huentelauquén, Mincha Sur, Salala Sur y Mantos de Hornillos prácticamente se encuentran finalizados los trabajos de instalación de barandas y aceras, Mientras que las pasarelas Mincha Norte, Illapel Norte, Lo Varoli, Barraza, Salala Norte, Oruro, Morrillos y Las Tacas, presentan diferentes etapas de avance, desde hormigonado de fundaciones, hasta casos donde ya se trabaja en los capiteles de cepas. Respecto a los trabajos de pavimentación, estos han desarrollado especialmente en el ASG N°8 en se sector El Panul, y en bahías de estacionamiento de postes SOS. En tanto que en el sector de Huentelauquén, Amolanas, y Socos siguen en ejecución los trabajos de rectificado del trazado.

Con respecto al Paso Inferior Avda. Panorámica ubicada en km 457,200, se continúa trabajando en el estribo del lado poniente, las calles de Servicio asociadas a dicha estructura, se mantienen operativas, encontrándose pavimentada y en uso la pista 3 de la ruta 5, siendo esta la alternativa principal de sur a norte, mientras que las calles laterales ponientes reciben el tránsito norte a sur.

Tramo Urbano

Durante este mes han continuado en el Tramo Urbano del Contrato el retiro de Barreras existentes, reemplazándose por las nuevas Barreras Metálicas tipo H1, especialmente en el sector de Peñuelas. A la vez se terminaron los pilotes de la nueva Pasarela Colegio Adventista.

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



Paso Inferior Avenida Panorámica



Área Servicios Generales ASG -08 – Km. 455.000.



Área Servicios Generales ASG -05 – Km. 370.800.



Pasarela Colegio Adventista



Pasarela Salala Norte



Puenete Limarí



Pasarela Barraza



Pasarela Las Tacas

V. ETAPA DE EXPLOTACIÓN.

1.- INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR.

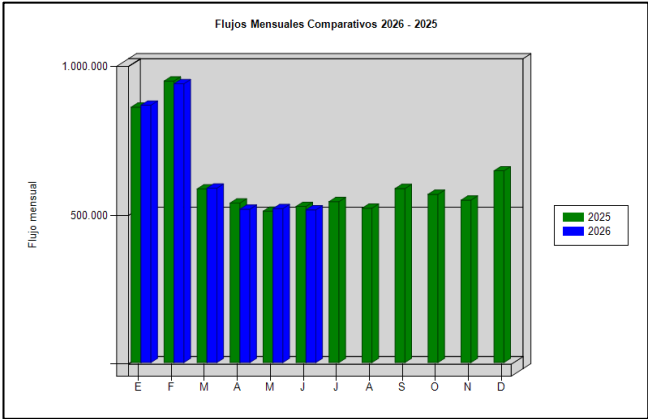


Grafico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2025 – 2026
Fuente : Reporte 28 SICE

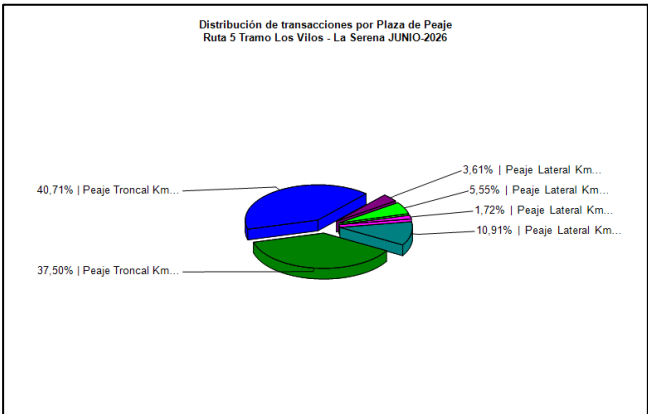


Grafico 3: Distribución de Flujos de junio, por Plaza de Peaje
Fuente : Reporte 29 SICE

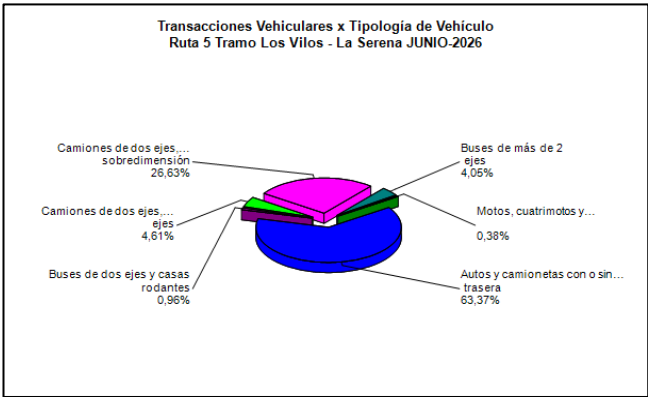


Grafico 2: Distribución de Flujos de junio, por categoría de vehículo
Fuente : Reporte 29 SICE

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años.

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
2023	893.656	964.011	588.806	540.768	504.060	492.962	591.145	522.202	575.033	547.934	504.268	606.461
2024	834.759	930.406	597.718	468.482	480.744	482.277	518.343	494.664	580.963	529.530	536.961	604.336
2025	857.091	944.881	582.800	535.519	507.961	523.964	540.139	517.971	583.961	564.609	545.077	643.628
2026	863.681	935.753	585.390	514.580	516.707	512.492						

Reporte 28 SICE

2.- INFORMACIÓN DE INGRESOS

El ingreso mensual del presente mes es muy similar con respecto al mes anterior, aumento un 0,26%. sin embargo, el aumento con respecto del mismo mes del año anterior 2025 fue de un 3,28%.

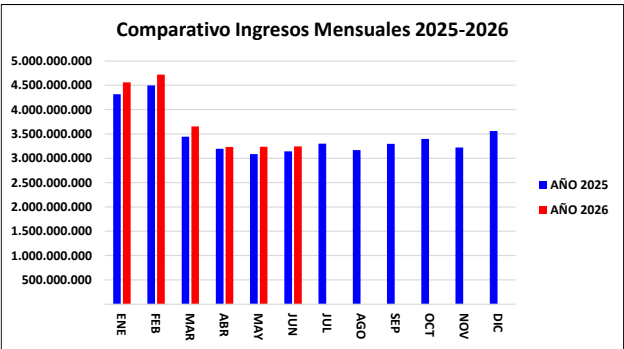


Grafico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales.

El ingreso total mensual alcanzó un monto de \$ 3.245.611.950, equivalentes a UF 79.617 (UF Diaria). El mayor aporte a dichos ingresos los hizo la Plaza de Peaje Troncal Puerto Oscuro con un ingreso de \$ 1.661.673.250 (51,20%).

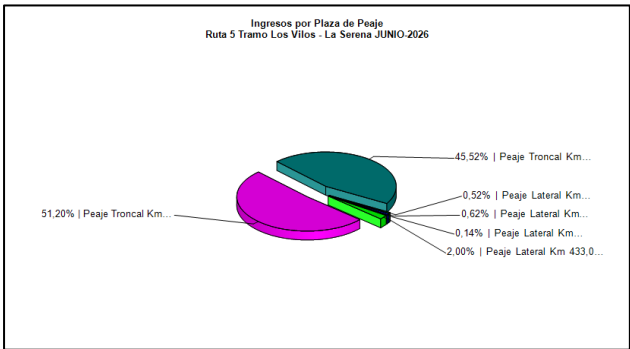


Grafico 5: Distribución de Ingresos junio, por Plaza de Peaje
Fuente : Reporte SICE 32

3.- ACCIDENTABILIDAD

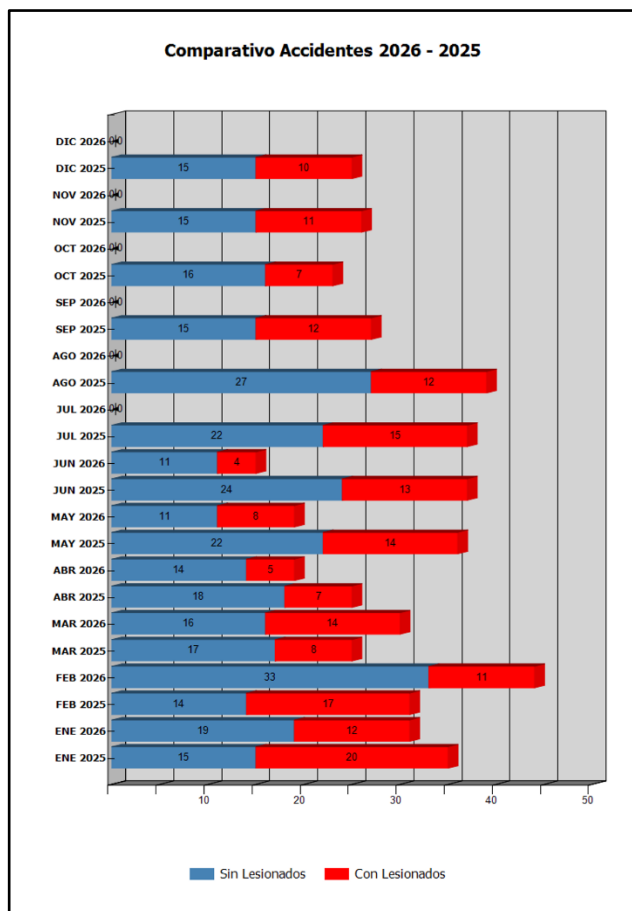


Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2025-2026, accidentes con lesionados (-) y sin lesionados (-)
Fuente : Reporte 33 SICE

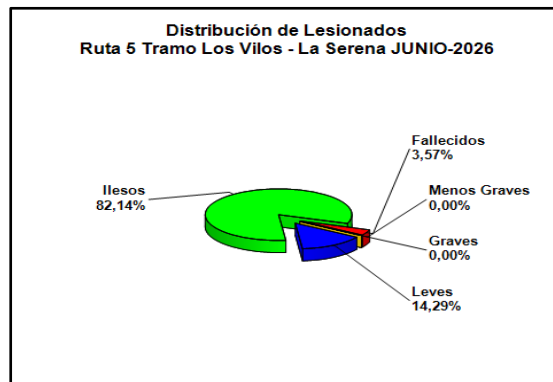


Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados
Fuente : Reporte 34 SICE

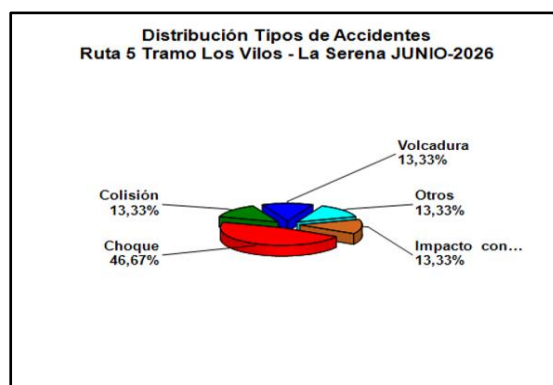


Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes
Fuente : Reporte 34 SICE

Respecto a las causas de los accidentes ocurridos durante el mes de junio, el 66.7% se debió a una Falla humana, en tanto que un 13.3% fue originado por animal en la vía.

Durante el mes informado se registraron 15 accidentes vehiculares, en donde se vieron involucrados 28 usuarios, registrándose un 82.14% como ilesos. Solo 4 de los 15 accidentes involucró a usuarios lesionados, resultando 4 usuarios con lesiones leves y 1 usuario fallecido.

	ENE 2025	ENE 2026	FEB 2025	FEB 2026	MAR 2025	MAR 2026	ABR 2025	ABR 2026	MAY 2025	MAY 2026	JUN 2025	JUN 2026	JUL 2025	JUL 2026	AGO 2025	AGO 2026	SEP 2025	SEP 2026	OCT 2025	OCT 2026	NOV 2025	NOV 2026	DIC 2025	DIC 2026
Con Lesionados	20	12	17	11	8	14	7	5	14	8	13	4	15	0	12	0	12	0	7	0	11	0	10	0
Sin Lesionados	15	19	14	33	17	16	18	14	22	11	24	11	22	0	27	0	15	0	16	0	15	0	15	0
Total Acc.	35	31	31	44	25	30	25	19	36	19	37	15	37	0	39	0	27	0	23	0	26	0	25	0

Reporte 33 SICE

Accidentes Acumulados Anuales (últimos 5 años)

Años	Accidentes		Víctimas				Total	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2022	376	141	15	33	67	158	273	4	6	61	29	29	1	11
2023	373	130	9	26	56	139	230	1		44	26	36	2	21
2024	343	141	14	30	49	191	284	6	5	32	26	39	5	28
2025	366	146	23	24	50	174	271	3	3	21	27	54	1	37
2026	158	54	3	3	23	64	93			6	21	17	1	9

Fuente: Reporte 35 SICE

4.- RECLAMOS DE USUARIOS

CASUÍSTICA	Mayo	Junio	Totales
Respecto de datos de Accidentes	2	5	7
Respecto Trabajos en la vía.	4	1	5
Modalidad de cobro en plaza de peaje	3	3	6
Vuelto mal entregado	3	9	12
Clasificación Tarifaria	3	1	4
Devolución de Cobro	0	1	1
Falta o exceso de iluminación	0	1	1
Tiempo de espera en plaza de peaje	1	0	1
Animal se cruza en la vía	4	0	4
Objeto extraño ocupa la vía	8	8	16
Difusión y disponibilidad de número telefónico de emergencia	1	1	2
Bache en el pavimento de la vía	4	1	5
Consultas Comerciales	5	3	8
Disposición de RSO en oficinas de atención, áreas de servicio y peaje	1	0	1
Información sobre sistema de reclamo presente en la concesión	3	0	3
Sobre otros procedimientos	2	2	4
Otros (Registrar)	16	9	25
TOTALES	60	45	105

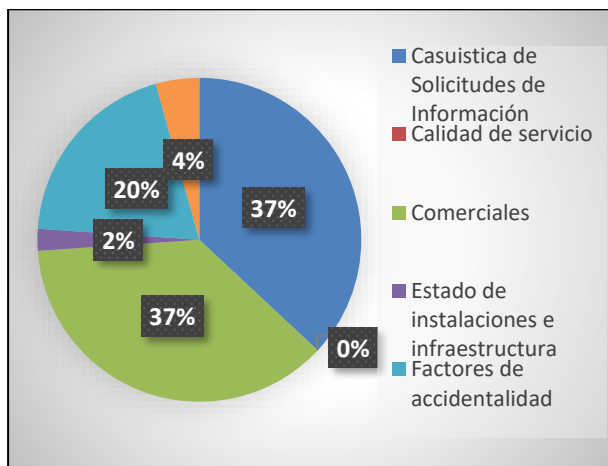


Gráfico 10: Distribución de reclamos por Área Temática.
Fuente: Sociedad Concesionaria.

Gráfico 9: Tabla con reclamos del mes v/s mes anterior
Fuente : Sociedad Concesionaria.

Los reclamos de usuarios se clasifican en 5 grandes grupos en este mes la mayoría se concentra en temas de calidad de servicio y factores de accidentalidad.

5.- ASISTENCIA A USUARIO

2026										
Mes	Tipo y Nº de atenciones									Total Asistencias
	Reparación vehículo in situ	Remolque	Panne por combustible	Vehículo que requiere otros servicios	Primeros auxilios	Auxilio en accidente	Traslado a centro asistencial	Señalización preventiva	Otros	
Enero	41	223	29	0	1	31	5	46	48	424
Febrero	44	307	40	0	2	44	2	46	70	555
Marzo	16	138	9	0	4	30	1	53	26	277
Abril	32	133	16	0	1	19	2	42	24	269
Mayo	33	136	17	0	2	19	2	37	38	284
Junio	36	141	7	0	5	15	2	42	30	278
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total	202	1078	118	0	15	158	14	266	236	2087

Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas
Fuente : Sociedad Concesionaria

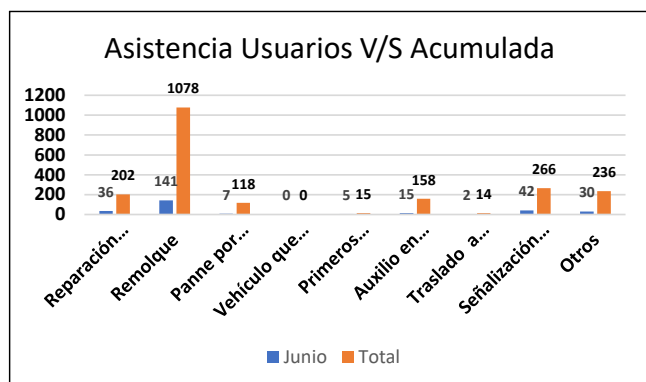


Grafico 12: Distribución porcentual de las Asistencias
 Fuente : Sociedad Concesionaria

Durante el mes de junio se efectuaron 278 solicitudes de asistencia en la ruta, El principal requerimiento fue el Remolque de vehículos en panne con un 51% de las atenciones. Le siguen, señalizaciones preventiva y reparación vehículos en sitio, con un 15% y un 13% respectivamente.

6.- HECHOS RELEVANTES

No hay hechos relevantes en el mes de junio 2026.
