

## 1. ANTECEDENTES GENERALES

El Contrato de Concesión de la obra pública fiscal "Embalse Convento Viejo II Etapa VI Región", forma parte del programa de licitaciones por el Sistema de Concesiones de Obras Públicas del MOP, que es el titular y su representante operativa la Dirección de Obras Hidráulicas. Por Decreto Supremo MOP N° 273, del 27 de abril de 2005, publicado en el Diario Oficial del 4 de julio de 2005, se adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región", al consorcio conformado por las empresas BELFI-BESALCO- BROTEC, las cuales constituyeron la Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consistió en la ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo (Etapa I), de capacidad 27 millones de m3 preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de m3 (Etapa II), más una red de canales matrices, principales y secundarios, para el riego de una superficie que originalmente ascendía a las 26.000 há, del Valle de Nilahue, e incrementar la seguridad de riego de las 38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.

El Plazo de la Concesión se definió en 304 meses y el Presupuesto Oficial estimado para el proyecto fue de UF 4.200.000.

De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se dividieron en tres fases y son las siguientes:

- **Fase 1 (Construida y en Explotación) Construcción de Obras del Embalse:** Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se contaba una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión y Oleoducto, entre otros.

- **Fase 2 (Construida en Explotación) Obras Complementarias:** Corresponde a la modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela.

- **Fase 3 Red de Riego:** Contempla la Red de Canales Principales y Secundarios, Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue. A la fecha se ha dado inicio a la PSPP correspondiente al canal Lolol Sur, Quebrada Los Cardos y Estero Nerquihue, incorporando 3.000 há

- **Servicios Complementarios:** En la actualidad se encuentra en desarrollo el proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica de una potencia nominal de 16,4MW.

A la fecha, las **Fases 1 y 2** se encuentran concluidas y en etapa de explotación. En cuanto a la **Fase 3**, esta fue suspendida por la Resolución DGOP N° 4607, de fecha 01 de octubre de 2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP N°262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supremo N°244 del 07 de agosto de 2013 publicado el día 26 de abril de 2014.

**Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S. A.**

**Domicilio Legal:** Tajamar 183, Of. 102, Las Condes, Santiago

**Rol Único Tributario:** 76.338.870-0

**Teléfono:** (56 2) 234 0804

La Sociedad Concesionaria forma parte del Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el N° 148, desde el 9 de mayo de 2010. Anteriormente, con fecha 17 de enero de 2006 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del DFLN°164 MOP, la Sociedad había sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N°925. Con la entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló esta inscripción y la Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial de Entidades Informantes.

<b>Nombre del Contrato</b>	<b>Concesión Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región</b>	
<b>Sociedad Concesionaria</b>	Embalse Convento Viejo S.A	
<b>Decreto de Adjudicación</b>	DS MOP N° 273 del 27 de abril de 2005	
<b>Inicio de Concesión</b>	04 de julio de 2005	
<b>Plazo de Concesión</b>	304 meses	
<b>Puesta en Servicio Provisoria</b>	PSP Fase 1 : 30 de junio de 2008 PSP Fase 2 : 30 de junio de 2009	
<b>Puesta en Servicio Definitiva</b>	Una vez finalizada la Fase 3 Red de Riego	
<b>Presupuesto oficial estimado de la obra.</b>	UF 4.200.000	
<b>Convenios Complementarios</b>	<b>CC 1</b>	Aprobado por D.S. 113 de fecha 02 de febrero de 2007.
	<b>CC 2</b>	Aprobado por D.S. MOP 719 de fecha 12 de octubre de 2007
<b>Accionistas y su participación</b>	Besalco	33,33%
	Belfi	33,33%
	Brotec	33,33%
<b>Inspector Fiscal</b>	Ingeniero Civil Sr. Marcelo Beratto Raggi	
<b>Asesoría Inspección Fiscal Residente</b>	ICSA Ingenieros Consultores S.A. Ingeniero Civil Sr. Andrés Fuentes S.M.	

## 2. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Permite aumentar la seguridad de riego de 38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las toscas y Guirivilo.

Posibilita incorporar a riego 26.000 há de secano del Valle de Nilahue.

Permite la generación de energía eléctrica con la instalación de una central hidroeléctrica de 16,4 MW conectada al Sistema Interconectado central (SIC).

Permite evitar emergencias agrícolas en años secos o extremadamente lluviosos controlando crecidas.

Posibilita inversiones de proyectos turísticos.

Presa Principal



## 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El Proyecto consistió en la ampliación del muro principal existente y la adecuación de las obras de entrega de agua y de desagüe, para permitir el aumento de la capacidad de almacenamiento, desde 27 millones de m<sup>3</sup> (Fase 1) a 237 millones de m<sup>3</sup>, más el mejoramiento de bocatomas y defensas fluviales en Estero Chimbarongo, construcción del canal Matriz Nilahue y el Túnel La Lajuela (Fase 2). Además se considera una red de canales matrices, principales y secundarios de una longitud de 140 km (Fase 3) para la conducción y distribución de agua, principalmente en el área de influencia del embalse Convento Viejo y para el secano del sector Lolol - Nilahue.

Este volumen permite aumentar la seguridad de riego a la superficie actual de 38.000 há, y a la vez, con la futura construcción de la Fase 3 incorporar 26.000 nuevas há en el secano costero.

Las principales obras incluidas en el proyecto "Embalse Convento Viejo, II Etapa", se subdividen en las siguientes Fases:

Fase	Descripción Obras	Fecha Inicio	Fecha Término
1	Obras de ampliación del actual embalse Convento Viejo muro principal, muro auxiliar, obra evacuadora de crecidas, obras de entrega.  Obras de modificación de infraestructura (variante ferroviaria Chimbarongo – Teno, variante línea de transmisión eléctrica, 254 KVA. Variante oleoducto, variante línea de 66 KVA, obras de conexión vial).	04.07.2005	30.06.2008
2	Mejoramiento de bocatomas y defensas fluviales en estero Chimbarongo.  Canal Matriz Nilahue,  Túnel La Lajuela $l= 1,3$ km hasta valle de Lolol-Nilahue $Q= 26$ m <sup>3</sup> /s.  Operación y mantención del canal Teno Chimbarongo  Fin del Contrato de Concesión	04.07.2005   10.03.2010	30.06.2009   04.11.2030
3	Red de Riego Valle de Nilahue	30.01.2013	30.04.2017

## 4. OPERACIONES Y CONSERVACIÓN

De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual de Operaciones, entre las fechas 01 de Octubre de 2016 y 28 de Febrero de 2017, en ausencia de crecidas pluviales o nivales de la cuenca del estero Chimbarongo las aguas máximas en el Embalse deberán ser inferior o igual a la cota 268 msnm.

Durante el período del 01 al 30 de Noviembre de 2016 se ha verificado efectivamente el cumplimiento de los cuerpos normativos señalados precedentemente, lo que se resume en el gráfico "Cota del Embalse" y gráfico "Volumen del Embalse", en el cual, se registran las lecturas máximas y mínimas del período antes señalado, que se han obtenido de las mediciones diarias registradas.

El embalse al 30.11.2016 quedó con una cota de nivel de agua 267,950 msnm que equivale a un volumen embalsado de 235.681.149 m<sup>3</sup>.



Bocatoma Uva Blanca

Con fecha 01.11.2016 la cota del nivel de agua fue 267,700 msnm y ascendió al 30.11.2016 a la cota 267,950 msnm.

Durante el mes de Noviembre 2016, no hubo precipitaciones.

Con fecha 04-11-2016 se registró un sismo magnitud 6,4 Mw, con epicentro 23 Km al E de Curicó y 95,2 Km de profundidad. En la Presas Principal y Auxiliar no se registran daños estructurales ni filtraciones anormales. Se llenó el formulario "Procedimiento Aplicables a Presas después de un Sismo" que Instruye la DOH del MOP.



Con fecha 27-11-2016 se cerraron las compuertas de admisión del canal Teno Chimbarongo

Durante presente mes se ha terminado un catastro fotográfico de las obras siguientes: quebrada Los Cardos, estero Nerquihue, canal Lolol Sur, canal sub-derivado Tres Esquinas y estaciones fluviométricas.

Con fecha 08.11.2016 el embalse Convento Viejo registró una entrega máxima de 25,574 m<sup>3</sup>/s con objetivos: ecológicos, regadío e hidroeléctricos de la central Rapel. **Foto. Presa Principal.**



## 5. GRÁFICOS VOLUMEN Y COTA EMBALSE

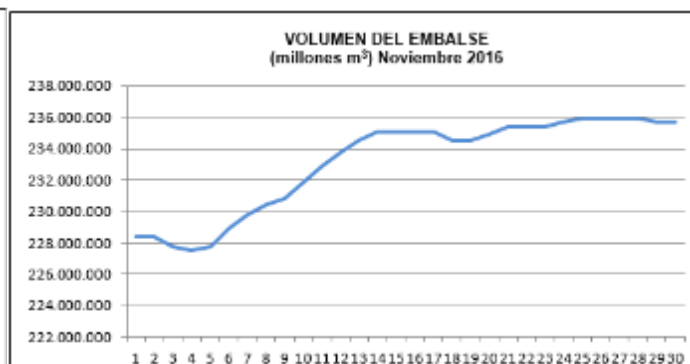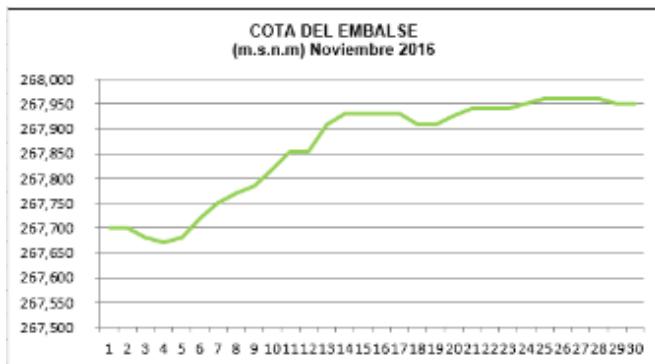

## 6. PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONVENTO VIEJO

## a) INTRODUCCION.

Convento Viejo es un Embalse de Riego que presta servicios regulados de almacenamiento y entrega de agua, que se ubica aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Santiago, y a unos 15 Km al sur poniente del pueblo de Chimbarongo, por la ruta I-89. Su presa principal, se emplaza en el cauce del Estero Chimbarongo en el sector denominado Convento Viejo. La última ampliación del proyecto consideró el peraltamiento del muro principal de 16 a 32 metros de altura y la construcción de un Muro de Hormigón Auxiliar, Vertedero de Crecidas, con sus cuatro Compuertas de Sector y una válvula Howell Bungler de 2,4 m de día., por la que se entregan del orden de 13 a 18 m<sup>3</sup>/seg para regadío.

El Embalse Convento Viejo, actualmente de una superficie de 2.400 Há de extensión y una capacidad de 237 millones de m<sup>3</sup>, el que se alimenta del Estero Chimbarongo y del Canal Teno-Chimbarongo, entre otros Afluentes menores, se necesita para regar los valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo, que suman una superficie de 38.000 Há., más una superficie de 21.500 Há., de los valles de secano de Lolol, Nilahue y Pumanque, que se conectan a través del Túnel La Lajuela y los que suma un total de cerca de 300 Km de canales de regadío totales, y para aportar agua a la Central Hidroeléctrica Rapel de Endesa.

Con el fin de ocupar las aguas que entrega este Embalse y conforme a lo estipulado en la Cláusula 1.10.2: "Servicios Complementarios" y específicamente en la Cláusula 1.10.2.2: "Producción de Energía Hidroeléctrica", de las Bases de Licitación (BALI), está en construcción, a la salida del Túnel Sur ubicado a los pies de la Presa Principal, la Central Hidroeléctrica Convento Viejo (CHCV), de 16,4 MW de potencia y una caída bruta máxima de 30 m. de columna de agua, compuesta por una Tubería de Aducción, dos Turbinas tipo Kaplan de 32,5 m<sup>3</sup>/seg. c/u, dos Generadores tipo sincrónicos,

## d) AVANCES DEL PROYECTO.



Hormigón muros 21 y 22. 1ª Elevación de la 5ª Etapa de Hormigonado. 40 m<sup>3</sup> H25.

un Canal de Descarga, que se unirá al Estero Chimbarongo a través de un Canal de Desagüe y un Canal de Restitución y un Patio de Alta Tensión que conectará la Central, a la Línea de Alta Tensión Tinguiririca-Teno de 154 kV del SIC, que pasa por el lugar.

Para conectar la Central Hidroeléctrica en construcción al Embalse, será necesario secar la Tubería de Aducción de 3,8 m de diá., del Túnel Sur, mediante la construcción de una Compuerta Metálica Modular fija (tapón metálico), para las obras de la aducción horizontal y un tapón removible Toriesférico, para la aducción vertical, en las Obras de Aducción de hormigón de dicha tubería, ubicadas en el embalse, a unos 25 a 30 metros de profundidad.

Al secar dichas obras de Aducción, quedará sin agua un Canal de Regadío llamado Santa Adela, el que está conectado mediante una tubería de 800mm de diá., a la tubería de aducción del Túnel Sur. Para solucionar este problema, fue necesario la construcción de un Sifón, llamado Santa Adela, que une dicho canal al Embalse, mediante una tubería de 700mm de diá., obra que está operativa y funcionando, ya que se inició la temporada de riego a partir de fines de septiembre del presente año.

El pick de empleo de este trabajo es de 100 personas y el costo de la inversión de este proyecto es de 25 millones de US\$. No tiene impactos ambientales negativos de importancia. El proyecto cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental favorable, RCA N° 147 de fecha 12 de abril del año 2007. Con la Resolución N° 164 de fecha 20 de febrero de 2015, se declara el Inicio de Construcción de la Obra Central Hidroeléctrica Convento Viejo; Contrato de Concesión Embalse Convento Viejo; 2ª Etapa.

#### b) AVANCE DE LAS OBRAS DURANTE EL MES

Los trabajos realizados durante el mes de Noviembre de 2016, se concentraron principalmente en las obras civiles correspondientes a la Casa de Máquina Etapas 5 y 7, rellenos estructurales perimetrales, limpieza de Túnel Sur y proyección de Shotcrete entre refuerzos interiores (vigas T) de la Tubería de 6.500 mm de dicho túnel y otros trabajos auxiliares, cuyo resumen de lo más importantes, se detallan a continuación:

- ✓ Casa de Máquinas:
  - Emplantillado Lado Oriente 5ª Etapa de Hormigonado: 20 m3 H10.
  - Hormigón H25, Radier Lado Oriente, sector Válvulas: 259 m3.
  - Hormigón H25: Muros 21, 22, 25, 29 y 30, 5ª Etapa de Hormigonado: 145 m3.
  - Hormigón H30: Fundación Diente Canal de Descarga: 259 m3.
  - Enfierradura: Muros 21, 22, 25, 29 y 30, Radier Sector Válvulas y Fundación Diente Canal de Descarga: 66.153 Kg.
  - Insertos Guía Compuertas y Anclaje Turbinas: 931 Kg.
  - Moldajes Muros y Radier Sala de Válvulas: 444 m2.
  - Rellenos Compactados: 322 m3.
  - Excavaciones: 171 m3.
- ✓ Cámara de Válvulas Túnel Sur:
  - Desarme Compuerta Radial y gran parte de la Compuerta Bureau.
- ✓ Tubería de 3.800 mm.
  - Corte de la Tubería, retiro de los trozos e instalación de la Tapa Provisoria.
- ✓ Túnel Sur:
  - Shotcrete paredes Túnel Sur: 68 m3 SH25
  - Radio Base Compuerta Aducción: 7 m3 H30.
- ✓ La Gestión Ambiental se enmarcó en las exigencias de la RCA 147/2007 y en la Gestión de Seguridad se enmarcó en la capacitación del personal, seguimiento al AST, inspecciones de terreno y trabajos de seguridad



Recepción del Moldaje y la Enfierradura de los muros 21, 25, 29 y 30, con el Sr. Mario Sailer L. Ingeniero Calculista de la SC. Douglas Greig P. Inspector Jefe y Revisor de la Central y el Sr. Carlos Ramírez H. Supervisor OOC de la CHCV. 1ª Elevación, 5ª Etapa de Hormigonado.



Inicio el desarme de la Compuerta Radial de la Cámara de Válvulas del Túnel Sur.



Maniobra de retiro del Cilindro de la Compuerta Bureau de la Cámara de Válvulas del Túnel Sur.

## CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO, II ETAPA, VI REGIÓN

NOVIEMBRE 2016

- tales como instalación de barreras y señalética, accesos y barandas.
- ✓ Se continúa con la entrega de agua a Los Regantes del Canal Santa Adela, aumentando a unos 650 lts/seg. a través del Sifón del mismo nombre.
  - ✓ El día martes 8 de noviembre, el Sr. Marcelo Beratto R., IFE del MOP, recorre el Túnel Sur hasta el Tapón Torisférico y la Casa de Máquinas hasta el interior de los Difusores.
  - ✓ Cuadro de Avance de las Obras, hasta el mes de Noviembre de 2016:

ITEM	DESCRIPCION	
<b>1</b>	<b>GENERAL</b>	<b>100%</b>
1.1	Trabajos Preliminares	100%
1.2	Instalación de Faenas	100%
<b>2</b>	<b>OBRAS EN TUNEL SUR</b>	<b>60%</b>
2.1	Obras de Toma	100%
2.2	Caverna de Válvulas	12%
<b>3</b>	<b>CASA DE MÁQUINAS</b>	<b>31%</b>
3.1	Tubería en Presión	0%
3.2	Infraestructura Casa de Máquinas y Evacuación	39%
3.3	Superestructura Casa de Máquinas	0%
3.4	Sistemas Complementarios	17%
3.5	Arquitectura y Terminaciones	37%
<b>4</b>	<b>CANAL DE RESTITUCIÓN</b>	<b>93%</b>
<b>5</b>	<b>OBRAS Y EQUIPAMIENTO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA</b>	<b>11%</b>
5.1	Ingeniería y Otros	77%
5.2	Movimientos de Tierra	0%
5.3	Obras Civiles y Estructuras	0%
5.4	Suministro y Montaje Equipos S/E	0%
5.5	Línea Transformador - SE	0%
5.6	Conexión Sistema Interconectado	7%
<b>6</b>	<b>COMISIONAMIENTO, PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO E INDEX</b>	<b>0%</b>
6.1	COMISIONAMIENTO	0%
6.2	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO	0%
6.3	PRUEBAS INDEX	0%
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>	<b>36,65%</b>

## c) FICHA TÉCNICA CENTRAL HIDROELÉCTRICA.

Características Principales de la Central Hidroeléctrica Convento Viejo	
Fecha Inicio	01-01-2015
Fecha de Término (Puesta en Servicio)	01-10-2017
Monto Inversión	25 millones US\$
Caudal de diseño	65 m <sup>3</sup> /seg (32,5 m <sup>3</sup> /seg por unidad)
Altura Neta	28,2 m Altura Neta: 28,2 m
Potencia instalada	16,4 MW
Tipo Turbinas	Kaplan eje vertical
Nº unidades	2
Punto conexión	Línea Tinguiririca- Teno 154 kV
Energía promedio producida	76,6 GWh/año



Terminación del Shotcrete entre vigas T con malla Acma. Empresa Castellum Ing. y Construcciones Spa. Al fondo se aprecia la Compuerta de Segmentos de la Aducción Horizontal, instalada por los Buzos de la Empresa Trasubmar Ltda.



Instalación de las Patas de Soporte de la Válvula Mariposa y posteriormente, instalación de la Tapa Provisoria de la Tubería de 3800 mm.



**El Sr. Marcelo Beratto R. IFE del MOP y los Sres. Rene Valenzuela Ch. de la CHCV y Douglas Greig P. de ICESA, recorren el Túnel Sur hasta el Tapón Toriesférico. Posteriormente revisan la Casa de Máquinas.**

## 7. RELACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD

Uno de los principales acontecimientos del mes de noviembre fue la reunión que se tuvo en la Villa Los Parrones, sector que se encuentra en el área de influencia del proyecto Embalse Convento Viejo, el propósito de esta actividad en terreno fue identificar las potenciales zonas donde se podrían desarrollar ejes turísticos y recreativos para la comunidad, considerando condicionantes tales como si el sector está bajo régimen de concesión, la seguridad de las personas y que no se afecte la calidad de las aguas.

Una de las principales áreas que cumplen con los requisitos para desarrollar acciones recreativas y turísticas, se encuentra aguas abajo de la presa auxiliar, lugar denominado canalón, cuyos atributos ambientales son aptos, debido a que cuenta con acceso vial, una calidad visual y paisajística de gran valor y por sobre todo no se encuentra bajo jurisdicción de la Sociedad Concesionaria. Cabe destacar que en esta convocatoria realizada por la comunidad estuvo presente la Seremi de Obras Públicas, la Unidad de Medio Ambiente y territorio de CCOP y la Inspección Fiscal respectiva.



**Lámina N°2: Seremi de Medio Ambiente, inaugurando el sendero Cerro Santa Marta**

Con la participación de actores locales y regionales se dio por iniciado el sendero ecológico "Cerro Santa Marta", las principales características de esta senda, son 2 kilómetros de longitud, con dos estaciones de descanso y observación, su ubicación se encuentra en el sector norponiente del Embalse Convento Viejo, por lo cual cuenta con una vista privilegiada al espejo de agua, lo que permitirá ser una escuela al aire libre para los estudiantes locales

En efecto los cuidados del medio ambiente, su biodiversidad, la flora y la fauna, se podrán sensibilizar y aprender con esta potente



Lámina N°1: Se observa sector denominado “Canalón”

herramienta ecológica , que los profesores de los distintos escuelas no tan solo de Chimbarongo, sino también de otras comunas como Chépica, San Fernando, Teno y Santa Cruz, utilizarán para sus alumnos.

Esta iniciativa cuenta con financiamiento a través de fondos concursables del Ministerio del Medio Ambiente, adjudicado por la Municipalidad de Chimbarongo.

8. PLANO UBICACIÓN GENERAL

