

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Proyecto “Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región”
Tipo de Contrato	Edificación Pública
Provincia	Concepción
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento	Región de O’Higgins Provincia de Colchagua. Comuna de Chimbarongo.
Presupuesto Oficial	UF 4.200.000
Concesionaria	Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel Sur SA
Accionistas del Concesionario	Besalco 1/3 Belfi 1/3 Brotec 1/3
Decreto de Adjudicación	D.S. MOP Nº 273 del 27 de abril de 2005
Plazo Concesión	304 meses
Termino Concesión	04 de noviembre 2030
Inicio de Obras	04 de Julio de 2005
Inspector Fiscal (Titular)	Andrés Caroca Baeza
Inspector Fiscal (Subrogante)	Claudio Asenjo Schultz
Asesoría Inspección	Zañartu Ingenieros Consultores SpA
Modificaciones al Contrato	<ul style="list-style-type: none"> • 2 convenios complementarios
Estado de Calificación Ambiental	
Subsidios	
Página WEB	www.ecv.cl

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de Santiago, en la cuenca del Estero Chimbarongo



3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en la ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo (Etapa I), de capacidad 27 millones de m³ preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de m³ (Etapa II), más una red de canales matrices, principales y secundarios, para el riego de una superficie que originalmente ascendía a las 26.000 há aproximadamente, del Valle de Nilahue e incrementar la seguridad de riego de las 38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Fase 1: Obras del Embalse: Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se contaba una Variante Ferroviaria, Línea de Alta Tensión y Oleoducto.

Fase 2: Obras Complementarias: Corresponde a la modificación y extensión de las redes existentes de conducción de agua, además del Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel y La Lajuela.

A la fecha, tanto las obras de las Fases 1 ,2 y 3, se encuentran con sus Puestas de Servicio Provisorias aprobadas y en operación.

Fase 3 Red de Riego: Comprende la Red de Canales Principales y Secundarios, Sifones, Tranques y Bocatomas, que abastecen a parte del Valle de Nilahue.

Las obras correspondientes a la Fase 3, con la finalidad de estudiar un nuevo trazado, fueron suspendida por Resolución DGOP N.º 4607, de fecha 01 de octubre de 2009, y reiniciadas por instrucción contenida en la Resolución DGOP N.º 262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supremo N.º 244 del 07 de agosto de 2013 publicado el día 26 de abril de 2014.

Mediante la Resolución (E) N.º 1722, de fecha 07 de septiembre de 2020, se materializa la Puesta en Servicio Definitiva de las Fases I, II y III.



5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Permite aumentar la seguridad de riego de 38.000 há de los Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo. Posibilita incorporar a riego 26.000 há de secano del Valle de Nilahue. Permite la generación de energía eléctrica con la instalación de una central hidroeléctrica. Permite evitar emergencias agrícolas en años secos o extremadamente lluviosos controlando crecidas. Posibilita inversiones de proyectos turísticos.

Estación de medición Tipo 1 Estación Lo Toro.



Fecha 05/09/2022, 11:40 h. Altura limnimétrica: 0,38 m. Caudal: 9,569 m³/s.

Puesta en Servicio Definitiva del Proyecto.

La Comisión de Autorización de Puesta en Servicio Definitiva de las Fases 1, 2 y 3 de la obra pública fiscal denominada "Embalse Convento Viejo II Etapa, VI

Región". Fue designada mediante Resolución Exenta DGC N.º 1219, de 12 de junio de 2020.

Servicios complementarios

Central Hidroeléctrica Convento Viejo:

El artículo 1.10.2.2 de las Bases de Licitación dispone que el concesionario podrá ofrecer servicios de venta de energía eléctrica, tal que la producción sea compatible con los servicios señalados en las Bases de Licitación y cumpla con la legislación vigente relacionada con la materia. De acuerdo con esta norma, la concesionaria desarrolló un proyecto eléctrico que consistió en la construcción de una Central Hidroeléctrica a pie de presa, de una potencia nominal de 16,4 MW, formada por dos turbinas Kaplan, cuyas obras se encuentran terminadas y en operación oficial desde febrero de 2019 según autorización del CEN, carta DE 01459-19) desde el 21 de febrero de 2019.



Proyecto de riego Sector Marchigüe y Valle de Nilahue

Por Resolución DGC (Exenta) N° 273, de fecha 30.08.2019, el Ministerio de Obras Públicas ordenó la elaboración del proyecto de ingeniería de detalles denominado "PID Aumento de Cobertura de Riego Sector Marchigüe y Valle de Nilahue" y elaborar y desarrollar el denominado "Estudio de Demanda y Evaluación Social", con el objeto de incorporar a riego unas 10.000 hectáreas de secano de la zona de Marchigüe y unas 570 hectáreas del Valle de Nilahue que actualmente no cuentan con cobertura de riego. El proyecto citado se enmarca en el plan de desarrollo de áreas de riego propuesto para el Embalse Convento Viejo, que tiene por objeto utilizar la disponibilidad de agua del Embalse Convento Viejo, para ampliar el área de riego, a través del mejoramiento de cauces naturales, el mejoramiento de canales existentes y la construcción de otras obras que permitan llevar el agua hasta la comuna de Marchigüe y el Valle de Nilahue.

7.- OPERACIÓN DEL EMBALSE

De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación y el Manual de Operaciones, entre las fechas 01 al 30 de septiembre de 2022, el nivel de aguas máximas en el embalse deberá ser inferior o igual a la cota 267.40 msnm. Esto fue cumplido a cabalidad. Al 1° de septiembre, a las 0 hrs. el nivel fue 266,985 msnm y al 30 de septiembre de 2022, a las 24 hrs. fue 266,835 msnm.


La máxima cota se obtuvo el 06 de septiembre 267.075.

Lectura de Nivel en Embalse Convento Viejo.



Fecha 29/09/2022,11:20 h. Cota: 266,78 Volumen 202.802.857

Se controlan los caudales de entrada al embalse, y se revisa el balance hídrico que elabora diariamente la Sociedad Concesionaria, cuantificando los volúmenes de almacenamiento del embalse y verificando que se disponga para la temporada de riego de los volúmenes de agua que permitan cumplir con los contratos que suscribe la Sociedad Concesionaria con los regantes del Valle de Chimbarongo y Nilahue.

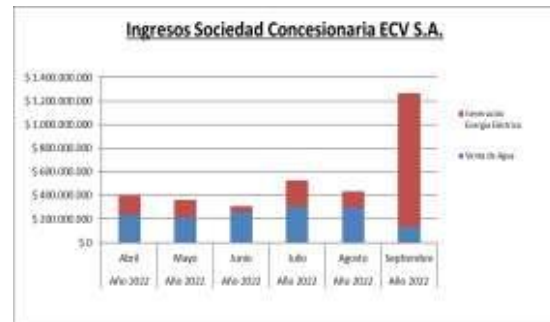

En este cuadro se muestra la evolución de los ingresos de la Sociedad Concesionaria, los últimos seis meses, en relación a la venta de aguas y a la generación de energía eléctrica, cabe señalar que dichos ingresos no necesariamente corresponden con la venta de aguas o generación eléctrica de los meses en cuestión, también se incluyen ingresos por cobros de servicios prestados en períodos anteriores.



Canal Norte Km 11+760 Instalación de malla ACMA, previos trabajos de shotcrete.

9.- ACTIVIDADES DEL MES.

Proyecto de Marchigüe

Se realizaron reuniones en las oficinas del MOP en Santiago para coordinar labores a desarrollar hasta final de año con el fin de conseguir la evaluación social y autorizaciones de la CNR y DOH. Resultados que serán respaldados por las encuestas realizadas en el sector.



Canal Sur Km 4+408. Aplicación de capas protectoras con GOL DENSO para evitar filtraciones de la canoa.

Medio Ambiente y Territorio

Se continúa con el proceso de recepción de facturas, para el proceso de rendición y cierre de la última cuota del “Fondo de Compensación Agrícola Convento Viejo”, que tiene como fecha de cierre de recepción de las rendiciones 31 de octubre de 2022, con lo cual se cierra el proceso de entrega de las 50.000 UF distribuidas en cinco cuotas que se encuentra contenida como medida de compensación en la resolución exenta N°271/15 de fecha 28 de diciembre de 2015.
