

CONCESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RUTA 43 DE LA REGIÓN DE COQUIMBO MES DE SEPTIEMBRE 2016

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	: Concesión Para El Mejoramiento y Conservación De La Ruta 43 de la Región de Coquimbo.
Concesionaria	: Soc. Concesionaria Ruta del Limarí S.A.
Decreto de Adjudicación	: D.S. M.O.P. N° 151/06.03.2013.
Publicación Diario Oficial	: 31.05.2013.
Región de Emplazamiento	: IV Región.
Inicio de la Concesión	: 31.05.2013.
Inicio Etapa Construcción	: 31.05.2013
Plazo Etapa Construcción	: 40 Meses más 24 meses Obras adicionales
Plazo de la Concesión	: 360 Meses.
Puesta en Servicio Provisoria	: Primer Semestre de 2018
Convenio Complementario	: NO HAY
Modificación contrato	: Resolución DGOP N°303 tramitada el 18.03.16 (Obras Adicionales).
Presupuesto Oficial (UF)	: 5.100.000
Tramo de licitación	: Tramo B – Factor de subsidio "S"= 0,589
Inspector Fiscal	: Ricardo Herrera Sanhueza
Asesoría IF	: Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda. (Resolución DGOP N° 54 29-03-2012)

La Concesión se emplaza en la Provincia de Elqui, cuya capital es la ciudad de Coquimbo, y en la Provincia de Limarí, cuya capital es Ovalle y constituye la principal y más directa ruta que une a estas dos capitales provinciales.

El proyecto considera la intervención de casi la totalidad de la Ruta 43 existente y la construcción de un nuevo eje urbano, denominado Av. Las Torres, que le dará continuidad al By Pass de Pan de Azúcar hacia la ciudad de La Serena.

La Ruta 43 se amplía a doble calzada desde el Dm 5.880 hasta el Dm 60.596 y se construye un By Pass de 16 km, también en doble calzada, en torno al sector rural de Pan de Azúcar. En el tramo urbano de Pan de Azúcar se mejora su perfil urbano y el eje Av. Las Torres será construido en calzada simple.

El proyecto se ha subdividido en los siguientes tramos:

Tramo 1: Ruta 43, Ovalle – Inicio By Pass Pan de Azúcar, contempla la ampliación a doble calzada entre Ovalle e inicio del By Pass, incluida la Cuesta Las Cardas

Tramo 2: By Pass Pan de Azúcar, considera 16 km de nuevo trazado en calzada doble, paralelo a línea del ferrocarril y completamente segregado.

Tramo 3: Ruta 43, Sector urbano de Pan de Azúcar contempla el mejoramiento y ampliación de la calzada existente y entorno.


Tramo 4: Avenida Las Torres se ejecutara calzada simple entre Av. La Cantero y Av. Balmaceda.



Instalación de Vigas Puente El Peñón Sur

AVANCE DEL CONTRATO: dado que se ha presentado una nueva versión del Programa para la Etapa de Construcción (PEC), en el mes de mayo debido a la incorporación de 9 Obras Adicionales al contrato lo que implicó un aumento el presupuesto de las obras del contrato de concesión. El avance físico es de un 17,20% de acuerdo a la versión actualiza del programa de obras de construcción:

Tramo 1 (Dm 5.880 – 60.596)	: Avance del 11,6 %
Tramo 2 (Dm 0.000 – 16.014)	: Avance del 39,8 %
Tramo 3 (Dm 62.780 – 74.716)	: Avance del 8,6 %
Tramo 4 (Dm 0.000 – 2.297)	: Avance del 31,6 %
Cambios de Servicio	: Avance del 44,9 %

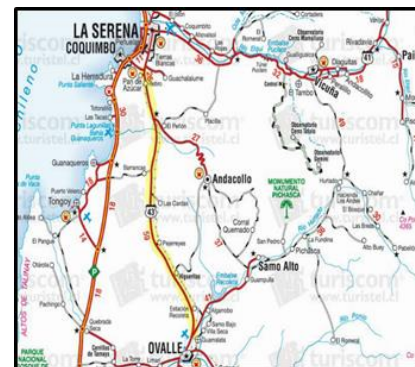

AVANCE GENERAL
(al 30 de Septiembre de 2016):
19,4 %

PLANO DE UBICACIÓN



OBRAS EN EJECUCIÓN (Avance al 30.09.16)

Los trabajos realizados en el contrato durante del mes, son los siguientes:

- a) Trabajos de excavación de escarpe y corte, como también formación y compactación de terraplenes en sectores aledaños a la Ruta 43—Tramo 1.
- b) Trabajos de corte, en sector Cuesta Las Cardas.
- c) Preparación de la sub rasante en sectores aledaños a la Ruta 43.
- d) Disposición de base granular en sectores colindante a la actual Ruta 43—Tramo 1, en By Pass Pan de Azúcar—Tramo2, y en Avda. Las Torres—Tramo 4.
- e) Trabajos de colocación de Relleno Estructural en Paso Inferior Enlace El Peñón, Puente El Peñón Sur y Puente El Peñón Norte.
- f) Puente El Peñón Sur, colocación de doce (12) vigas pretensadas de longitud 35,73 m, y confección de travesaños de arriostramiento para la superestructura.
- g) Construcción de Pasos de Ganados y Peatonales.
- h) Trabajos de saneamiento y drenaje a lo largo de la Ruta 43 e instalación de Cajones Prefabricados.
- i) Colocación de Concreto Asfáltico Capa Intermedia (Binder) en sectores de By Pass Pan de Azúcar—Tramo2 y en Avda. Las Torres—Tramo4.
- j) Trabajos de Imprimación de base granular en sectores de By Pass Pan de Azúcar y en Avda. Las Torres.
- k) Confección de Barreras de Hormigón in sitio, Atravesio 01 de By Pass Pan de Azúcar.
- l) Trabajos de conservación de la infraestructura pre existente, en cuanto a limpieza de soleras con zarpa, cunetas, bajadas de agua, entre otros activos viales, además de despeje, limpieza de señales verticales y bacheo superficial.
- m) Modificación de servicios secos y húmedos. Redes Media Tensión: CONAFE y Agua Potable Rural: APR Las Cardas y Las Barrancas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen N°01. Trabajos Escarpe sector de Recoleta



Imagen N°02. Trabajos de Terraplén Dm 23.500



Imagen N°03 Trabajos Base Asfáltica tramo 2



Imagen N°04 Trabajos pavimentación Enlace La cantera Sur



Imagen N°05. Trabajos Base asfáltica tramo 2.3



Imagen N°06. Trabajos Base asfáltica tramo 4

TEMAS RELEVANTE DEL MES

- En el mes de Septiembre se obtiene la liberación por parte de CONAF para trabajar en aquellas áreas del contrato en las cuales hay presencia de Bosque Nativo, hasta el Dm 27.000. A la vez se continúa con la liberación ambiental en la Provincia del Limarí.
- Durante el mes de septiembre se realizaron trabajos de Obras de Arte en el sector de Cerrillos y Nueva Vida.
- Se mantiene los trabajos de movimiento de tierra en el tramo 1, en los sectores de Recoleta, Higuieritas Unidas, por el costado poniente de la ruta 43 y sector cuesta las Cardas.
- Se mantienen los trabajos en las estructuras mayores del tramo 1, Paso Superior Totoral, Enlace El Peñón, Puente El Peñón Sur y Puente El Peñón Norte.
- Se mantienen los trabajos en las estructuras mayores del tramo 2, Puente La Vega, Puente La Laguna y Enlace La cantera, además se iniciaron los trabajos de pavimentación en dicho tramo.
- En el mes de septiembre se presentaron las versiones finales de los Proyectos de ingeniería de detalle de la Calle local Santa Filomena, Atraveso vehicular Romeralcillo, quedando pendiente solo la Ampliación Doble Calzada entrada Ovalle de las obras adicionales de las obras adicionales según Resolución DGOP N°303, que modifica el contrato de Concesión para el Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 de la Región de Coquimbo, los cuales se encuentran en proceso de revisión

N°	Nombre	Solución
1	Tratamiento semiurbano de Recoleta	Circuitos Peatonales, aceras, iluminación e incorporar vallas peatonales
2	Atraveso vehicular con conexión a la ruta Sector Romeralcillo	Atraveso vehicular tipo cajón con conexión a la ruta
3	Atraveso vehicular con conexión a la ruta Sector Higuieritas Unidas	Atraveso vehicular tipo cajón con conexión a la ruta
4	Atraveso vehicular con conexión a la ruta Sector Pejerreyes	Atraveso vehicular tipo Paso Inferior con conexión a la ruta.
5	Atraveso Peatonal Plaza de Pesaje, Sector El Peñón	Atraveso Peatonal mediante Obra de Arte tipo cajón.
6	Retorno a nivel Sector Aguas Buenas	Emplazar retorno a nivel con: mediana ancha (15m o más), pista aceleración y frenado, ramal de giro, señalización, dispositivos seguridad vial e iluminación.
7	Atraveso vehicular con conexión a la ruta Sector Aguas Buenas	Atraveso vehicular Paso Inferior, solo para vehículos menores.
8	Calle Local Conectividad Santa Filomena Dm. 6.500 al Dm 7.950.	Calle de servicio que une los Atravesos N°4 y N°5 del tramo 2.
9	Ampliación doble calzada salida ciudad de Ovalle Dm 3.100 al Dm 5.880	La aplicación de la doble calzada se considera entre el Dm 3.100 al Dm 5.880
