

1. ANTECEDENTES GENERALES

El Aeropuerto El Tepual se sitúa a 14 km al poniente de la ciudad de Puerto Montt, Región de Los Lagos, conectado a través de la ruta V-60. Éste se encuentra clasificado como de 1ª categoría clase B, según lo indica en la Resolución Exenta DGAC N° 0698 del 27 de septiembre 2012. Cuenta con una pista de aterrizaje construida en hormigón y pavimento asfáltico, una superficie construida total de 9.900 m² en 2 pisos, 5 puentes de embarque, 4 posiciones remotas, sala de embarque y 4 cintas transportadoras de equipaje. Capacidad de estacionamientos para 556 vehículos (incluye 8 para minusválidos).

Mediante publicación Diario Oficial del Decreto de Adjudicación N°26, la concesión inició el día 03 de abril 2018, con un plazo de concesión fijo de 72 meses, operando con ingresos comerciales e ingresos por pasajeros embarcados.

El proyecto objeto de la Concesión, consiste principalmente en la ampliación, reparación, conservación y reposición de la infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt dentro del Área de Concesión, con todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del Aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con carácter internacional.

La concesión incluye el mantenimiento de todas las obras preexistentes y nuevas que debe ejecutar el Concesionario, así como la conservación y mantención de la infraestructura horizontal asociada al área de circulación de tránsito público, dentro del área de concesión.

Actualmente se encuentra en Etapa de Construcción y Explotación con la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existente o PSP 1 desde las 00:00 hr del 01 de mayo de 2018, autorizada a través de Resolución DGOP (Exenta) N°26. Consiguientemente, el Inicio de Construcción de las Obras fue autorizada por el Inspector Fiscal mediante Libro de Obra de Construcción Folio N°33 con fecha 13 de agosto de 2019.

Por otra parte, respecto de la información estadística de pasajeros, dado que existe desfase de 1 mes en la información de pasajeros arribados que entrega la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), se entregara la información comparativa a los meses de octubre 2018 y 2019. Según lo anterior, los pasajeros movilizados (embarcados y arribados), acumulado al mes de octubre 2018 fueron 1.375.511, y acumulado al mes de octubre 2019 fueron 1.611.146 pasajeros (embarcados y arribados), lo que significó un incremento de 17,13%.

La carga acumulada a octubre 2018 fue 3.514 toneladas y al mes de octubre 2019 alcanzo a 3.359 toneladas, lo que significó una caída de 4,4%.

Nombre del Contrato	Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt	
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Aeropuerto del Sur S.A	
Decreto de Adjudicación	DS MOP N° 26 del 01.03.2018	
Publicación Diario Oficial	03 de abril 2018	
Inicio de Concesión	03 de abril 2018	
Término de Concesión	30 de abril 2024 (72 meses fijo)	
Sup. Concesionada	1.057.357 m²	
Sup. Edificio Terminal	9.900 m²	
Puesta en Servicio Provisoria (PSP Fase 1)	01.05.2018,	
Puesta en Servicio Provisoria (PSP Fase 2)	Pendiente	
Puesta en Servicio Definitiva	Pendiente	
Inversión oficial estimada	UF 810.000 (neto)	
Accionistas y su participación	- Sacry Concesiones Chile S.A.	61,5%
	- Agencias Universales S.A.	37,5%
	- Sacry Chile S.A.	1,0%
Asesoría Inspección Fiscal	Consorcio Creaxion RFA	
Centro Operaciones	Fono +56-652294161	
Página web Aeropuerto	www.aeropuertodepuertomontt.cl	
Página web Soc. Concesionaria	informaciones@aeropuertodepuertomontt.cl	



Fuente: Creaxion - RFA

2. INFORMACION DE PASAJEROS EMBARCADOS (PAX)

Año	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Total	% Variación Acumulada Anual
2010	44.231	44.955	26.000	27.511	28.204	24.861	33.878	29.932	31.351	35.726	41.401	40.539	408.589	1,8%
2011	48.361	51.769	42.426	33.142	31.169	28.583	36.867	33.294	35.415	37.250	44.041	41.884	464.201	13,6%
2012	58.034	62.586	44.388	40.016	37.424	34.121	49.158	39.772	43.205	45.921	52.722	50.675	558.022	20,2%
2013	63.674	72.355	54.577	44.774	41.529	35.905	48.203	42.795	44.993	51.302	57.349	55.966	613.422	9,9%
2014	66.486	73.143	57.016	47.038	45.173	37.983	51.704	45.360	45.728	52.773	57.596	57.125	637.166	3,9%
2015	69.226	73.244	57.935	42.760	43.208	38.861	54.859	50.312	47.570	57.370	59.585	50.918	645.848	1,4%
2016	71.100	78.638	66.401	52.708	53.137	42.816	61.558	55.364	57.455	64.329	68.375	63.846	735.727	13,9%
2017	75.580	77.270	65.029	55.415	55.058	49.313	69.400	60.289	64.082	73.316	74.077	68.804	787.633	7,1%
2018	82.100	81.202	65.153	44.336	60.303	52.792	74.903	62.220	66.029	81.676	93.097	85.246	856.246	8,7 %
2019	116.431	112.544	83.731	72.275	65.872	59.545	79.995	71.605	72.734	70.863	77.481		883.076	15,6% (*)

Fuente: DGAC

(*) Corresponde a la variación acumulada a noviembre 2019 respecto similar periodo 2018.

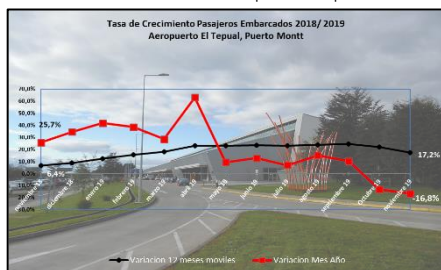


Gráfico 1: Tasa de Crecimiento últimos 12 meses
Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil

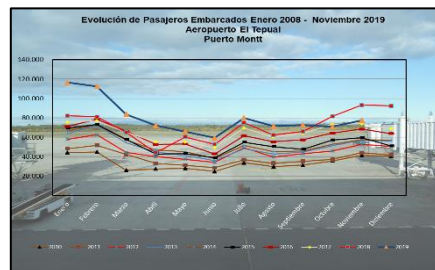


Gráfico 2: Pasajeros Embarcados de 2008 a 2019
Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil

• Variación % Mes Año $\forall$ s Mes Año Anterior

Se presenta la variación porcentual de noviembre 2019 respecto noviembre 2018, donde se registró una caída de 16,8%, variación muy por debajo de la registrada en similar mes del año 2018 (incremento de 25,7%).

• Variación % Σ Año Móvil $\forall$ s Σ Año Móvil Anterior

La variación de los 12 últimos meses móviles alcanzó un 17,2% de crecimiento. En gráfico 1 presenta una tendencia que presenta caída en noviembre 2019. La variación noviembre 2018/2019 tuvo 10,8 puntos porcentuales de crecimiento.

• Pasajeros Embarcados

El Gráfico 2 presenta la evolución histórica mensual de pasajeros embarcados desde el año 2008 a noviembre 2019. Noviembre 2019 se presentó con una caída de 16,8%, muy por debajo del incremento de noviembre 2018 (25,7%). La tendencia es decreciente, ya con un segundo mes consecutivo de caída. La estacionalidad en noviembre presenta desviación respecto de lo presentado históricamente.

3. INFORMACION DE INGRESOS

UF último día del mes	Mes	Ingresos por Pax Embarcado 2019			Ingresos Comerciales 2019			Ingresos Totales en UF		Variaciones	
		Total \$	Total UF	Part. % Ing.	Total \$	Total UF	Part. % Ing.	Año 2019	Año 2018	Var. % mes/año	Var. % Σ 12 meses
27.546,22	Enero	238.325.639	8.652	42,4%	324.254.151	11.771	57,6%	20.423	(*) 6.651	(**) 77,0%	(**) 45,2%
27.556,90	Febrero	231.052.832	8.385	41,5%	326.136.577	11.835	58,5%	20.220	(*) 6.323	(**) 87,2%	(**) 48,5%
27.565,76	Marzo	171.899.743	6.236	36,0%	305.979.977	11.100	64,0%	17.336	(*) 6.276	(**) 76,9%	(**) 54,8%
27.662,17	Abril	148.380.575	5.364	33,0%	300.752.832	10.872	67,0%	16.236	(*) 6.434	(**) 69,0%	(**) 59,8%
Total Ingresos Concesión anterior									25.684		
27.762,55	Mayo	135.235.216	4.871	32,9%	275.865.828	9.937	67,1%	14.808	8.467	(**) 74,9%	(**) 73,8%
27.903,30	Junio	122.245.885	4.381	32,7%	251.845.324	9.026	67,3%	13.407	15.285	(**) -12,3%	(**) 58,2%
27.953,42	Julio	166.145.799	5.944	35,1%	307.182.952	10.989	64,9%	16.933	12.478	(**) 35,7%	(**) 62,0%
27.993,08	Agosto	149.296.425	5.333	34,8%	279.572.807	9.987	65,2%	15.320	16.139	(**) -5,1%	(**) 48,8%
28.048,53	Septiembre	151.650.390	5.407	35,3%	278.094.865	9.915	64,7%	15.322	14.702	(**) 4,2%	(**) 42,6%
28.065,35	Octubre	147.749.355	5.264	33,1%	298.881.417	10.649	66,9%	15.913	15.481	(**) 2,8%	(**) 38,8%
28.222,33	Noviembre	161.547.885	5.724	34,5%	306.060.824	10.845	65,5%	16.569	18.011	(**) -8,0%	(**) 32,2%
	Diciembre								17.873		
Acumulados		1.823.529.744	65.561	35,9%	3.254.627.553	116.926	64,1%	182.487	118.436		

Fuente: Sociedad Concesionaria.

Nota: (*) Corresponde a los ingresos comerciales de la Soc. Concesionaria anterior.

(**) Dado que en el periodo enero – abril 2018 solo se generaba ingresos comerciales (Soc. Concesionaria anterior), la variación % de cada mes del periodo enero – abril 2019 se hará comparando solamente los ingresos comerciales. A partir del mes de mayo se comparará el total de ingresos, es decir, ingresos por pasajero e ingresos comerciales de cada año.


Tarifa DGAC	
Pasajero Embarcado	Tarifa de \$ 2.085 y resolución exenta DGC N° 2392 del 9 de agosto 2019. Rige entre el 10 de julio 2019 y el 9 de enero 2020.

Nota: En este contrato de concesión se contempla reajuste tarifario semestral, cada 10 de enero y 10 de julio de cada año.

Observaciones:

La variación porcentual de ingresos totales en UF entre el mes de noviembre 2018 y noviembre 2019 fue 8,0% de caída.

Respecto a la composición de los ingresos totales, durante el mes de noviembre 2019 los ingresos por pasajeros fueron un 34,5%, mientras que los ingresos comerciales correspondieron al 65,5%.

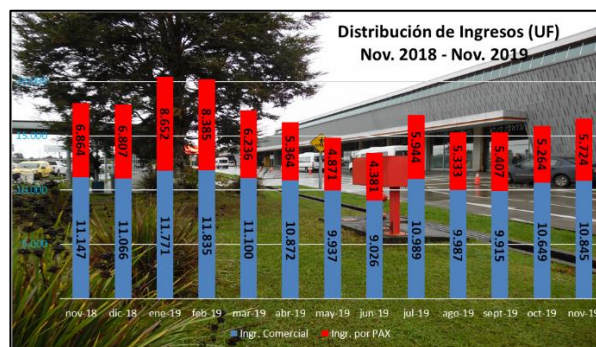

Fuente: Sociedad Concesionaria

Ingresos de Explotación (UF)

Ítem	Ingresos Comerciales	Ingresos Pax.	Ingresos Totales
Noviembre 2018	11.147	6.864	18.011
Noviembre 2019	10.845	5.724	16.569
variación 18/19	-2,7%	-16,6%	-8,0%

Fuente: Antecedentes Sociedad Concesionaria

4. PLAZO DE LA CONCESION

La actual concesión, se inició con fecha 03 de abril 2018 de acuerdo con publicación en Diario Oficial del Decreto de Adjudicación. Concesión a plazo fijo (72 meses), contados desde la Puesta en Servicio Provisoria de las instalaciones Existentes o Fase 1 (01 de mayo 2018). Opera bajo el mecanismo de ingresos por pasajero embarcado e ingresos comerciales. El término de esta concesión está programado para el día 30 de abril del año 2024.

5. CALIDAD DE SERVICIO

Estadística de Reclamos

Atribuible a la Gestión de	Reclamos Enero 2019	Reclamos Febrero 2019	Reclamos Marzo 2019	Reclamos Abril 2019	Reclamos Mayo 2019	Reclamos Junio 2019	Reclamos Julio 2019	Reclamos Agosto 2019	Reclamos Septiembre 2019	Reclamos Octubre 2019	Reclamos Noviembre 2019	Reclamos Diciembre 2019	Reclamos Acumulados 2019
Concesionaria	5	3	1	2	0	0	0	2	0	2	1		16
Subconcesiones	0	2	3	2	0	2	0	1	1	0	1		12
Líneas Aéreas	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		3
Organismos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		1
Otros	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		1
Sugerencias	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	1		6
Felicitaciones	0	0	0	0	1	2	4	3	1	2	2		15
Total	6	6	4	6	1	4	5	7	4	6	5		54

Fuente: Antecedentes Sociedad Concesionaria

Servicios en Aeropuerto

INFORME MENSUAL DE GESTION DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y NO AERONAUTICOS: DETALLE DE PRESTACION O EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS NOVIEMBRE 2019		
SERVICIO	FORMA DE PRESTACION O EXPLOTACION	IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O SUBCONCESIONARIO
SERVICIOS NO AERONAUTICOS NO COMERCIALES		
Servicio de Conservación	Trabajos personal interno y externo	Contratistas según especialidad.
Servicio de Aseo	Prestado por el Concesionario.	Concesionaria
Servicio de Mantenición de áreas verdes	A través de compra de servicios a terceros.	Eulen Chile Ltda
Servicio de Gestión de Basura y Residuos	A través de compra de servicios a terceros.	Ecoser S.A.
Servicio de Señalización	Trabajos personal interno y externo	Empresas dedicadas al rubro de diseños y producción de gráficas publicitarias.
Servicio de Transporte de Equipaje dentro del Terminal	Disposicion de 155 carros porta equipaje en condiciones de operación.	Concesionaria
Servicio de Información a los Usuarios	Prestado por el Concesionario.	Concesionaria
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	Prestado por el Concesionario.	Concesionaria
Servicio de Vigilancia	A través de compra de servicios a terceros.	Eulen Chile Ltda
Servicio de CCTV	Operado por la DGAC	DGAC
Servicio de Entretenimiento	Prestado por el Concesionario.	Concesionaria
Servicio de Conexión Inalámbrica a Internet	Prestado por el Concesionario.	Concesionaria
Servicio de Enchufes para Carga de Dispositivos Electrónicos	A través de compra de servicios a terceros.	
Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida	Prestado por el Concesionario.	Concesionaria
Servicio de Red para Comunicaciones y Datos	Prestado por el Concesionario.	Concesionaria
Servicio de Gestión de la infraestructura asociada al Transporte Terrestre de Pasajeros	A través de compra de servicios a terceros.	28 taxi / Andres Tour / TurBus
NO AERONAUTICOS COMERCIALES OBLIGATORIOS		
Alimentación y Bebidas	Prestado por el Concesionario.	Restaurant Calafate - Sabores de la Patagonia-Wine Bar-Máquinas Expendedoras de Alimentos
Área para Servicio de Comunicaciones	A través de subconcesión.	Telefónica del Sur S.A.
Estacionamientos públicos para vehículos en general	Prestado por el Concesionario.	Concesionaria
Counters para compañías aéreas	A través de subconcesión.	7 Counters entregados a LATAM 4 Counters entregados a SKY AIRLINE 2 Counter entregados a JETSMART 6 Counters disponibles
Oficinas de apoyo a counters para compañías aéreas	A través de subconcesión.	3 oficina entregadas a LATAM 1 oficina entregada a SKY AIRLINE 1 oficina entregada a JETSMART 1 oficina disponible
Áreas para servicios de ámbito financiero	A través de subconcesión.	Banco de Chile
Servicio de Gestión del Terminal de Carga	A través de subconcesión.	Lan Cargo. - Sky Service S.A.
NO AERONAUTICOS COMERCIALES FACULTATIVOS		
Áreas para locales comerciales	A través de subconcesión.	Café Britt (hall público 1° nivel) y Sala de embarque (2° Nivel) Britt Chile Ltda
	A través de subconcesión	Chocolatería D' Gusty (hall público 1er nivel y sala embarque N° 2) / Sociedad Comercial Bahasant Ltda
	A través de subconcesión	Sunglass Hut (2° Nivel Sala de Embarque) Ópticas GMO Chile SA
	A través de subconcesión.	Cafetería y Salón de té Julio Cesar Luis Barria Aqueveque E.I.R.L. RUT 76.494.864-5, Con domicilio Av. Diego Portales N°701, Local N°1 Comuna de Puerto Montt.
	A través de subconcesión.	Piedras Australes S.A. (Sala de Embarque)
	A través de subconcesión.	Asesorías e Inversiones Costa Huaquen SpA (Mana Manicure, Sala de Embarque)
	A través de subconcesión.	Emporio del emprendedor (Sala de Embarque 2° nivel) Emporio Sinergia SpA
Áreas para publicidad y propaganda	Explotado por el Concesionario.	Explotado mediante la subconcesión de espacios o letreros publicitarios, interiores y exteriores.
Custodia, sellado y embalaje de equipaje	Servicio no explotado por el Concesionario.	
Servicio a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos	A través de subconcesión.	Servicios Aeroportuarios S.A. (Pacific Club Salones VIP)
Arriendo de vehículos	A través de subconcesión (12 subconcesionarios)	Rentas y Servicios S.A./ Puerto Rent / West Rent a Car / Rosselott Rent a Car / Econorent / Tattersall / Salfa Sur / Hertz / First Rent a Car / Sixt Rent a Car / Álamo Rent a Car / Chilean Rent a Car
Estacionamiento para custodia de vehículos	Servicio no explotado por el Concesionario.	
Oficinas en General	Servicio no explotado por el Concesionario.	
Otros	A través de subconcesión.	Pausa (Sillones de Masajes)
SERVICIOS AERONAUTICOS		
Sistema de embarque y desembarque de pasajeros	Explotado por el Concesionario.	Concesionaria
Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida	Explotado por el Concesionario.	Concesionaria
Servicios en Plataforma	Explotado por el Concesionario.	Concesionaria
Servicios Aeronáuticos en General		No se está explotando este servicio

Fuente: Informe de cumplimiento del RSO – Sociedad Concesionaria

Durante el período informado, los servicios que presta la Sociedad Concesionaria se desarrollaron con normalidad, existiendo anomalías poco relevantes que no impliquen un deterioro de la calidad de servicio. La Asesoría a la Inspección Fiscal efectuó un seguimiento mensual de la gestión de los servicios de parte de la Sociedad Concesionaria, informando a la Inspección Fiscal de Explotación de los hallazgos para su posterior gestión ante la Sociedad Concesionaria.

6. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

6.1 Avance de los proyectos de Ingeniería Definitiva

En la siguiente tabla se presenta el estado de avance y versiones del proyecto de ingeniería de acuerdo con cada grupo y sus iteraciones.

Proyecto	Nombre	Fecha Primera Entrega, según BALI	Fecha Primera Entrega, Real	Versión de Iteración	Aprobación (%)
Grupo A	Ingeniería Básica - Área Movimiento - Vialidad y Estacionamientos	28-09-2018	28-09-2018	1	100%
Grupo B1 (IE)	Torre de Control - Obra Gruesa	12-10-2018	12-10-2018	1	100%
Grupo B1 (Ar y Es)	Torre de Control - Arquitectura y Especialidades	12-10-2018	12-10-2018	F	70%
Grupo B2 (IE)	Subestación Eléctrica - Obra Gruesa	12-10-2018	12-10-2018	1	100%
Grupo B2 (Ar y Es)	Subestación Eléctrica - Arquitectura y Especialidades	12-10-2018	12-10-2018	F	70%
Grupo B3 (IE)	Edificios DGAC - Obra Gruesa	12-10-2018	12-10-2018	1	100%
Grupo B3 (Ar y Es)	Edificios DGAC - Arquitectura y Especialidades	12-10-2018	12-10-2018	F	70%
Grupo C1	Planta Tratamiento Aguas Servidas	26-10-2018	26-10-2018	0	100%
Grupo C2	Redes Exteriores – Cercos y Portones – Pasarelas – Paisajismo y Riego	26-10-2018	26-10-2018	0	100%
Grupo D (IE)	Edificio Terminal de Pasajeros - Obra Gruesa	28-12-2018	28-12-2018	0	100%
Grupo D (Ar y Es)	Edificio Terminal de Pasajeros - Arquitectura y Especialidades	28-12-2018	28-12-2018	E	70%
Avance Total		84%			

6.2 Avance de la obra

Durante el período informado, se trabajó en las siguientes obras:

Grupo A: Plataforma Comercial y Vialidad

Plataforma Comercial:

- Preparación de terraplén y base del sector oriente del canal N°3.
- Preparación de terraplén en sector poniente del canal N°3.
- Se corrió cerco provisorio y se excavó el sector contiguo a la calle alfa.
- Se deja fuera de servicio puente de embarque 1 y se instala cerco provisorio para trabajos

Vialidad Eje 2: Excavación y compactación sello de fundación y relleno en terraplén primera capa. Vialidad Eje 4: Excavación y compactación sello de fundación.

Vialidad eje 5: Se cargó hasta nivel de subrasante material bajo 3" en Dm 150 al Dm 210.

Vialidad eje 7: Se trabajó en la detección de redes en forma manual al costado de S/E. Excavación de sector frente a S/E Eléctrica existente.

Vialidad eje 8: Se cargó hasta nivel de subrasante material bajo 3" en Dm 89 al Dm 99.

Estacionamiento Edificio Terminal: Se continúa excavación masiva hasta completar un 75% del área.

Grupo B: Edificios DGAC

Edificio ARO:

Se completo hormigonado del 75% de las zapatas, pedestales y vigas de fundación.

Acceso DGAC: Se completa el hormigonado de todas las fundaciones del sector.

Edificio Administrativo DGAC: Se excava toda el área comprendida entre el eje 1,4, A y D, hasta suelo tipo U3 /sello de fundación.

Provisorio

SSEI- Provisorio: Se reinician los trabajos de excavación de fundaciones. Rellenado con G5 los emplantillados de todas las fundaciones faltantes.

Grupo C: Redes y PTAS

Red de Incendio:

- Se completa la instalación y relleno de la línea de incendios al costado del SSEI provisorio.
- Se instala línea de incendio al costado del eje 4 comenzando el relleno de la zanja.

Banco de ductos (desplazado por Torre de control): Se hace emplantillado de cámara eléctrica e instalan las tuberías.

Banco de ductos (costado de DGAC): excavación zanja.

Planta de tratamiento de AASS: Se termina excavación y se ejecuta emplantillado para las estructuras.

Grupo D: Ampliaciones de Terminal de Pasajeros

Ampliación Sur: Detección de matriz de agua potable que interfiere las fundaciones.

Durante el mes de noviembre 2019 se logra un avance parcial de 0.53% del Presupuesto de Inversión, así se tiene un valor acumulado de 3,18 %. Esto se encuentra por debajo del 15,78% que fue declarado en el Plan de Inversión que acompaña el Programa

6.3 Garantías de Construcción

N° Documento	Banco Emisor	Monto Garantía (UF)	Inicio	Término
6600037231	Consorcio	4.000	12.07.2019	30.09.2021
6600037215	Consorcio	4.000	12.07.2019	30.09.2021
6600037222	Consorcio	4.000	12.07.2019	30.09.2021
6600037247	Consorcio	4.000	12.07.2019	30.09.2021
6600037172	Consorcio	4.000	12.07.2019	30.09.2021
6600037208	Consorcio	4.000	12.07.2019	30.09.2021
6600037197	Consorcio	4.000	12.07.2019	30.09.2021

N° Documento	Banco Emisor	Monto Garantía (UF)	Inicio	Término
6600037181	Consorcio	4.000	12.07.2019	30.09.2021
6600037158	Consorcio	4.000	12.07.2019	30.09.2021
6600037165	Consorcio	4.000	12.07.2019	30.09.2021
TOTAL (UF)		40.000		

6.4 Pólizas de Seguro

- **Póliza de Responsabilidad Civil**

La Sociedad Concesionaria mediante carta GG-SCAS-465-19 del 29.05.2019 hizo entrega de la Póliza N° 6.019.328 Chubb con una vigencia hasta el 01.05.2021. A la fecha se han entregado Endosos a esta Póliza y están en proceso de revisión, por lo que está pendiente su aprobación.

- **Póliza de Catástrofe**

La Sociedad Concesionaria mediante carta GG-SCAS-457-19 del 16.05.2019 hizo entrega de la Póliza N° 203-19-00006356 de Mapfre Seguros con una vigencia hasta el 26.12.2022. A la fecha se han entregado Endosos a esta Póliza y están en proceso de revisión, por lo que está pendiente su aprobación.
