

### 1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

<b>Nombre del Contrato</b>	Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli
<b>Tipología del Contrato</b>	Ruta Concesionada.
<b>Mandante del Contrato</b>	Ministerio de Obras Públicas.
<b>Emplazamiento del Proyecto</b>	Regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía / Comunas Chillán Viejo, Bulnes, Pemuco, Cabrero, Los Ángeles, Mulchén y Collipulli
<b>Presupuesto Oficial del Proyecto</b>	<b>UF 14.215.000.</b>
<b>Superficie del Proyecto</b>	169 kilómetros aprox.
<b>Nombre del Concesionario</b>	Sociedad Concesionaria Ruta 5 Chillán – Collipulli S.A.
<b>Accionistas del Concesionario</b>	China Railway Construction corporation (International) Limited con un-99,9% y China Railway Construction Mexico con un-0,01%.
<b>Decreto de Adjudicación</b>	Decreto Supremo MOP N° 214 de 14 diciembre de 2022, publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2023.
<b>Plazo de la Concesión</b>	Plazo variable (VPI ≥ ITC), o un máximo de 360 meses (30 años)
<b>Inicio de Ejecución de las Obras</b>	No hay obras en ejecución.
<b>Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Preexistentes Sector 1 del 11 de febrero 2023</b>	<b>SUBSECTOR A)</b> Desde el inicio de la Concesión, km 412,800 hasta Inicio Baipás Los Ángeles km 500,000. <b>SUBSECTOR B)</b> Desde el Inicio Baipás Los Ángeles km 500,000 hasta sector Sur de Collipulli km 578,800.
<b>Puesta en Servicio Definitiva de las Obras</b>	Primer semestre del 2029
<b>Término de la Concesión</b>	Febrero 2053
<b>Inspector Fiscal Titular</b>	Lester Poblete Godoy
<b>Inspector Fiscal Suplente</b>	Ricardo Oyarzo Cárcamo
<b>Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción</b>	Axioma Ingenieros Consultores S.A.
<b>Fono Comercial</b>	600 006 1770
<b>Fono Emergencia</b>	600 252 7000
<b>Modificaciones al Contrato</b>	No tiene.
<b>Página Web de la Concesión</b>	<a href="https://www.rutasur.cl">https://www.rutasur.cl</a>

Tabla N° 1. Características del contrato. Fuente: Elaboración propia

### 2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto se emplaza en las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía. Abarca las comunas de Chillán Viejo, Bulnes y Pemuco, en la provincia de Diguillín; de Cabrero, Los Ángeles y Mulchén, en la provincia del Biobío; y, de Collipulli y Ercilla, en la provincia de Malleco.

El tramo que comprende el proyecto de la concesión, tiene una longitud aproximada de 169 kilómetros y se extiende desde el sur de la ciudad de Chillán Viejo hasta el norte de la comuna de Ercilla.

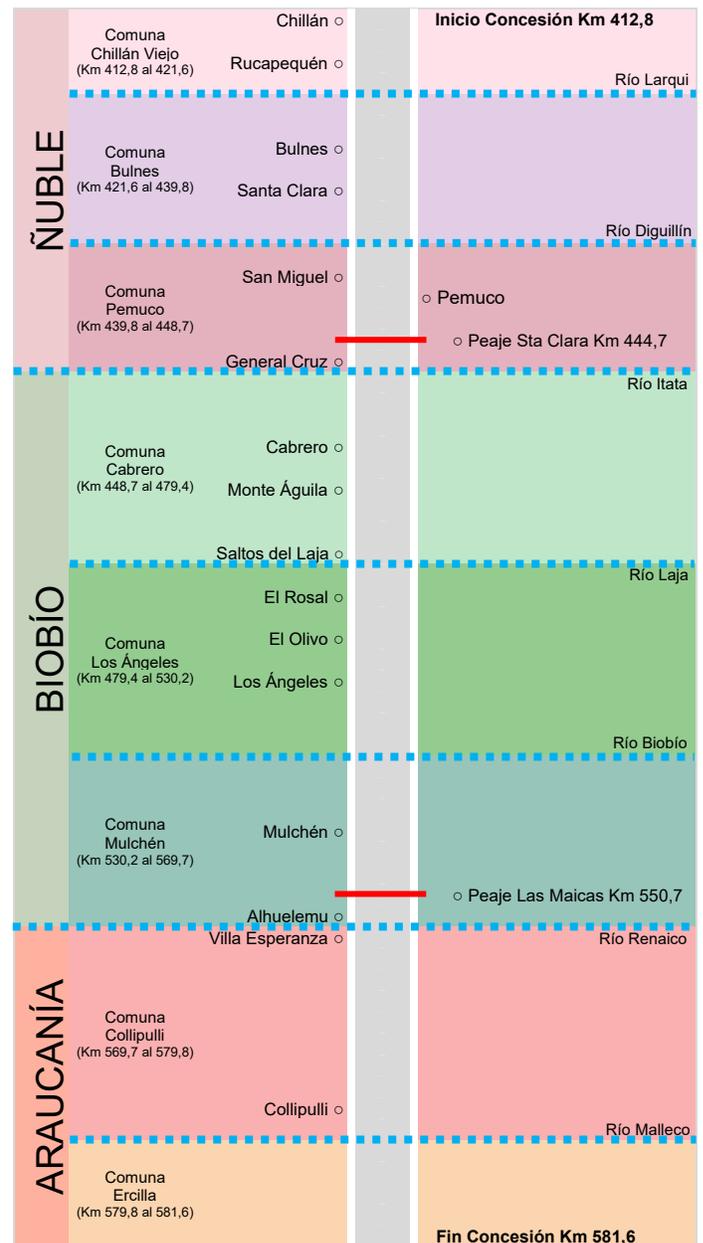


Imagen N° 1. Esquema ubicación del proyecto. Fuente: Elaboración Propia

**3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El Proyecto consiste en términos generales en el mejoramiento, construcción, mantención y explotación tanto de las obras preexistentes, como de las nuevas obras del tramo que comprende la obra pública fiscal denominada “Concesión Ruta 5 Tramo Chillán-Collipulli”; lo anterior, con el objeto de mejorar el estándar técnico y los niveles de servicio de la ruta y, por consiguiente, garantizar condiciones de seguridad y confort a sus usuarios.

Este contrato fue adjudicado mediante D.S. MOP N° 214 de 14 de diciembre del 2022, y publicado en el Diario Oficial el día 11 de febrero de 2023, dando inicio a la concesión el mismo día.

Mediante Resolución Exenta DGC N°452 de fecha 14.02.2023, se autorizó la Puesta en Servicio Provisoria de las obras preexistentes, denominada “fase 1 de la etapa de explotación”, a contar de las 00:00 horas del día 15.02.2023, en reemplazo de la extinta obra pública fiscal denominada “Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Chillán – Collipulli”, contrato operado por Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.

Actualmente el contrato se encuentra en Fase 1 de la Etapa de Explotación, y Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción.

**4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO**

Como parte de las principales obras que conforman el Proyecto y que se encuentran contenidas en las Bases de Licitación y en los Antecedentes Referenciales indicados en el artículo 1.3.3, de acuerdo a la tabla que se muestra a continuación:

Sector	Subsector	Descripción	Dm Inicio aprox.	Dm Final aprox.	Longitud (km)
1	A	Inicio concesión- Inicio baipás Los Angeles	412,800 <sup>(1)</sup>	500.000 <sup>(1)</sup>	87,2
	B	Inicio baipás Los Angeles – sector sur de Collipulli	500.000 <sup>(1)</sup>	578,000 <sup>(1)</sup>	78,8
2	C	Variante Collipulli	575,000 <sup>(2)</sup>	581,600 <sup>(2)</sup>	6,6

(1): Dm referido al eje actual de Ruta 5  
 (2): Dm referido al proyecto de concesión

Tabla N° 2. Sectorización del proyecto. Fuente: Art. 1.3.1.1 BALI

**i) Sector 1:** Para este Sector de la concesión, definido en el artículo precedente, el Proyecto considera la construcción por parte del Concesionario de obras de rehabilitación para la infraestructura existente y nuevas obras de mejoramiento para la Ruta 5, las cuales se enuncian en términos generales a continuación:

**a) Obras de rehabilitación para Ruta 5**

- a.1) Rectificación del trazado, considerando rectificaciones de curvas y pendientes, de acuerdo a las recomendaciones de diseño del Manual de Carreteras.
- a.2) Rehabilitación y/o reposición de pavimentos en las calzadas preexistentes.
- a.3) Actualización de la seguridad vial para la demarcación vertical y horizontal y el sistema de contención, de acuerdo a los nuevos estándares normativos y a las exigencias establecidas en el Manual de Señalización de Tránsito del MTT.

- a.4) Reconfiguración de paraderos, por presentar longitudes fuera de norma en sus pistas de aceleración o deceleración y ausencia de circuitos peatonales.
- a.5) Reemplazo de puentes existentes, por presentar graves deficiencias en cuanto a capacidad de carga móvil, sección transversal del tablero y/o problemas de socavación en fundaciones.
- a.6) Intervención en puentes existentes y pasos desnivelados, debido a la actualización de los criterios sísmicos.
- a.7) Reemplazo de pasos desnivelados.
- a.8) Mejoramiento de accesos a la ruta.
- a.9) Reemplazo de pasarelas existentes.
- a.10) Actualización de pasarelas por accesibilidad universal.
- a.11) Tratamiento de taludes.
- a.12) Mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje.
- a.13) Ensanche de áreas para detención para teléfonos S.O.S.
- a.14) Elementos de seguridad para las estructuras existentes que cruzan la Ruta 5.  
 Incluye iluminación y valla antivandálica en pasarelas peatonales, pasos desnivelados y puentes.
- a.15) Modificaciones de las áreas de servicios generales y de atención de emergencias, que consideran ampliaciones y remodelaciones.
- a.16) Modificaciones y rediseño de la plaza de pesaje con actualización tecnológica.

**b) Obras de mejoramiento para Ruta 5**

- b.1) Construcción de terceras pistas en distintos tramos a lo largo del Proyecto.
- b.2) Implementación de un nuevo sistema de cobro de peaje electrónico.
- b.3) Nuevos atravesos con rutas existentes.
- b.4) Nuevos accesos a la ruta
- b.5) Nuevos retornos.
- b.6) Obras de conectividad transversal, las cuales consideran pavimentación de caminos.
- b.7) Incorporación de nuevas pasarelas peatonales, paraderos de buses y veredas peatonales.
- b.8) Rectificaciones de ancho de plataforma.
- b.9) Implementación de elementos de seguridad vial y señalización de tránsito, incluyendo señalización variable.
- b.10) Áreas de servicios generales para sólo transportistas con cargas peligrosas
- b.11) Iluminación y paisajismo
- b.12) Cierres perimetrales.
- b.13) Tramos de calles locales. Calles de servicio en los sectores donde se requiere controlar la fricción lateral.
- b.14) Tramos de ciclovías.

**ii) Sector 2:** Para este Sector de la concesión, definido en el artículo precedente, el Proyecto considera una serie de obras para su construcción por parte del Concesionario, las que se enuncian en términos generales a continuación:

- a) Construcción de una variante a la ciudad de Collipulli, mediante un perfil en doble calzada expresa con 2 (dos) pistas por sentido.
- b) Enlaces desnivelados.
- c) Atravesos con vías existentes.
- d) Puente Malleco, sobre el río Malleco.
- e) Implementación de elementos de seguridad y señalización de vial, incluyendo señalización variable.
- f) Un sistema de cobro de peaje electrónico.
- g) Saneamiento y drenaje.
- h) Iluminación y paisajismo.

- Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en áreas de servicios y peajes de la concesión.

**SERVICIOS DE ATENCIÓN COMERCIAL**

La Sociedad Concesionaria deberá poner a disposición de los usuarios, servicios de atención comercial, los cuales deberán ser presenciales, telefónicos y virtual. Dentro de los servicios que deberán estar a disposición a lo menos, y sin ser taxativos, se identifican los siguientes:

- Reclamos y Consultas de los usuarios.
- Obtención de copias de documentos de cobro.
- Canales de Recaudación.
- Información de Infraestructores.

**Servicios complementarios**

- Recaptación de deudas.
- Cierre de convenios.
- Atención generalizada de las solicitudes de clientes.



*Imagen N° 2. Plaza de Peaje Santa Clara. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Sur*

**5. BENEFICIOS DEL PROYECTO**

El tramo Chillán-Collipulli permite ahorrar tiempos de viaje, ofrece más seguridad vial, confort a los usuarios y conecta en forma expedita a grandes centros urbanos del centro y sur del país. Une a importantes centros productivos con mercados locales, empalmes a puertos y pasos fronterizos de gran actividad.

Potencia una relación interregional más fluida entre las comunas y provincias de las Regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Tiene vigilancia caminera las 24 horas, 166 citófonos S.O.S. de emergencia cada dos kilómetros a ambos lados de la ruta, estacionamientos para camiones, auxilio mecánico con grúas de alto tonelaje y livianas, ambulancia y primeros auxilios, servicios de control, demarcación, señalización, tres áreas de servicios generales, con espacios de recreo, agua potable y servicios higiénicos.

Con la implementación de un sistema TAG (Free Flow y Stop & Go), se otorga mayor fluidez al tráfico, evitando las congestiones en plazas de peajes, logrando como objetivo reducir los tiempos de espera.

Servicios contemplados en el contrato de concesión:

- Conservación de las Obras preexistentes y Nuevas.
- Aseo y Control de Plagas en Áreas de Servicios.
- Gestión de Basuras y Residuos en Áreas de Servicios.
- Agua Potable y Tratamiento de Aguas Servidas.
- Atención de Emergencias para usuarios.

**6. TARIFAS**

La Tarifa Base, en pesos chilenos a noviembre del 2020, según Bases de Licitación es de \$2.400, para peajes troncales, y laterales, artículo 1.14.2.1 "Tarifas Base y Formulas de Reajuste Tarifario"

La tarifa Base para Punto de Cobro se reajustará el 1 de enero de cada año de explotación o cada vez que se compruebe una inflación acumulada desde el último reajuste igual o superior al 15%.

La Sociedad Concesionaria deberá informar el reajuste anual al Inspector Fiscal con, a lo menos, 20 (veinte) días de anticipación al término de cada año calendario de operación mediante carta, indicando la tarifa que aplicará en el próximo periodo.

**TABLA DE TARIFA AÑO 3 DE EXPLOTACIÓN (2025)**

Tipo de Vehículo	Clase de Vehículo	Tarifa (\$)	
		Troncales	Laterales
1	Motos, cuatrimotos y motonetas	1.000	200
2	Autos y camionetas	3.200	800
3	Autos con remolque y camionetas con remolque	4.800	1.200
4	Buses de dos ejes y casas rodantes	5.800	1.500
5	Camiones de dos ejes	5.800	1.500
6	Buses de más de dos ejes	10.300	2.600
7	Camiones de más de dos ejes	10.300	2.600

*Tabla N° 3. Tarifas año 2025. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Sur*

## **7. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA**

Se continúa procesos de Revisión por parte de la Asesoría a la Inspección Fiscal para el Proyecto de Ingeniería de Detalle Proyecto Vial Sector 1 (Subsector A y Subsector B) Rev. M y para el Proyecto de Ingeniería de Detalle Otros Proyectos Sector 1 (Subsector A y Subsector B) Rev. L.

A la fecha se registra un avance del 62,25% en cuanto al desarrollo del proyecto de ingeniería de detalle

Avance de Ejecución del PID (%)	62,25 %
Avance de Aprobación del PID (%)	0,00 %

Cabe señalar que este avance se calcula en consideración a lo establecido en el “Procedimiento estandarización cálculo del avance de ejecución y aprobación del proyecto de ingeniería definitiva (PID)”, División de Construcción de la Dirección General de Concesiones.

## **8. MANO DE OBRA**

Total	Mes junio 2025
Mano de Obra Ingeniería	63
Mano de Obra Construcción	0
Mano de Obra Operación	627
Empleos Indirectos	35

## **9. HECHOS RELEVANTES**

Sin hechos relevantes durante el periodo.

**10. ETAPA EXPLOTACIÓN**

**10.1. INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR ETAPA EXPLOTACIÓN**

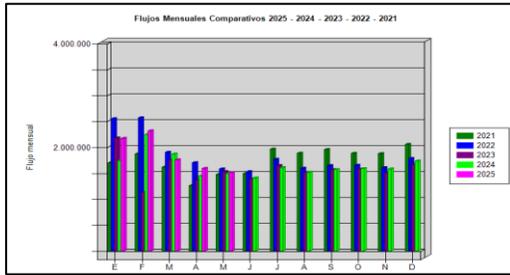


Gráfico N° 1. Flujo Mensual Comparativos 2021 a junio de 2025. Fuente: Reporte 28 – SICE

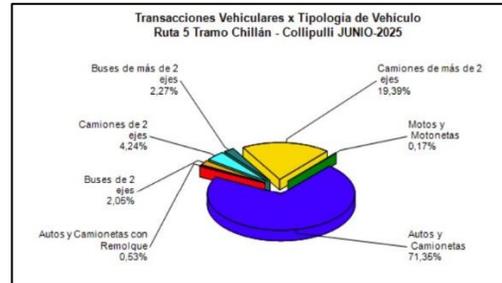


Gráfico N° 2. Distribución por Flujos (Transacciones) por categoría de vehículos. Fuente: Reporte 29 – SICE

Como indica el gráfico 1, el flujo vehicular para mayo del año 2025 fue de 1.520.283 vehículos, mayor en un 0,68% respecto al mes de mayo del mismo año, que fue de 1.509.972. En comparación con el mismo mes de mayo del año 2024 se muestra que fueron mayores en un 8,19%.

El flujo vehicular distribuidos por categorías, indicados en gráfico 2, para el mes de junio, la mayor participación al igual que meses anteriores es flujos de autos y camionetas con un 71,35% del total. En segundo lugar, la categoría que le sigue es camiones de más de dos ejes que representa un 19,39%, el resto las categorías suman un 9,26%.

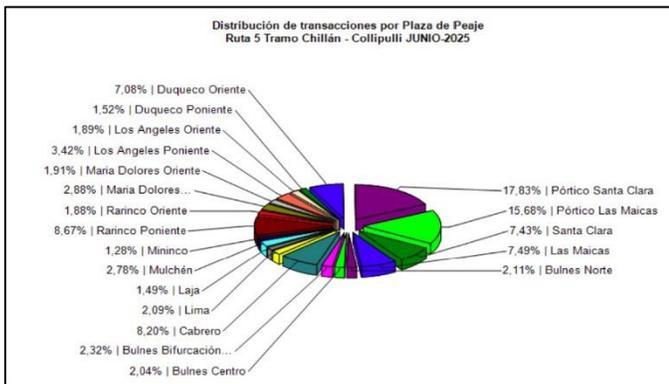


Gráfico N° 3. Distribución por Flujos de Peajes a junio 2025. Fuente: Reporte 29 – SICE

En el gráfico N°3, se indican flujos por plaza de peajes y destacan los troncales de Santa Clara con tránsitos con TAG y pago manual con un 25,26% y el pórtico Las Maicas con TAG y manual 23,17% sumando un 48,43% del total. Destacan también los Laterales: Cabrero 8,20%, Duqueco Oriente 7,08%, Rarínco Poniente con un 8,67%, el resto de los 16 pórticos participan un 27,62% del total.

**FLUJOS (TRANSACCIONES) HISTÓRICOS ÚLTIMOS 5 AÑOS A ENERO 2025**

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2021	1.699.731	1.869.945	1.615.429	1.260.276	1.474.383	1.491.249	1.962.712	1.883.240	1.954.213	1.881.164	1.876.164	2.055.377
2022	2.549.895	2.566.737	1.901.045	1.701.225	1.581.276	1.528.442	1.766.875	1.592.858	1.645.576	1.652.456	1.605.316	1.782.495
2023	2.179.119	2.282.259	1.753.367	1.587.579	1.528.983	1.385.364	1.644.558	1.512.925	1.567.165	1.577.175	1.507.748	1.666.603
2024	1.739.925	2.245.871	1.866.676	1.446.829	1.489.556	1.405.161	1.604.385	1.515.988	1.568.811	1.586.637	1.579.586	1.732.213
2025	2.169.448	2.314.055	1.753.955	1.590.053	1.509.972	1.520.283						

Tabla N° 4. Flujos históricos últimos 5 años. Fuente: SICE

**NOTA:** Datos entregados por la Sociedad Concesionaria. Cabe señalar que los flujos en el SICE para el mes de febrero del 2023 solo se muestran los flujos del día 1 al 14 de febrero son 1.130.217 al periodo informado por la S.C. Ruta del Bosque S.A. y del 15 al 28 de febrero a 1.130.396 informado por Ruta Sur S.A.

**10.2. INFORMACIÓN DE INGRESOS**



Gráfico N° 6. Accidentabilidad mes de abril 2025. Fuente: Reportes 33, 63 y 64 SICE.

**DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES POR TIPO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2025**

	Distribución	Porcentaje
<b>Choque</b>	11	35,48%
<b>Colisión</b>	9	29,03%
<b>Volcadura</b>	2	6,45%
<b>Otros</b>	5	16,13%
<b>Impacto con animal</b>	4	12,90%
<b>Total</b>	31	100,00%

La distribución de los 31 accidentes ocurridos en junio de 2025 por tipo, es la siguiente: 11 Choques con un 35,48%; 9 Colisiones que representan un 29,03%; 2 Volcaduras con el 6,45%, 5 Otros accidentes con un 16,13% y 4 Impacto con animal un 12,90%.

Tabla N° 5. Distribución de accidentes por tipo junio 2025. Fuente: Reporte 63 SICE

**COMPARACIÓN DE ACCIDENTES CON Y SIN LESIONADOS 2024/2025.**

	Ene 24	Ene 25	Feb 24	Feb 25	Mar 24	Mar 25	Abr 24	Abr 25	May 24	May 25	Jun 24	Jun 25	Jul 24	Jul 25	Ago 24	Ago 25	Sep 24	Sep 25	Oct 24	Oct 25	Nov 24	Nov 25	Dic 24	Dic 25
Con Lesionados	13	22	12	0	17	15	7	9	10	7	5	10	18	0	5	0	15	0	15	0	10	0	13	0
Sin Lesionados	28	43	41	0	27	37	21	23	37	19	29	21	31	0	22	0	44	0	28	0	28	0	25	0
Total Accidentes	41	65	53	61	44	52	28	32	47	26	34	31	49	0	27	0	59	0	43	0	38	0	38	0

Tabla N° 6. Comparación de accidentes con y sin lesionados 2024/25. Fuente: Reporte 33 SICE

Durante el mes de junio de 2025, se registraron 31 accidentes de tránsito, y en el mismo mes del año 2024 fueron 34 (-8,82% en el 2025), dado lo cual, se puede señalar que se presentó un leve decremento en la cantidad de accidentes, comparado con igual mes del año anterior. Por otra parte, la cantidad de accidentes con lesionados, 10 en 2025, muestra un aumento respecto del año 2024 en que se informaron sólo 5.

**ACCIDENTES ACUMULADOS ANUALES (ÚLTIMOS 5 AÑOS)**

Obra Concesionada:		Ruta 5 Tramo Chillan - Collipulli										Fecha desde:		01.06.2025	
Concesionaria:		Ruta Sur										Fecha hasta:		30.06.2025	
Mes	Accidentes		Víctimas				Total Lesionados	Tipo de Accidentes con Lesionados							
	Total	C/lesionados	Muertos	Graves	M. Graves	Leves		Atropello	Caída	Volcadura	Colisión	Choque	Otros		
2021	524	147	7	21	25	187	233	2	2	24	58	54	7		
2022	490	139	15	17	18	187	222	4	1	20	59	41	14		
2023	426	147	18	15	45	167	227	3	3	38	69	30	4		
2024	500	131	16	20	25	156	201	3	3	26	49	39	11		
2025	267	75	4	14	11	98	123	0	1	8	38	22	6		

Tabla N° 7. Accidentes Acumulados Anuales últimos 5 años. Fuente: Sociedad Concesionaria

La cantidad de accidentes acumulados en 2025 es de 267, en el primer semestre del año, lo que muestra que se presentó una pequeña variación de la tendencia levemente a la baja en los últimos 3 meses, en comparación con el mismo período del año anterior, sin embargo, aún la cantidad de accidentes hasta la fecha está por sobre los ocurridos en 2024 (246) con una variación del +8,53%.

**RECLAMOS DE USUARIOS**

CASUÍSTICAS	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	septiembre 2024	octubre 2024	noviembre 2024	diciembre 2024	enero 2025	febrero 2025	marzo 2025	abril 2025	mayo 2025	junio 2025	Totales
Calidad de servicio en oficina de atención al usuario				1	2		3						1	7

Estado de baños y dependencias en áreas de servicio	1		2				1			1	1	1	1	8
Atención en plaza de peaje					1		1					1		3
Comportamiento de personal de aseo y mantenimiento		1		2		1	1	1		1				7
Calidad de atención de emergencia o asistencia en ruta			1		1		1		1			1		5
Nº de cajas disponibles				1										1
Tiempo de espera en plaza de peaje							1							1
Clasificación tarifaria									1			1		2
Modalidad de cobro en plaza de peaje	1						3							4
Vuelto mal entregado							1							1
Sistema de pago diferido								1						1
Acciones de cobranza								1						1
Calidad Atención Oficina Comercial												1		1
Devolución de TAG					1					1				2
Duplicidad de Cobro					1									1
Reposición y mantenimiento de cerco		1												1
Necesidad de nuevas obras					1									1
Estado de pavimento							1							1
Limpieza de la vía y sus alrededores									1					1
Estado de paisajismo	1													1
Estado de señalética								1						1
Presencia de vendedores ambulantes	2													2
Animal se cruza en la vía									1					1
Objeto extraño ocupa la vía		4			2			2		2	1			11
Otros (Registrar)			1								1			2
<b>Totales</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>66</b>

Tabla N° 8. Tabla anual de reclamos por casuística. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Sur S.A.

**DISTRIBUCIÓN DE RECLAMOS EN %**

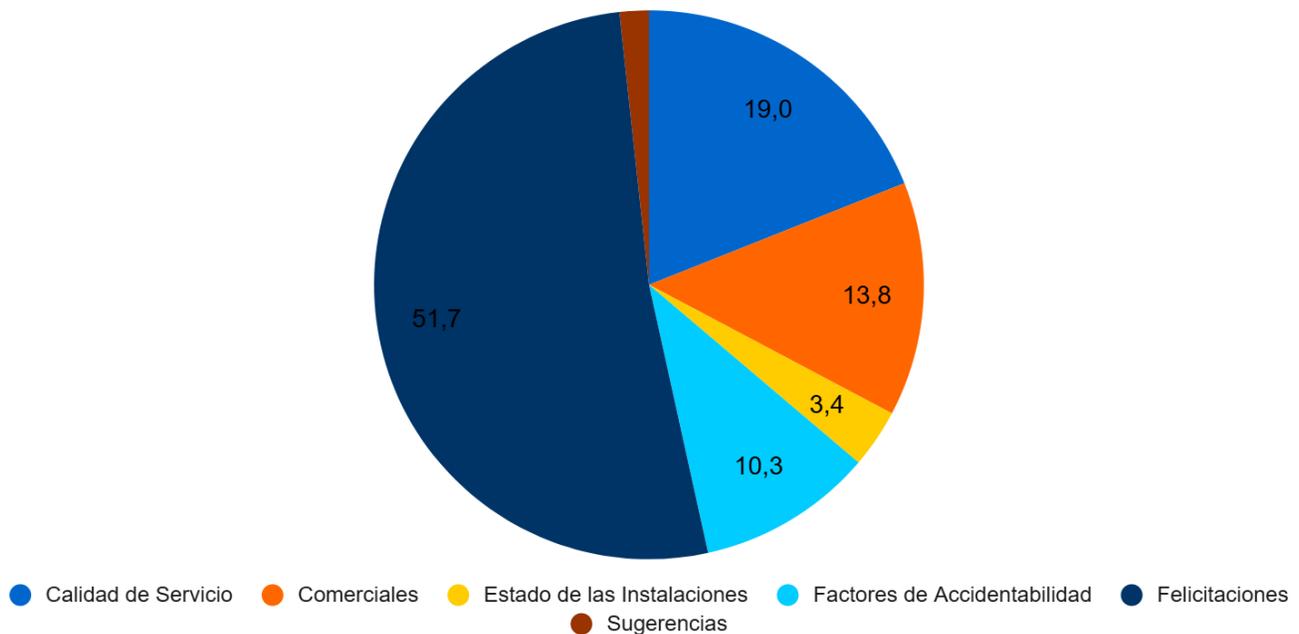


Gráfico N° 7. Distribución de reclamos. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Sur

Los reclamos de usuarios se clasifican en 6 grandes grupos. En este mes se concentran en temas asociados a: felicitaciones, factores de accidentabilidad, comercial, calidad de servicio y factores de accidentabilidad.

#### **10.4. HECHOS RELEVANTES EXPLOTACIÓN**

En el periodo en evaluación, que corresponde a junio de 2025, se hace un análisis de las condiciones experimentadas y de las de las instancias más relevantes de la explotación del concesionario Ruta 5 tramo Chillán-Collipulli, en cada uno de los aspectos que comprende la citada etapa.

Durante este periodo se ha observado una instancia relevante de alta congestión vehicular por accidente entre bus y camión en km. 492,500, lado poniente, el cual se extendió del día viernes 27.06 hasta el sábado 28.06.2025. En cuanto al periodo de contingencia por el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, evento que aconteció el fin de semana del 20 al 23 de junio del 2025, se puede decir que pese a que hubo un incremento en el flujo vehicular, no se registró períodos de mayor congestión en dentro de los límites del contrato concesionado. En el periodo en cuestión tampoco se ha evidenciado la ocurrencia de eventos de alta connotación publica como incendios forestales, atentados, etc.

Por otra parte, se evidencio que durante el periodo en descripción, la ocurrencia de accidentes e incidentes vehiculares ha sido de relevancia media, no observado fallecidos en el periodo, en esta misma línea se observó la ocurrencia de 31 accidentes, donde en la gran mayoría no se afectó el normal tránsito de los usuarios en los sectores comprometidos.

Durante este periodo, las labores de conservación, en lo medular se desarrollaron de forma adecuada, atendiendo en específico condiciones de limpieza y despeje de faja, conservación de pavimentos, reparación de barreras metálicas de contención siniestradas, rectificación y limpieza de cauces, reposición de cercos, reposición de señales verticales, reparación de los sistemas de iluminación, poniendo especial énfasis en la conservación y operación adecuada de sistemas de saneamiento, en esta misma línea de análisis y respecto de las líneas de acción de conservación implementadas por la SC, se atendió de forma relevante el programa de conservación 2025 para el periodo de junio de 2025.

**10.5. REGISTRO FOTOGRAFICO**



Inspección Conservación de Pavimentos.



Trabajos de Mantenimiento y Conservación Pavimentos



Trabajos de Mantenimiento y Conservación de taludes con exceso de vegetación. Poda de árboles
