

1. ANTECEDENTES GENERALES

CONTRATO DE CONCESIÓN

Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago S.A.
Decreto de Adjudicación	D.S. MOP N° 234 del 26 de marzo de 2004
Publicación Diario Oficial de D. S. de Adjudicación	04 de mayo de 2004
Inicio de la Concesión	04 de mayo de 2004
Plazo máximo de la Concesión	273 meses desde inicio de Concesión
Inversión Total	5.259.126 U.F.
Puesta en Servicio Provisoria Fase I	30.12.2005 por Res. 4152 del 29.12.2005
Puesta en Servicio Provisoria Fase II	22.06.2007 por Res. 1989 del 21.06.2007
Puesta en Servicio Definitiva	12.01.2008 por Res. 29 del 11.01.2008
Inspector Fiscal	Jorge Roa Fuentes
Término de Concesión	29 de diciembre de 2025

El Centro de Justicia de Santiago corresponde a un conjunto de edificaciones construidas con ocasión de la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana, bajo la modalidad de Contrato de Concesión, para la prestación de servicios.

Este conjunto de edificaciones, alberga las dependencias del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y del Poder Judicial (Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal), y edificio de la Zona de Seguridad y Transición, constituyendo el principal centro de actividades del sistema judicial capitalino.

En su materialidad, predomina el hormigón a la vista y revestimiento de muros cortinas, con elementos adicionales en acero galvanizado, mamparas acristaladas y pavimentos en piedra pizarra, que proporcionan una imagen arquitectónica moderna y conceptualmente propia.

La noción que sistematiza el proyecto, es la segregación de la circulación peatonal. Es así como la operación de los edificios tienen el carácter de independencia funcional, por lo que sus circulaciones han sido proyectadas separadamente. Tanto para los accesos de público como para las dependencias de funcionarios.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de Explotación. Esta comprende: Operación de la infraestructura, conservación o mantención de instalaciones, prestación de los servicios convenidos en el Contrato de Concesión (Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios.) Para ello, el Estado de Chile, paga un subsidio semestral, de acuerdo a los estándares establecidos en las Bases de Licitación y la documentación contractual asociada.

2. CUADRO DE SUPERFICIES

EDIFICIO	SUPERFICIE
Tribunales de Garantía (Torres A, B, E, y F)	51.270,6 m ²
Tribunales Orales (Torres C y D)	29.513,98 m ²
Defensoría Penal Pública	6.124,05 m ²
Ministerio Público (Fiscalía)	11.315,2 m ²
Seguridad y Transición (ZST)	7.839,3 m ²
Estacionamientos Interiores	10.517,57 m ²
Otras Áreas	4.162,61 m ²
TOTAL	120.743.31 m²

3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS BÁSICOS

Mantenimiento de la Infraestructura.
Mantenimiento de Equipamiento Estándar.
Mantenimiento del Equipamiento y Sistema de Seguridad.
Servicio de Seguridad y Vigilancia.
Servicio de Aseo y Sanitización.
Mantención de Áreas Verdes.
Administración de Informaciones Generales.
Servicio de Primeros Auxilios.

SERVICIOS ESPECIALES OBLIGATORIOS

Estacionamiento Público.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FACULTATIVOS

Cafetería en Edificio Fiscalía.
Servicio de Programación de Tarjetas de Aproximación.
Servicio de Protección Especial.



3.1. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO

ACTIVIDADES DE MANTENCIÓN PREVENTIVAS PROGRAMADAS JULIO Y AGOSTO 2017

DETALLE	JULIO 2017		AGOSTO 2017	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Actividades de Mantenimiento Preventiva Ejecutadas	348	100	354	100
Actividades de Mantenimiento No Ejecutadas	0	0	0	0
TOTAL ACTIVIDADES INSPECCIONADAS	348	100	354	100

Las actividades de Mantenimiento Preventivas Ejecutadas, presentan cumplimiento de 100% para los meses de junio y julio. El promedio de actividades de los últimos seis meses corresponde a 346 actividades.




3.2. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES PREVENTIVAS ACUMULADAS AGOSTO 2017


ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
137	146	178	180	182	158	180	188	0	0	0	0	EMITIDAS
137	124	145	168	174	152	164	167	0	0	0	0	EJECUTADAS

Las actividades preventivas programadas a realizar por personal de la Sociedad Concesionaria durante el mes de agosto totalizaron 188 órdenes de trabajo emitidas, de las cuales fueron ejecutadas 167 quedando 21 actividades pendientes, que se reprograman para el siguiente periodo.

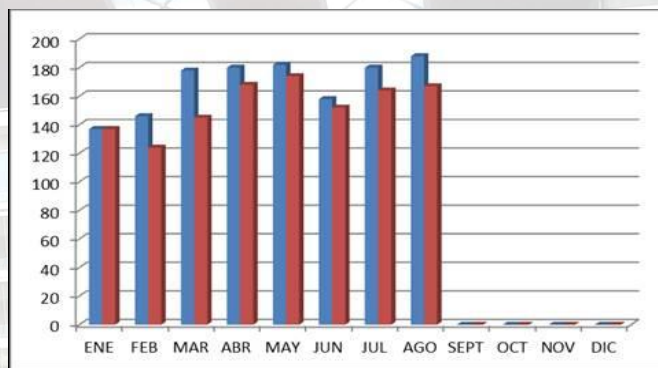

ACTIVIDADES CORRECTIVAS POR EDIFICIO, ENERO A AGOSTO 2017

	EDIFICIOS												
	A	B	C	D	E	F	FIS	DEF	ZST	SC	EXPL		CJS
ENERO	6	8	8	7	10	8	8	0	0	0	0	0	55
FEBRERO	4	6	6	15	6	4	7	0	4	0	0	0	52
MARZO	7	11	11	9	9	7	13	0	7	1	1	3	79
ABRIL	8	5	18	13	8	7	11	0	1	0	2	2	75
MAYO	17	13	12	18	13	14	25	3	0	1	0	24	140
JUNIO	10	8	11	15	6	8	16	6	1	1	1	4	87
JULIO	5	2	9	5	11	8	11	19	0	0	5	7	82
AGOSTO	2	2	7	9	7	2	13	3	5	1	0	10	61
TOTALES	59	55	82	91	70	58	104	31	18	4	9	50	631

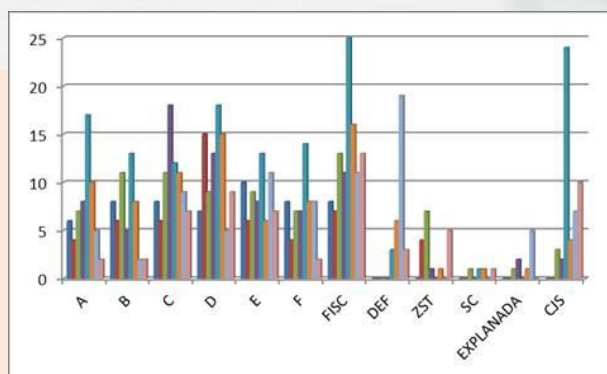

DETALLE ACTIVIDADES DE MANTENCIÓN CORRECTIVA - AGOSTO 2017	CANTIDAD	PORCENTAJE
CLIMATIZACIÓN	69	34.3
ENCHUFES	20	10
ILUMINACIÓN	19	9.5
ASCENSORES	4	2
CERRADURAS MAGNÉTICAS	18	8.9
OTROS	71	35.3
TOTAL ACTIVIDADES INSPECCIONADAS	201	100%




3.3. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Este servicio debe controlar permanentemente la seguridad y vigilancia preventiva al interior de las instalaciones del Centro de Justicia, tanto en días laborales, como sábados, domingos y festivos, aplicando procedimientos, métodos y estrategias, con el objeto de resguardar la integridad física de las personas, bienes, patrimonio e información, con el propósito de minimizar los riesgos de robos, hurtos, agresiones o cualquier hecho delictual.

REQUERIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES A TRAVÉS DE SISTEMA "CALL CENTER"

AGOSTO 2017	SUB TOTAL	PORCENTAJE
SSVV Ingreso alimentos	128	33
SSVV Acceso vehículos	116	24.1
SSVV Autoriza Acceso Personas	78	12
Victimas y Testigos	33	7.3
Solicitud Grabaciones	3	1.6
Otros Seguridad y Riesgos	109	22
TOTAL SEGURIDAD	467	100 %

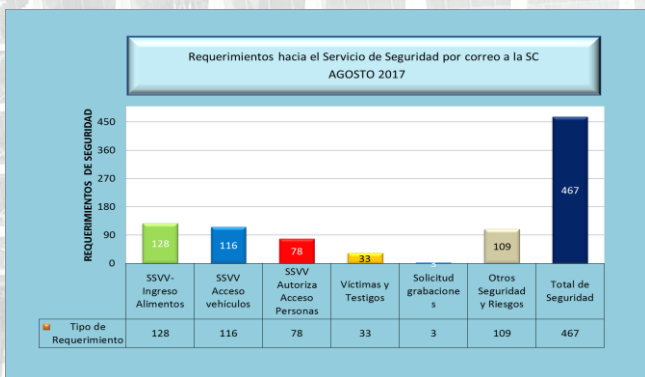


3.4. SERVICIO DE ASEO Y SANITIZACIÓN

Este servicio debe ejecutarse en concordancia con los requerimientos indicados en el artículo 2.7.2.4.2 de las Bases de Licitación y de acuerdo con lo establecido en el Programa de Servicios Básicos y Especiales Obligatorios. La prestación debe mantener al Centro de Justicia en óptimas condiciones de orden, limpieza y libre de plagas.

REQUERIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES A TRAVÉS DE SISTEMA "CALL CENTER"

AGOSTO - 2017	TOTAL	Reposición Insumos	Imprevistos	Llamado Supervisor	Aseo Deficiente	Coordinación S. Extraordinarios	Felicitaciones
DISTRIBUCIÓN REQUERIMIENTOS	170	20	121	8	9	11	1
Edificio A (G1)	23	3	19	0	1	0	0
Edificio B (G3)	19	1	13	2	2	1	0
Edificio C (O1)	47	3	31	5	4	4	0
Edificio D (O2)	32	5	22	0	2	3	0
Edificio E (G4)	14	2	11	0	0	1	0
Edificio F (G2)	9	1	7	1	0	0	0
Fiscalía	20	5	13	0	0	2	0
Defensoría	0	0	5	0	0	0	1

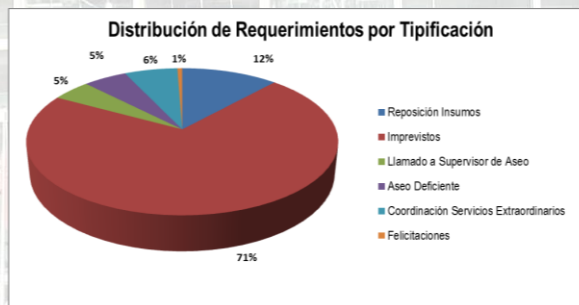

4. HECHOS RELEVANTES

- El Servicio de Seguridad y Vigilancia mantiene un incremento en la carga y actividades desarrolladas, debido a la implementación del nuevo procedimiento de acceso de personas a los edificios de tribunales, que busca elevar el nivel de seguridad antes aplicado. Esta Inspección Fiscal instruye al Concesionario en la implementación de estas medidas con carácter de urgente, considerando nuevos recursos humanos y equipamiento electrónico.
- Actualmente, los avances en la reposición de Sala Eléctrica de Torre C (Oral 1), se desarrollan en torno a la supervisión en terreno de la transferencia de la energización de los tableros desde Sala Eléctrica de Edificio Oral 1, quedando al término del periodo sólo dos circuitos en ser alimentados: Tableros de Distribución y Alumbrado del subterráneo. Por otro lado, la empresa subcontratista, encargada de los trabajos de reposición, finaliza sus labores. Se proyecta que para el siguiente periodo tras la revisión de documentación y verificación de las observaciones de la SEC, los trabajos sean entregados y recepcionados conforme.
- En el periodo que se informa, la Obra de Arte "Sine Qua Non" se encuentra en etapa de finalización, la cual se ha visto retrasada debido a inconvenientes vinculados al clima y la abundancia de precipitaciones durante el mes de agosto, que ha dilatado los avances que lleven a la entrega del proyecto.
