Obsection General de Concesiones Wasserve Internation

CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLAN


SEPTIEMBRE 2020

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Concesión Ruta 5 Tramo Talca - Chillán incluye la ejecución, conservación y explotación de una autopista de doble calzada, que se extiende entre Km. 219,490 y 412,800, con una longitud de 193,310 km., abarcando parte de la Séptima Región del Maule en las comunas de Río Claro, San Rafael, Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Linares, Longaví, Retiro y Parral y de la Región de Ñuble en las comunas de Ñiquén, San Carlos, San Nicolás, Chillán Viejo. La vía está diseñada con dos pistas por sentido, de 3,5 metros de ancho cada una y bermas de 2,5 metros respectivamente. La mediana tiene un ancho de 6 m entre calzadas, cerrada con defensas camineras. En gran parte de la ruta la velocidad de operación es de 120 km/h y dispone de postes S.O.S. cada 6km.

El tramo concesionado cuenta con 76 Puentes - entre los que se destaca: puente Maule, puente Achibueno, puente Longaví, puente Perquilauquén y puente Ñuble. Además, cuenta con 42 Pasos Inferiores, 52 Pasarelas, 17 Pasos Superiores, 72 kilómetros de Calles de Servicios y 4 Áreas de Servicios.

Nombre del Contrato	Concesión Internacional Ruta5 Sur Tramo Talca - Chillán
Sociedad Concesionaria	Ruta del Maule S.A.
Decreto de Adjudicación	DS MOP N° 21 del 12/01/1996
Inicio de Concesión	13.03.1996
Plazo de Concesión	Plazo Variable MDI >= YTG +20 meses DS N°259/16
Kilómetros Concesionados Kilómetro de: inicio – término	193,310 Kilómetros 219,490 – 412,800
Puesta en Servicio Provisoria	PSP Sector Camarico – San Javier 11 /10/ 1999 DGOP N º 2.852 PSP Sector San Javier – Linares 11/10/1999 DGOP N º 2.852 PSP Sector Linares – Rucapequén 11/10/1999 DGOP N º 2.852
Puesta en Servicio Definitiva	PSD Sector Camarico – San Javier 24/04/2000 DGOP N º 1.566 PSD Sector San Javier - Linares 24/04/2000 DGOP N º 1.566 PSD Sector Linares - Rucapequén 24/04/2000 DGOP N º 1.566
Inversión Oferta Oficial Materializada	UF 5.517.809 UF 7.818.965
Convenios Complementarios	Decreto MOP N° 675 del 29/05/98
Accionistas y su participación	Intervial Chile: 99,9993% Cintra Chile Ltda.: 0,007%
Asesoría Inspección Fiscal	Víctor Faraggi Hernández SpA
Call Center	N/A
Fono Emergencia	6002526000
Centro(s) Atención	Plazas de Peajes Troncales Rio Claro y Retiro
Áreas de Servicio	San Rafael Km. 237.000 (Orte.) Putagán Km.291.000 (Pte.) Copihue Km. 334.000 (Orte.) Monte Blanco Km. 382.000
Nº Postes SOS	58 Postes SOS
Mensajería Variable	No se cuenta con el elemento
Página WEB Concesionaria	www.intervialchile.cl/ruta-del-maule

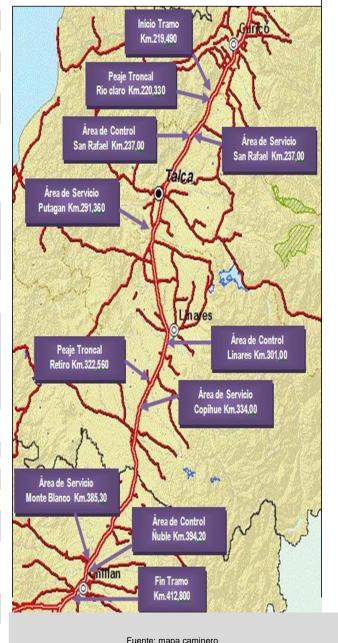

Direction General of Control of Manual of Manual of Manual of

CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLAN

SEPTIEMBRE 2020

2. INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2019 - 2020

Fuente: Reportes SICE (28)



Gráfico 2: Distribución de Flujos por categoría de vehículo

Fuente: Reportes SICE (29)

Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje

Fuente: Reportes SICE (29)

El flujo vehicular mensual fue de 2.068.494 vehículos distribuidos en las 7 categorías existentes.

De este flujo el 76,31% corresponde a vehículos livianos, y el 23,69% restante a vehículos pesados.

El flujo vehicular disminuyó un 5,44% respecto del mes anterior, y disminuyó un 25,33% respecto del mismo mes del año anterior.

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años.


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2016	2.878.132	3.187.068	2.579.012	2.266.427	2.339.772	2.212.014	2.464.240	2.326.852	2.423.610	2.432.292	2.417.995	2.691.833
2017	3.028.980	3.145.321	2.629.280	2.481.889	2.374.587	2.241.134	2.588.483	2.376.396	2.572.839	2.616.417	2.497.881	2.844.138
2018	3.188.208	3.317.619	2.810.859	2.631.736	2.570.726	2.351.091	2.672.558	2.470.938	2.672.463	2.610.468	2.638.634	2.831.677
2019	3.201.959	3.364.358	2.849.661	2.719.204	2.595.759	2.363.696	2.797.640	2.611.912	2.770.416	2.474.346	2.393.160	2.948.525
2020	3.277.464	3.519.571	2.243.829	1.213.672	1.612.607	1.599.357	1.846.113	2.187.621	2.068.494			

Fuente SICE (30)

3. INFORMACIÓN DE INGRESOS

Comparativos años 2019 - 2020

El ingreso mensual registró un aumento de un 5,91% respecto del mes anterior, de la misma forma presentó una disminución de un 14,41% respecto del mismo mes del año anterior.



El ingreso mensual fue de \$ 5.020.698.000, equivalentes a UF 174.889 al 30 de septiembre 2020.

El mayor aporte a dichos ingresos los hizo la Plaza de Peaje RIO CLARO con MM\$ 2.462 (49,06%). (Considera sólo ingresos en plazas de peajes)




Gráfico 4: Ingresos Mensuales Comparativos 2019 - 2020

Fuente: Reportes SICE.

Gráfico 5: Distribución de Ingresos por Plaza de Peaje


Fuente: Reportes SICE (32)



SEPTIEMBRE 2020

4. ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2019 - 2020

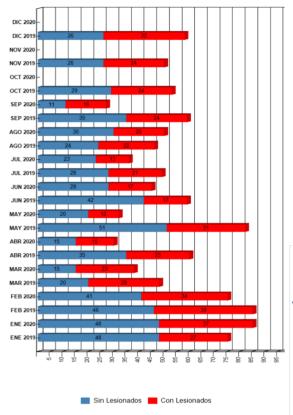

Distribución de Lesionados Ruta 5 Tramo Talca - Chillán SEPTIEMBRE-2020






Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2019-2020, Accidentes con lesionados y sin lesionados.

Fuente: Reporte 33 SICE

- Respecto del origen de los 27 accidentes ocurridos durante el mes de septiembre, el 92,59% de ellos es atribuido a posible "Falla humana", un 3,71% a "Animal en la vía" y el 3,7% restante a "Peatón en la vía".
- De las 57 personas que se vieron involucradas en los 27 accidentes registrados durante el mes, un 61,4% resultó ileso, un 28,07% con lesiones leves, un 5,26% resultó con lesiones menos graves, un 0% con lesiones graves. Este mes se registraron 3 víctimas fatales (5,26%) como consecuencia de estos accidentes.

Año / Mes	ENE	ENE	FEB	FEB	MAR	MAR	ABR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUN	JUL	JUL	AGO	AG0	SEP	SEP	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Con Lesionados	27	37	39	34	28	23	25	15	31	12	17	17	21	13	22	20	24	16	24	0	24	0	32	. 0
Sin Lesionados	48	48	46	41	20	15	35	15	51	20	42	28	28	23	24	30	35	11	29	0	26	0	26	0
Total Acc.	75	85	85	75	48	38	60	30	82	32	59	45	49	36	46	50	59	27	53	0	50	0	58	0

Reporte 33 SICE

Accidentes Acumulados Anuales (últimos 5 años)

	Ac	Accidentes Victimas			Total	Tipos de Accidentes con lesionados								
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2016	624	270	50	33	37	355	475	32	1	85	104	45	2	1
2017	639	312	47	23	33	442	545	26	1	93	134	56	1	1
2018	759	330	39	29	22	510	600	31		79	146	70	2	2
2019	724	314	36	41	31	429	537	25		95	135	55	4	
2020	418	187	36	8	25	222	291	14		53	85	34		1

SEPTIEMBRE 2020

5. RECLAMOS DE USUARIO

•

Grafico N° 9

Casuistica	Agosto 2020	Septiembre 2020	Total
CALIDAD DE SERVICIO	0	1	1
COMERCIALES	1	0	1
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	0	0	0
ESTADO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA	0	1	1
FACTORES DE ACCIDENTABILIDAD	6	0	6
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	0	0	0

Gráfico 9: Tabla con reclamos del mes versus mes anterior.

Fuente: AIFE ZS1

Los reclamos de usuarios se clasifican en 5 grandes grupos. En los últimos dos meses, la mayoría de los reclamos se concentran en temas referentes a Factores de accidentabilidad, Calidad de servicio, Comerciales y Estado de las instalaciones e infraestructura respectivamente.

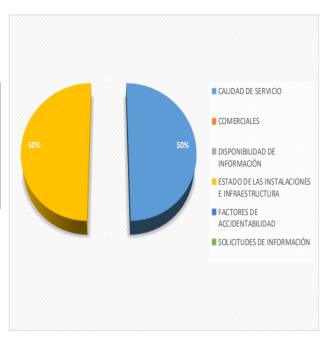


Gráfico 10: Distribución de reclamos por Area Temática - Septiembre 2020 Fuente: AIFE ZS1

6. ASISTENCIA AL USUARIO


Meses			Total							
IVIESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias
Enero	118	401	0	64	11	180	28	171	8	981
Febrero	155	523	0	74	18	176	20	167	5	1.138
Marzo	115	253	0	25	6	109	14	149	3	674
Abril	98	168	0	34	5	62	8	124	5	504
Mayo	92	207	0	25	4	66	7	107	1	509
Junio	80	193	0	26	3	99	5	103	6	515
Julio	97	208	0	46	3	83	10	136	1	584
Agosto	86	261	0	31	6	103	6	145	3	641
Septiembre	98	269	0	20	8	47	15	115	6	578
Octubre										0
Noviembre										0
Diciembre		·								0
Acumulado	939	2.483	0	345	64	925	113	1.217	38	6.124

Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas. Septiembre 2020 Fuente: Ruta del Maule S.A.

- Reparación de vehículo in situ
- Remolque de vehículo en Panne
- Panne por falta de combustible
- Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
- Primeros auxilios
- 6. Auxilio en accidentes
- Traslado de usuario a centro asistencial
- Instalación de señalización preventiva
- 9. Otros



SEPTIEMBRE 2020

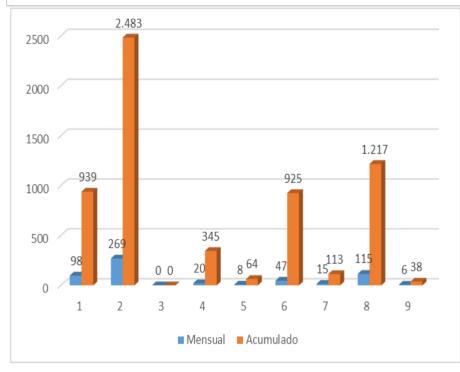

Durante el mes de septiembre producto de 681 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros; se realizaron 578 atenciones por parte de la Sociedad Concesionaria (para una solicitud puede ser necesario proporcionar más de un servicio o atención a la vez). El principal requerimiento fue "Remolque de vehículos en panne" con un 46,5%, le siguen "Instalación de señalización preventiva" con un 29,9%, "Reparación de vehículo in situ" con un 17%, "Auxilio en accidentes" un 8.1%. con "Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio" con un 3,5%, "Traslado de usuario a centro asistencial" con un 2 6% "Primeros auxilios" con un 1,4% y "otros" con un 1% de las atenciones.

Gráfico 12 Cantidad de Asistencia por tipo Fuente: Ruta del Maule S.A.

7. HECHOS RELEVANTES

- a) Respecto de la Explotación: La operación de la ruta se ve impactada por las obras nuevas que se ejecutan mandatadas por el DSMOP 259/2016 y por los efectos de la Pandemia COVID-19, donde se estableció aduana sanitaria en km 356 poniente y 351 oriente y algunos accesos a comunas aledañas a la Ruta 5. Se generan detenciones para los usuarios y se afectan a algunas plazas de peaje laterales, principalmente de la región de Ñuble. Se ha contabilizado un menor flujo vehicular principalmente en el horario de Toque de Queda (22:00 horas PM a 05:00 horas AM). Las restricciones aún vigentes han sido impuestas por la Defensa Nacional a petición de la Autoridad Sanitaria.
- b) Respecto de las Obras Adicionales mencionadas sancionadas por el Decreto Supremo MOP N°259 (principalmente pasarelas y Paraderos de Locomoción Colectiva), se presenta su estado de avance, cuyo control realiza la empresa consultora R&Q:

Tabla Resumen:

	Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Talca – Chillan.
Contrato de Concesión	Convenio Ad-Referéndum N°4 – DS MOP N°259 Obras Adicionales (AIF RyQ)
Fecha de Corte del avance	30.09.2020.
	100,00 % Construcción Obras Civiles Grupo I.
	92.90% Construcción Obras Civiles Grupo II
Porcentaje de avance físico	100,00 % Mallas Antivandálicas.
	100,00 % Proyectos PID con "Actualización", "Normativo" y "Servicialidad".
Nombre de la Obra	"ESTUDIO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD DEL CONTRATO CONCESION RUTA 5, TRAMO TALCA – CHILLAN".
Decreto que aprueba	Decreto Supremo N°259 de Fecha 05-12-2016 y Decreto Supremo N°23 de Fecha 04-03-2020 que lo modifica con aumento de plazo.
Monto Oficial (Decreto Supremo)	Monto Total Oficial D.S. MOP N°259: UF 2.007.209,91



SEPTIEMBRE 2020

Montos de la Obra Licitada (incluye Primera y Segunda Licitación)	 Construcción Obras Civiles CAR Nº4 "Obras Grupo I": UF 257.045,00 Construcción Mallas de Protección Antivandálicas: UF 74.368,00 Elaboración de proyectos PID: UF 47.050,00 Construcción Obras Civiles CARNº4 "Obras Grupo II": UF 1.215.812,61 Desglose: Obras Seguridad Normativas Proy. Actualización: UF 146.106,59 Obras Civiles Nuevas de Seguridad Normativa : UF 910.568,23 Obras Civiles Nuevas de Servicialidad : UF 159.137,79
Fecha de inicio	 Construcción Obras Civiles Grupo I: Julio 2017 Construcción Mallas Antivandálicas: Marzo 2017 Elaboración proyecto PID: Junio 2017 Construcción Obras Civiles Grupo II: Julio 2019 (en ejecución)
Fecha de termino	 Construcción Obras Civiles Grupo I: Marzo 2019 Construcción Mallas Antivandálicas: Junio 2018 Elaboración proyecto PID: Noviembre 2018 Construcción Obras Civiles Grupo II: Diciembre 2020 (en ejecución)
Plazo de Ejecución	19 Meses: -Construcción Obras Civiles Grupo I. (Se aumenta plazo de 4 meses)Construcción Mallas Antivandálicas. 18 Meses: -Elaboración PID OSN con Proyecto que Requiere Actualización", "PID Normativo" y "PID ServicialidadConstrucción Obras Civiles Grupo II. (En ejecución)
Monto de Obra ofertado	Monto Oficial Segundo Proceso de Licitación de Obras: UF 1.309.312
(Segunda Licitación)	Monto de Adjudicación 2º Licitación de Obras: UF 1.215.812,61
Observaciones	-Construcción de Grupo II de Obras: En Ejecución por Consorcio ConPax – Arrigoni - Valko para Concesionaria Ruta del Maule (VAC).
