

Licitación Segunda Concesión Establecimiento Penitenciario de Rancagua

El Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 1 contempló la materialización de tres proyectos de Infraestructura Penitenciaria, incluyendo las etapas de diseño, construcción, equipamiento, operación y mantención de las obras; el Establecimiento Penitenciario Rancagua; el Establecimiento Penitenciario Alto Hospicio; y el Establecimiento Penitenciario La Serena. **La actual concesión se extingue el próximo 31 de diciembre de 2027.** Los establecimientos penitenciarios de Alto Hospicio y La Serena se licitarán por separado y su llamado a licitación se espera para el segundo semestre de 2026.


La operación de la infraestructura actual incluye 2.703 plazas de capacidad, mientras que en términos de ocupación, el promedio de internos fue de 2.603.

El proyecto de la segunda concesión incluye, en principio, la ampliación y operación de 900 nuevas plazas en más de 24.000 m2 adicionales y con una inversión aproximada de US\$ 140 millones.

Región	Provincia	Comuna
O'Higgins	Cachapoal	Rancagua



Cronograma general y plazos

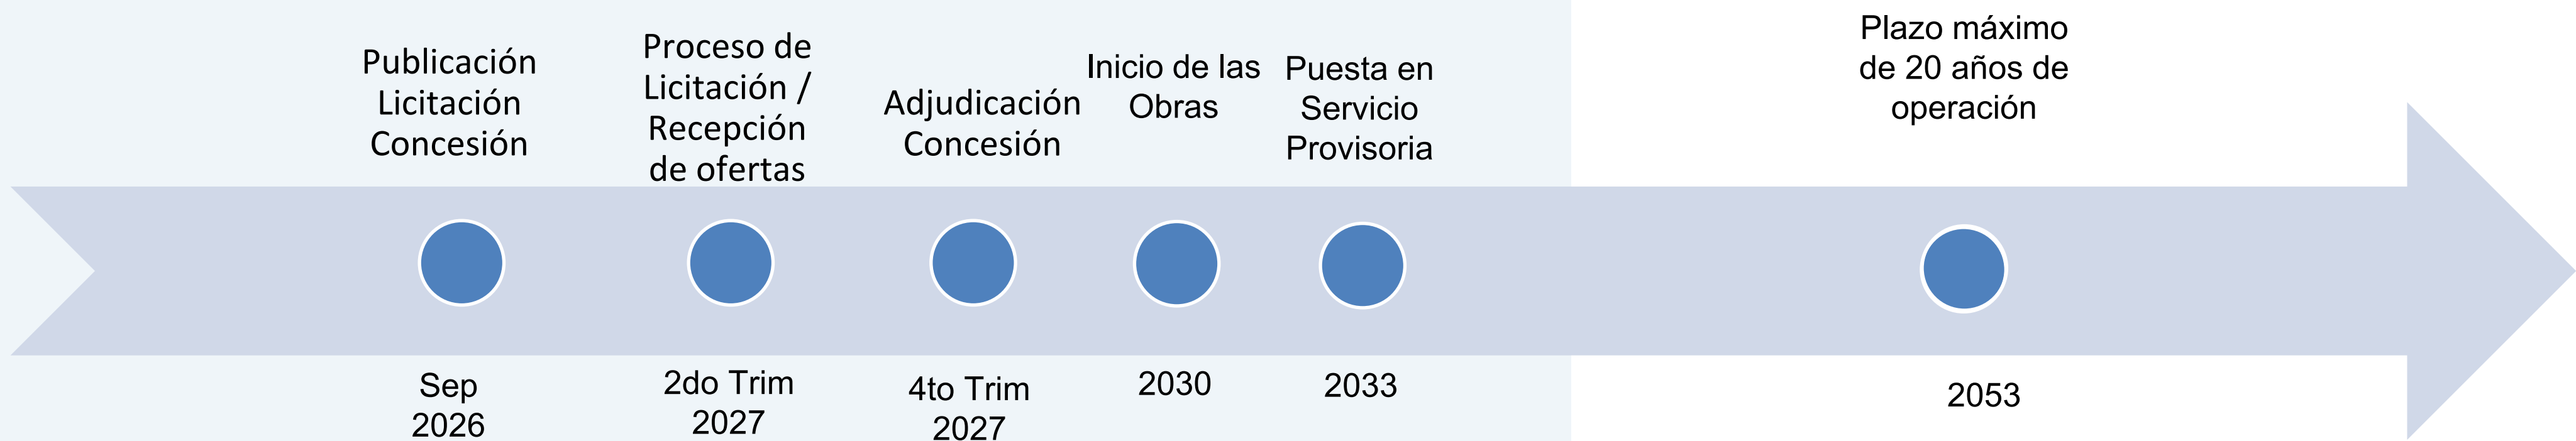

Desarrollo Concesión	Plazos BALI	Inicio	Fin
Desarrollo PID	420 ⁽¹⁾	dic/2027	feb/2029
Revisión y corrección PID	490	feb/2029	jun/2030
Construcción de las Obras	910 ⁽¹⁾	jun/2030	feb/2033
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras ⁽²⁾	1860 ⁽¹⁾	feb/2033	
Puesta en Servicio Definitiva ⁽³⁾	365	feb/2033	feb/2034

- Notas:**
- (1) Plazos en definición contados desde el inicio del Contrato de Concesión.
 - (2) La Puesta en Servicio Provisoria será propuesta por el Concesionario, pero su plazo máximo es de 1.860 días contados desde el inicio de la Concesión.
 - (3) La Puesta en Servicio Definitiva debe ser solicitada en el plazo máximo de 12 meses desde la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras.

